

# Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
30. 10. 2023

# Obsah

- Dotace
- Ekonomická data
- Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.
- Rumburská nemocnice – stav generelu a investic
- Zahražany
- Jednodenní chirurgie KZ s.r.o.

# Dotace

## REACT – aktuální stav

\*Proti 10% krácení dotace z důvodu široce nastavené technické kvalifikace v dotčeném zadávacím řízení a široce vymezenému předmětu veřejné zakázky Krajská zdravotní, a.s., podala námitky. K námitkám bylo připojena i odborná expertiza ČVUT s jasným závěrem, že postup Krajské zdravotní, a.s., v zadávacím řízení byl důvodný a v souladu se standardními požadavky při realizaci významných investičních akcí.

OZ	Zdroj	Název projektu	Celková částka přiznané dotace	Proplaceno	Zažádáno o proplacení	Bude požádáno o proplacení	Zbývá dočerpání 10-12/2023	Stav námitek
MNU L	REACT98	Nový pavilon s operačními sály, oddělením JIP a kardiologie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem	500 000 000,00	78 964 039,88	0,00	278 917 203,92	142 118 756,20	*odvolací řízení
DC	REACT98	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín	150 000 000,00	33 989 995,59	68 268 892,19	36 072 890,33	11 668 221,89	*odvolací řízení
CV	REACT98	Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov	150 000 000,00	10 399 830,84	63 486 042,70	52 685 215,53	23 428 910,93	*odvolací řízení
TP	REACT98	Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice	139 988 788,93	60 488 939,81	0,00	20 807 468,76	58 692 380,36	0
RB	REACT98	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk	150 000 000,00	20 455 373,95	0,00	9 540 475,59	120 004 150,46	0
MO	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Most	136 767 000,00	16 930 058,90	0,00	26 987 177,46	92 849 763,64	0
LT	REACT98	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	146 440 180,00	48 776 438,63	0,00	0,00	97 663 741,37	0
MNU L	REACT99	Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra MNÚL-CV	104 557 495,00	51 569 595,00	0,00	3 272 175,72	49 715 724,28	0
MNU L	REACT10 0	Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MNÚL	41 865 063,10	7 805 633,01	0,00	0,00	34 059 430,09	0
TP	REACT10 2	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Teplice	969 218,60	0,00	0,00	0,00	969 218,60	0
LT	REACT10 2	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Most	1 095 930,50	0,00	0,00	0,00	1 095 930,50	0
MO	REACT10 2	Laboratorní zařízení pro Nemocnici Litoměřice	1 481 449,20	0,00	0,00	0,00	1 481 449,20	0
			1 523 165 125,33	329 379 905,61	131 754 934,89	428 282 607,31	633 747 677,52	

# Některé proplacené dotace

- KZ byla proplacena celá požadovaná částka na projekt z IROP 75. výzva - „Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, MNUL o. z.“
  - Proplacená částka: 31,35 mil. Kč
- KZ byla proplacena částka na projekt z IROP 54.výzva - „Zvýšení kvality psychiatrické péče Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“
  - Proplacená částka: 9,51 mil. Kč
- U projektu REACT 99. výzva „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra MNÚL-CV“, požádala KZ dne 24.06.2022 o platbu ve výši 51 569 595 Kč za dodání PET/CT do Chomutova. Dne 28. 11. 2022 byla proplacena pouze část dotace ve výši 38 677 196,25 Kč. Dne 4. 8. 2023 na základě odvolání byla KZ doplacena krácená dotace ve výši 12 892 398,75 Kč.

# Další vybrané dotační projekty s podanou žádostí

- **Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3**

Zdroj: IROP II 3.výzva, rozpočet projektu: 49 999 998,-Kč

- **Obnova a doplnění vybavení pracoviště následné péče v KZ a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Zdroj: IROP 31.výzva, rozpočet: 43 000 000,-Kč

- **Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revize akutní rehabilitace**

Zdroj: NPO, rozpočet 49 500 000,-Kč

- **Obnova a inovace v rámci KOC**

Zdroj: NPO, rozpočet: 147 900 000,-Kč


- **Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3-DR**

Zdroj: IROP II 3.výzva, rozpočet projektu: 49 999 998,-Kč

# Ekonomická data


## Ekonomická data (k 31. 8. 2023)

- Základní kapitál ve výši 5 480 439 000 Kč
- K 31.8.2023 obrat ve výši 8 693 696 851 Kč

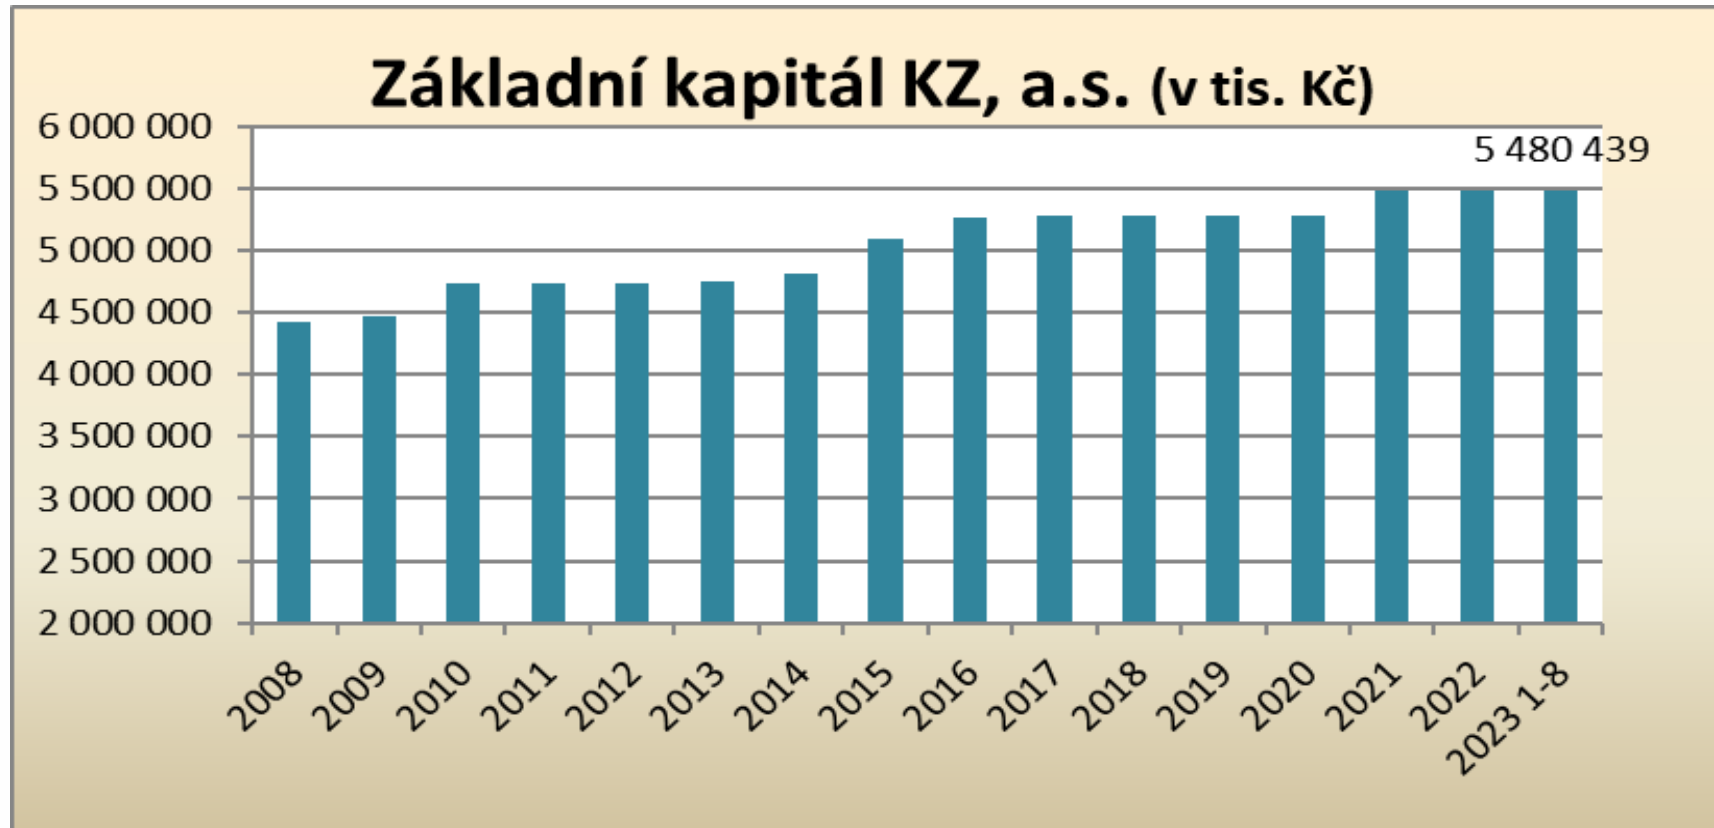




## Vývoj hospodaření KZ, a.s. (2008 až 2023) (v mil. Kč)

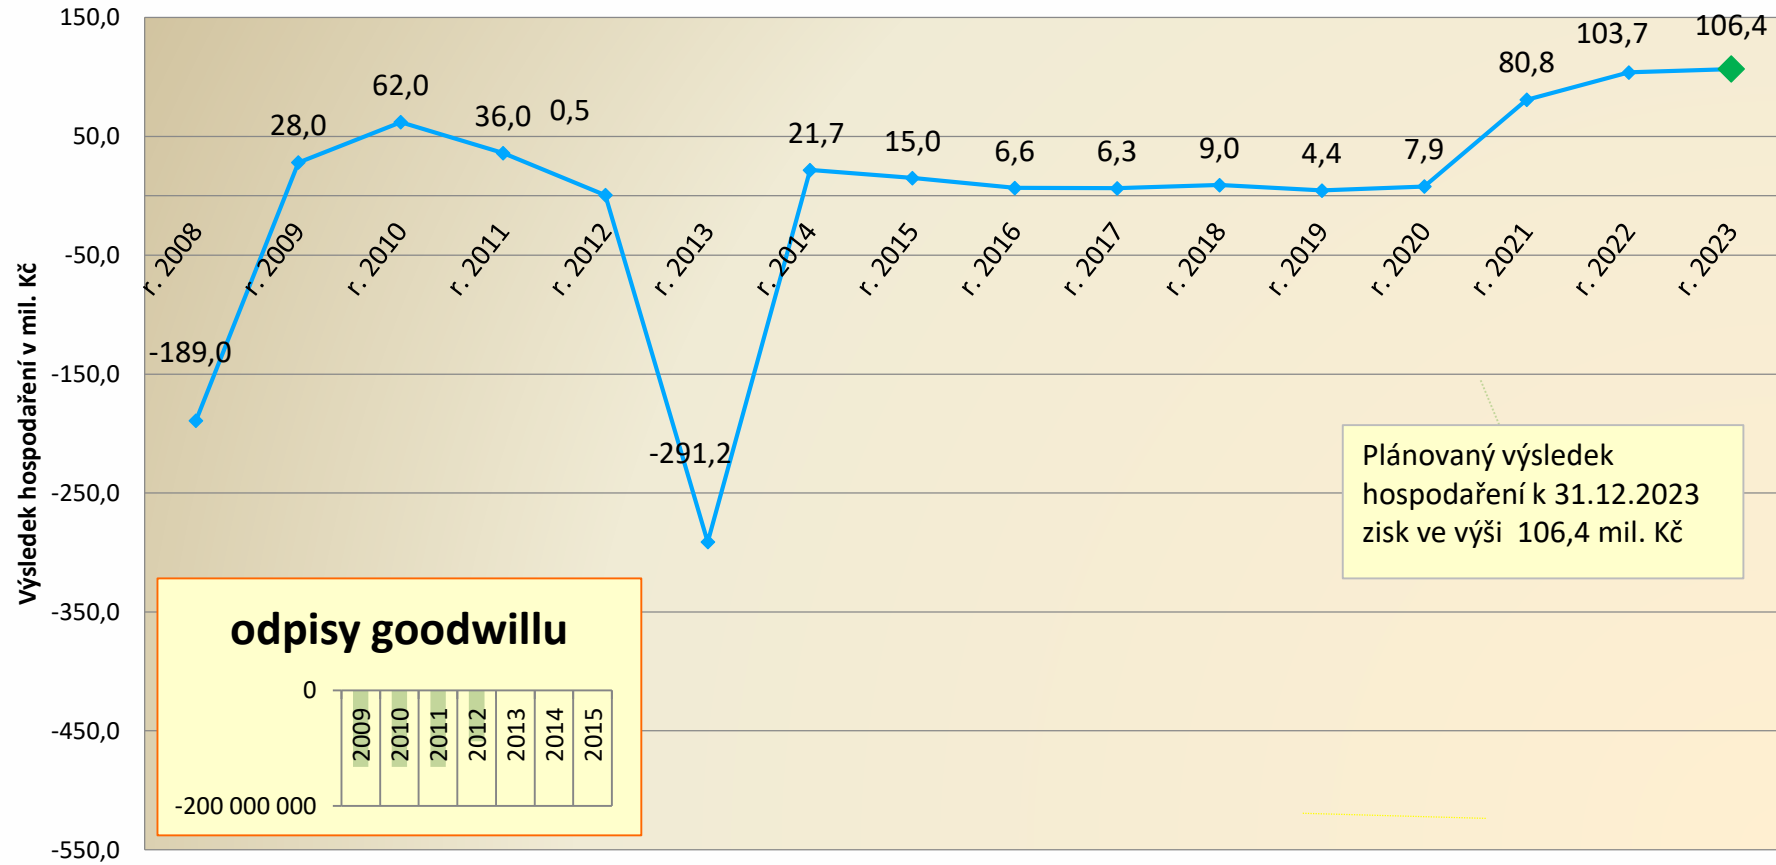



# Hospodaření Krajské zdravotní 2023 – jednotlivé OZ

KZ, a.s. (údaje v tis. Kč)	FP 2023 CE	FP 2023 UL vč. RM	FP 2023 CV	FP 2023 MO	FP 2023 TP	FP 2023 DC	FP 2023 LT	FP 2023 KZ Celkem
501 - spotřeba materiálu	52 406	2 004 068	237 830	247 840	613 282	148 257	190 768	3 494 451
502 - spotřeba energií	369	128 918	29 222	37 299	38 696	30 033	31 098	295 636
504 - prodané zboží	0	154 218	61 258	48 979	80 883	42 175	49 648	437 161
511 - opravy	176 323	147 416	50 593	41 729	27 166	27 955	26 485	497 668
512 - cestovné	652	6 360	1 217	1 199	1 111	377	2 218	13 133
513 - náklady na reprezentaci	1 478	145	20	20	20	20	20	1 723
518 - služby	206 665	95 791	21 055	23 592	22 741	29 036	30 622	429 503
521 - mzdové náklady	292 298	2 225 589	617 044	859 562	721 533	443 470	550 796	5 710 293
523 - odměny členům org.	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677
524 - zák.soc.pojištění	98 713	727 243	201 782	280 985	235 776	144 933	180 039	1 869 471
527 - zák.soc.náklady	506	13 964	3 164	3 620	2 690	1 377	1 790	27 111
528 - ost.soc.náklady	455	7 777	2 371	3 147	2 586	1 833	2 575	20 744
53x - daně a poplatky	300	1 227	110	137	21	42	10	1 847
543 - dary	11 604	15	0	0	0	0	0	11 619
544,545 - pokuty a penále	25	17	0	6	5	5	0	58
546 - pohledávky	12	2 635	1 102	1 099	596	593	69	6 107
547, 548 - jiné provozní náklady	32 484	16 450	3 114	3 764	3 289	2 135	3 500	64 737
549 - manka a škody	72 934	541	192	5	0	0	126	73 799
551, 557 - odpisy	26 768	90 277	27 130	19 811	16 709	12 651	12 049	205 395
552, 554 - rezervy	-134 481	0	0	0	0	0	0	-134 481
558, 559 - opravné položky	-71 938	0	0	0	2 500	0	0	-69 438
56x - finanční náklady	1 171	814	133	95	117	43	99	2 472
58x - změna stavu, aktivace	0	-72 088	-18 762	-2 047	-1 018	-1 930	-616	-96 462
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>774 423</b>	<b>5 551 376</b>	<b>1 238 576</b>	<b>1 570 843</b>	<b>1 768 702</b>	<b>883 007</b>	<b>1 081 297</b>	<b>12 868 224</b>
601 - tržby za vl.výrobky	0	26 953	37 687	2 766	4 087	511	872	72 876
602 - tržby za služby	15 319	5 549 753	1 173 588	1 563 106	1 747 611	866 241	1 065 425	11 981 043
604 - tržby za prodané zboží	0	176 987	74 261	58 079	97 871	50 068	60 188	517 454
641- tržby z prodeje DNaHM	2 457	0	0	0	0	0	0	2 457
642 - tržby z prodeje materiálu	0	9	0	5	0	0	0	14
644 - smluvní pokuty,...	9 992	3	1	0	1	0	0	9 997
646 - výnosy z pohledávek	1	0	0	1	0	50	0	53
648 - jiné prov. výnosy	283 717	9 006	3 795	57	22 602	3 062	9 009	331 247
66x - finanční výnosy	59 504	0	0	0	0	0	0	59 504
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>370 991</b>	<b>5 762 711</b>	<b>1 289 331</b>	<b>1 624 014</b>	<b>1 872 172</b>	<b>919 932</b>	<b>1 135 494</b>	<b>12 974 645</b>
Vnitropodnikové rozúčtování	403 432	-160 461	-40 892	-43 608	-83 775	-31 407	-43 289	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>50 874</b>	<b>9 863</b>	<b>9 563</b>	<b>19 695</b>	<b>5 519</b>	<b>10 908</b>	<b>106 421</b>


## Výsledek hospodaření MNUL\_RB v roce 2023 vývoj po jednotlivých měsících




## Struktura nákladů MNUL\_RB




## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – NÁKLADY (v tis. Kč)

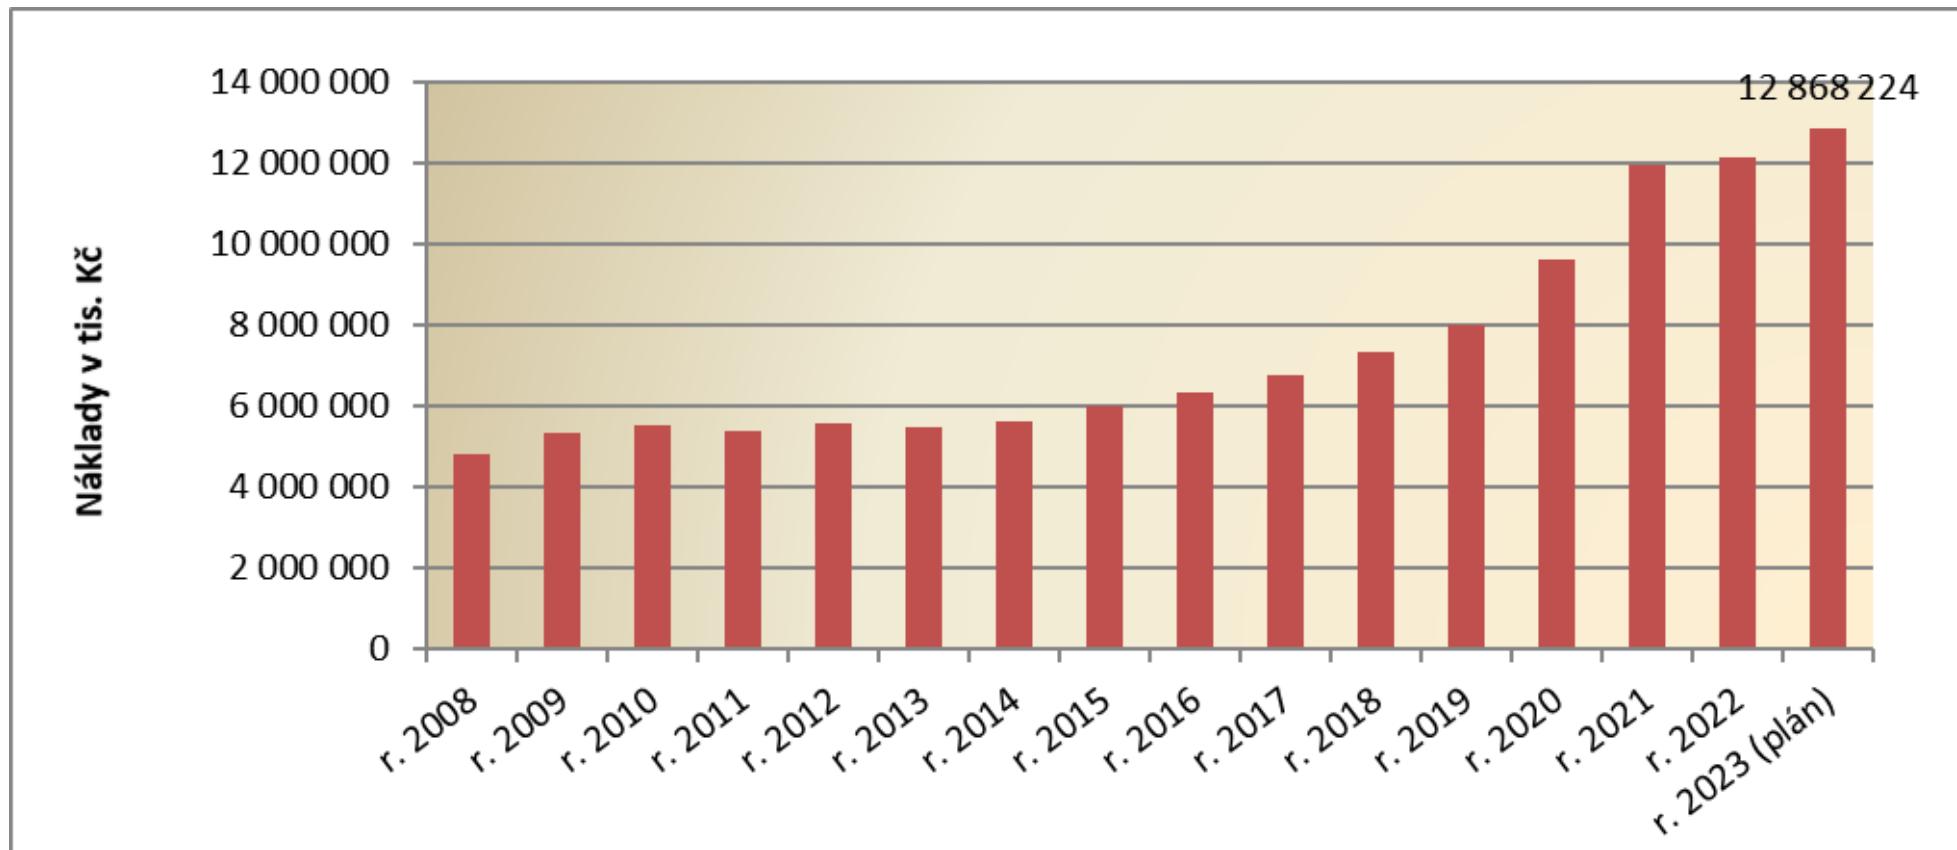


## Struktura nákladů KZ



Podíl ON v jednotlivých nemocnicích



Podíl ON v jednotlivých nemocnicích se zohledněním nákladů na biologickou léčbu



# Osobní náklady – finanční plán x skutečnost

SK rok 2022	FP rok 2022	Rozdíl (FP - SK)
7 138 588 521,53	7 176 892 624,00	38 304 102,47

SK rok 2023	FP rok 2023	Rozdíl (FP - SK)
7 448 147 060,00	7 455 145 432,00	6 998 372,00

---


*SK = skutečnost*

*FP = finanční plán*

*SK 2023 = předpokládaná skutečnost dle poslední prognózy*


*FP 2023 = poslední aktualizace FP v 09/2023*

## Vývoj hospodaření Krajské zdravotní – VÝNOSY (v tis. Kč)







## Struktura výnosů Krajské zdravotní




### KZ - podíl ZP na výnosech od ZP




**LT - podíl ZP na  
výnosech od ZP**



**DC - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**CV - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




- ZP 111 - VZP
- ZP 201 - VoZP
- ZP 205 - ČPZP
- ZP 207 - OZP
- ZP 211 - ZPMV


**TP - podíl ZP na  
výnosech od ZP**



**MO - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




**MNUL - podíl ZP na  
výnosech od ZP**




- ZP 111 - VZP
- ZP 201 - VoZP
- ZP 205 - ČPZP
- ZP 207 - OZP
- ZP 211 - ZPMV


## Struktura zaměstnanců KZ (k 31. 8. 2023)




## Podíl na osobních nákladech (k 31. 8. 2023)




## Vývoj průměrného hrubého výdělku (2012 - 1 až 8/2023)




## Neobsazená prac. místa v nemocnicích KZ (k 31. 8. 2023)







## Poděkování



# Realizace významných staveb Krajské zdravotní, a.s.

# Přehled významných investic Krajské zdravotní, a.s. v realizaci

OZ	Název akce	Náklady vč. DPH	Podpis smlouvy	Předání staveniště	Termín dokončení
MNUL	NOVÝ PAVILON S OPERAČNÍMI SÁLY, ODDĚLENÍMI JIP A STANDARDNÍMI LŮŽKOVÝMI ODDĚLENÍMI VČ. UMÍSTĚNÍ KARDIOCHIRURGIE	1 444 916 845 Kč	24.09.2020	29.10.2021	20.12.2023
MNUL	VÝSTAVBA NOVÉHO ENERGOCENTRA – TRAFOSTANICE TS4 vč. náhradního zdroje elektrické energie (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu budovy Kardiocentra)	84 699 898 Kč	4.7.2022	29.7.2022	Dokončeno
NEMDC	NOVÝ PAVILON EMERGENCY VČ. OPERAČNÍCH SÁLŮ, CENTRÁLNÍ STERILIZACE A JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE (I. etapa dostavby nemocnice)	784 406 795 Kč	22.09.2021	04.10.2021	15.12.2023
NEMCV	VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU EMERGENCY, COS, VČ. JIP A NADZEMNÍ SPOJOVACÍ KORIDOR SE STÁVAJÍCÍM PAVILONEM D	833 862 444 Kč	13.09.2021	23.09.2021	15.12.2023
NEMCV	NOVÉ ENERGOCENTRUM - TRAFOSTANICE TS1 VČ. NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu budovy EMERGENCY )	68 198 020 Kč	21.2.2023	7.3.2023	20.2.2024
NEMTP	MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ (PORODNICE, ŠESTINEDĚLÍ) V PAVILONU F	141 017 284 Kč	19.7.2022	30.8.2022	29.11.2023
NEMTP	MODERNIZACE ROZVODŮ ZTI V ČÁSTI C A D PAVILONU F (vyvolaná podmiňující investice pro možnost provozu gyn-por. oddělení)	25 182 962,86 Kč	25.8.2023	31.8.2023	14.12.2023

# Vizualizace nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiouchirurgie v areálu MNUL - Kardiocentrum



# Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiologie v areálu MNUL – průběh stavby

Aktuálně - říjen 2023:

## KARDIO -

podlahy v 1. - 6. NP hotové, vyjma operačních sálů, kde se dokončují, probíhá pokládka PVC, proběhla montáž rozvodů mediaplynů, montáž rozvodů topení a chlazení včetně strojovny VZT, montáž obkladů a dlažeb nátěr hydroizolačních stěrek, montáž rozvodů chlazení a VZT na střešním plášti, montáž ocelových kójí, montáž stěrek podlah

COS – probíhá montáž vestaveb

Stávající opěrná zeď – dokončuje se gabionová zeď


Teplá chodba – dokončeny rozvody kabelů

Komunikace – dokončeny asfaltové vrstvy hlavní komunikace




# Výstavba nového energocentra – trafostanice TS4 vč. náhradního zdroje elektrické energie

Aktuálně - říjen 2023:  
31.8.2023 proběhlo předání a převzetí díla.  
Dokončen asfaltový povrch.  
Probíhá výroba venkovního schodiště.  
Zahájena montáž protipožárních ucpávek.

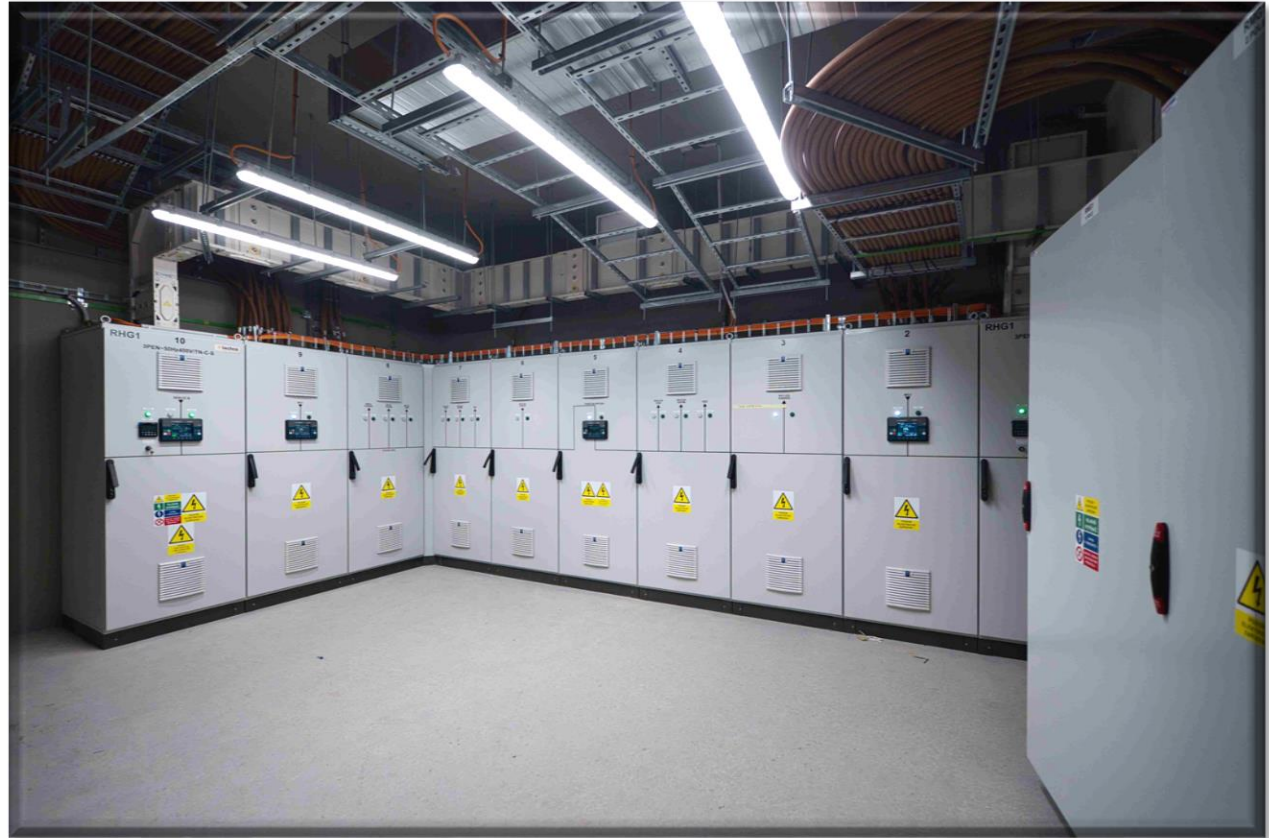

Průběh prací z 10/2023

# Vizualizace – pohled na areál děčínské nemocnice po dostavbě (I. a II. etapa)

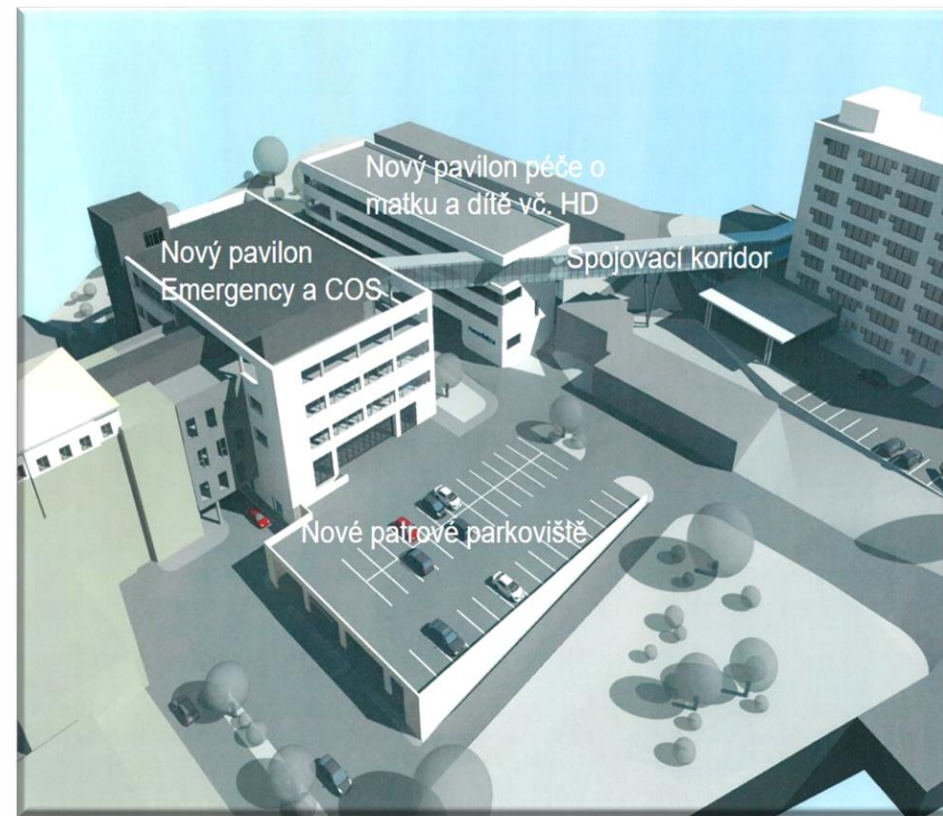

# Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Děčíně (I. etapa) – průběh stavby

Aktuálně – říjen 2023:

## PAVILON EMERGENCY

Kompletně dokončeny všechny vyzdívky. Dokončeny hrubé podlahy, zahájeny montáže podhledů, postupně se provádí ve všech NP rozvody TZB (technické zařízení budov). Provedeny práce na obkladech a dlažbách. Pokračují práce na vnitřních omítkách. Dokončena montáž výtahu V1, V2, příprava V3 a V4. Dokončeny zásypy objektu. Pokračují zemní práce pro komunikace, zahájeny práce na komunikacích. Provedena kabeláž pro posílení signálu LTE. Pokračují práce na fasádě - AL výplně osazeny.

Dodány a namontovány VZT jednotky ve strojovnách, je finální osvětlení a dokončeny akustické obklady. Zahájení teracových podlah, osazování ZP, podhledy.



# Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Děčíně (I. etapa) – průběh stavby

## OBJEKT E

Dokončeny vyzdívky a sanace nosných zdí, zahájeny práce na výtahu v objektu E. Probíhají finální práce na střešní konstrukci. Zahájeny vyrovnávky vnitřních stěn a finální omítání. Probíhají hrubé podlahy 5.NP.

Probíhají rozvody ZTI, ÚT, Elektro 2.NP – 4.NP. Zahájena betonáž podlah 3.-.4. NP.

## TRAFOSTANICE

Proběhla komplexní rekonstrukce 2.NP, montáž zdvojených podlah, nátěry v trafokobkách. Přepojené VN a NN (ČEZ).


Proběhla montáž VN traf, distribučního rozvaděče ČEZ a VN části ze strany dodávky projektu EMERGENCY – KORDIOR.

Probíhají rozvody NN, mediplynu a přeložek v rámci instalace do KORIDORU.



Průběh prací z 10/2023

## Vizualizace nového pavilonu v areálu Nemocnice Chomutov

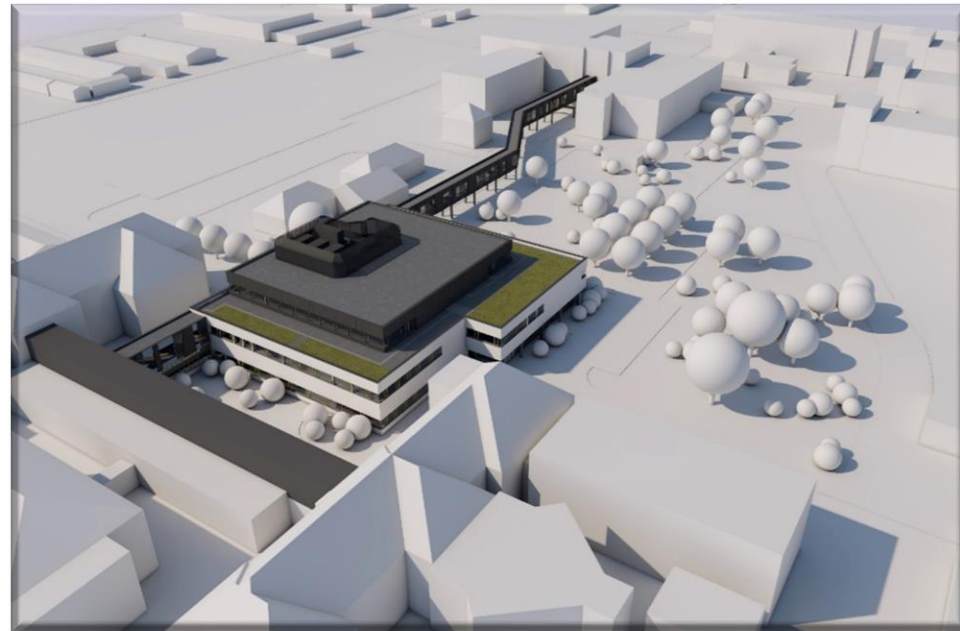

# Výstavba nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D v Chomutově – *průběh stavby*

Aktuálně – říjen 2023:

Hlavní budova Emergency:

Probíhá montáž teracových podlah v 1.NP.

Zahájena rekonstrukce ve spojovacím krčku pavilonu C.

Fasáda dokončena.

Střechy dokončeny.

Probíhá instalace KZS (Kontaktní zateplovací systém) po celém objektu.

Uvnitř objektu probíhají kompletace vč. finálních povrchů.

Dokončena kabeláž pro provizorní připojení stavby Emergency ze stávající TS1.

## Výstavba nového energocentra – trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie

Aktuálně – říjen 2023:

Pokračuje příprava pro napojení nového energokanálu na stávající.

Dokončena betonáž stěn, převzata výztuž stropní desky.

Probíhá realizace fasády.

Objednány kabelové trasy z budovy EMERGENCY do TS1.



Průběh prací z 10/2023



# Modernizace Gynekologicko-porodnického oddělení (porodnice, šestinedělí) v pavilonu F teplické nemocnice – průběh stavby



## *Modernizace Gynekologicko-porodnického oddělení (porodnice, šestinedělí) v pavilonu F teplické nemocnice*

Aktuálně – říjen 2023:

Uvnitř pokračují práce na omítkách, elektroinstalaci, vzduchotechnice a slaboproudu. Byly dokončeny omítky výtahové šachty a probíhá montáž výtahu. Byla dokončena pokládka kročejových izolací podlah, dokončena betonáž podlah.

Pokračují práce na pokládce střešního souvrství nad 4NP a byla zahájena montáž výtahu. Probíhá modernizace rozvodů ZTI v části C a D.



Průběh prací z 10/2023

# Rumburská nemocnice – stav generelu a investic




## Modernizace a centralizace Nemocnice Rumburk





# Modernizace a dostavba Nemocnice Rumburk

1. Etapa – Dostavba Nového pavilonu Emergency (A)
2. Etapa – Dostavba Lůžkového pavilonu (B)
3. Etapa - Rekonstrukce stávajícího pavilonu (1+2)

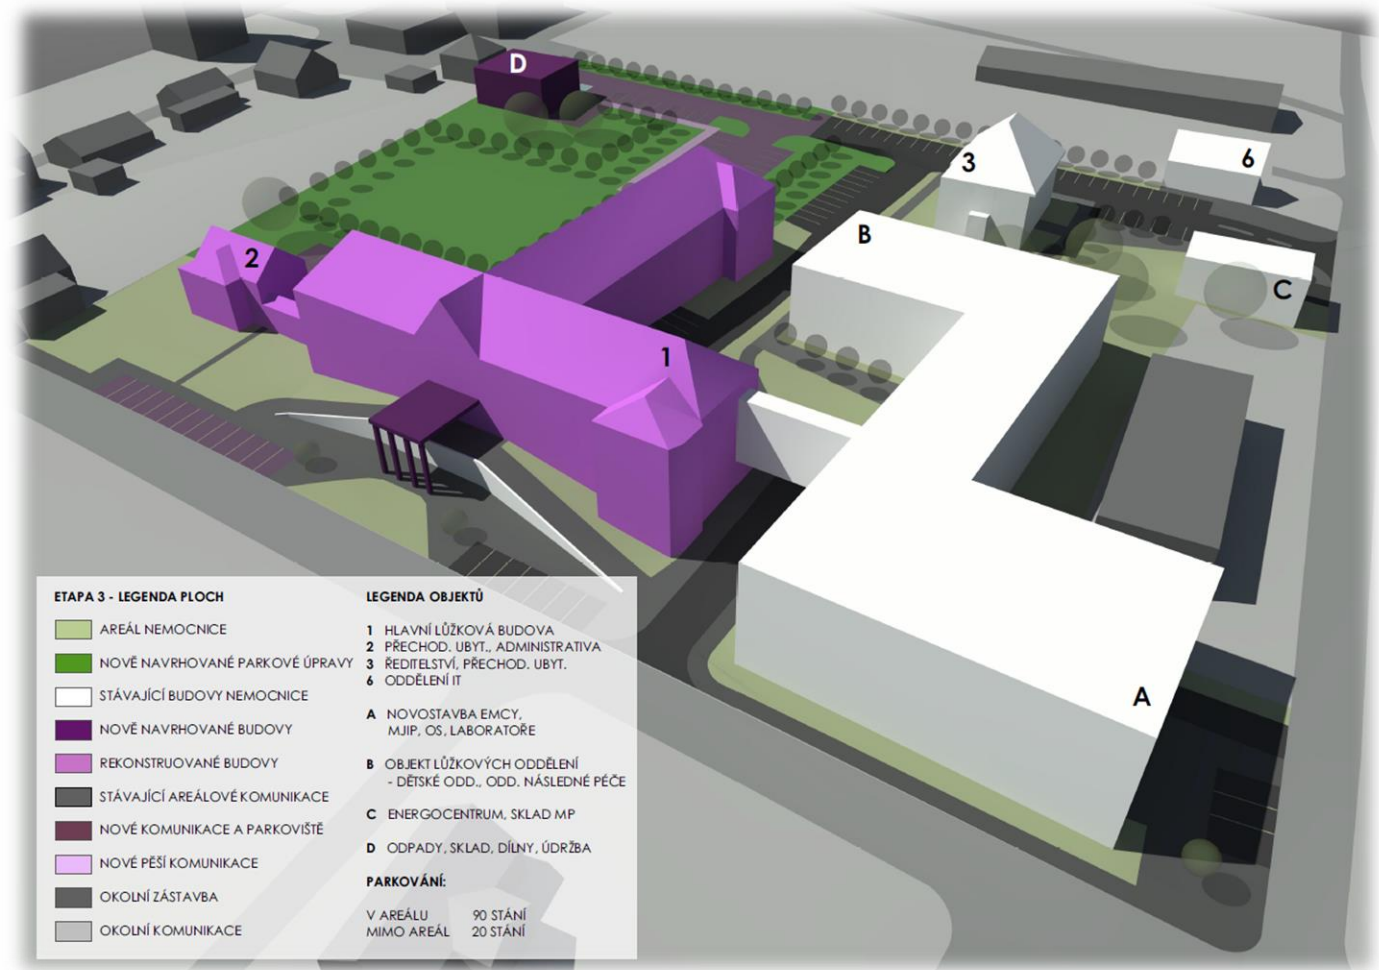

# Modernizace administrativní budovy

Před zahájením rekonstrukce administrativní budovy je nutné vystěhovat **hematologickou laboratoř**.

Předpokládané náklady: **24,2 mil. Kč vč. DPH – odhad modulární stavby**

Podání nabídek na modulární stavbu : **19.10.2023**

Předpokládaná doba realizace: do **09/2024**

V současné době proběhlo zpracování projektové dokumentace na modernizaci administrativní budovy

Termín zpracování PD: **Dokončeno**

Výběr zhotovitel: **1.10.2024** (předpoklad závislý na stěhování laboratoří)

Předpokládané zahájení modernizace: **30.11.2024**

Předpokládané ukončení modernizace: **30.6.2025 ( 7 měsíců)**

Předpokládané náklady: **62 mil. Kč vč. DPH (zajištěno SOHZ)**



*Vizualizace modernizace administrativní budovy z DPS*

# Modernizace Polikliniky (I. etapa modernizace)

## *Návrh modernizace polikliniky*

V současné době proběhlo zpracování generelu nemocnice s následným zpracováním studie.

Termín předání generelu/studie: **Dokončeno**

Proběhla VZ na zpracování PD s termínem: do **04/2024**

Předpoklad VZ na zhotovitele: **07/2024**

Předpokládané zahájení: **09-10/2024**

Předpokládané ukončení: **11/2025 (13 měsíců)**

Předpokládané náklady: **180 mil. Kč vč. DPH (dle studie)**



POLIKLINIKA RUMBURK | STUDIE | S.18 | VIZUALIZACE 1

# Novostavba emergency, NJIP, OS a laboratoří (I. etapa modernizace)

Termín předání Generelu/studie:	<b>Dokončeno – 20.7.2023</b>
Předpokládaný termín zpracování PD:	<b>4 měsíce VZ, 8 měsíců vypracování PD vč. IČ</b>
Předpokládaný výběr zhotovitele:	<b>3 měsíce</b>
Předpokládané délka výstavby:	<b>23 měsíců</b>
Předpokládané náklady hlavní stavba:	<b>380 mil Kč vč. DPH (dle studie)</b>
Předpokládané náklady trafostanice a sklad MP:	<b>52 mil Kč vč. DPH (dle studie)</b>
Předpokládané náklady ostatní:	<b>27 mil. Kč vč. DPH (dle studie)</b>
Předpokládané náklady celkem:	<b>459 mil Kč vč. DPH (dle studie)</b>



# Novostavba dětského a lůžkového oddělení (II. etapa modernizace)

Stavbu je možné zahájit společně s novostavbou emergency, NJIP, OS a laboratoří (realizace I. a II. Etapy současně). V případě souběhu I. a II. Etapy je potřeba počítat s prodloužením termínu dokončení stavby.

Termín dokončení Generelu/studie: **Dokončeno – 20.7.2023**


Předpokládaný termín zpracování PD: **3 měsíce výběr, 11 měsíců vypracování PD vč. IČ – odhad**

Předpokládaný výběr zhotovitele: **3 měsíce**

Předpokládaná délka výstavby: **15 měsíců**

Předpokládané náklady: **297 mil. Kč vč. DPH ( dle studie)**

# Návrh modernizace I. a II. etapa realizace:

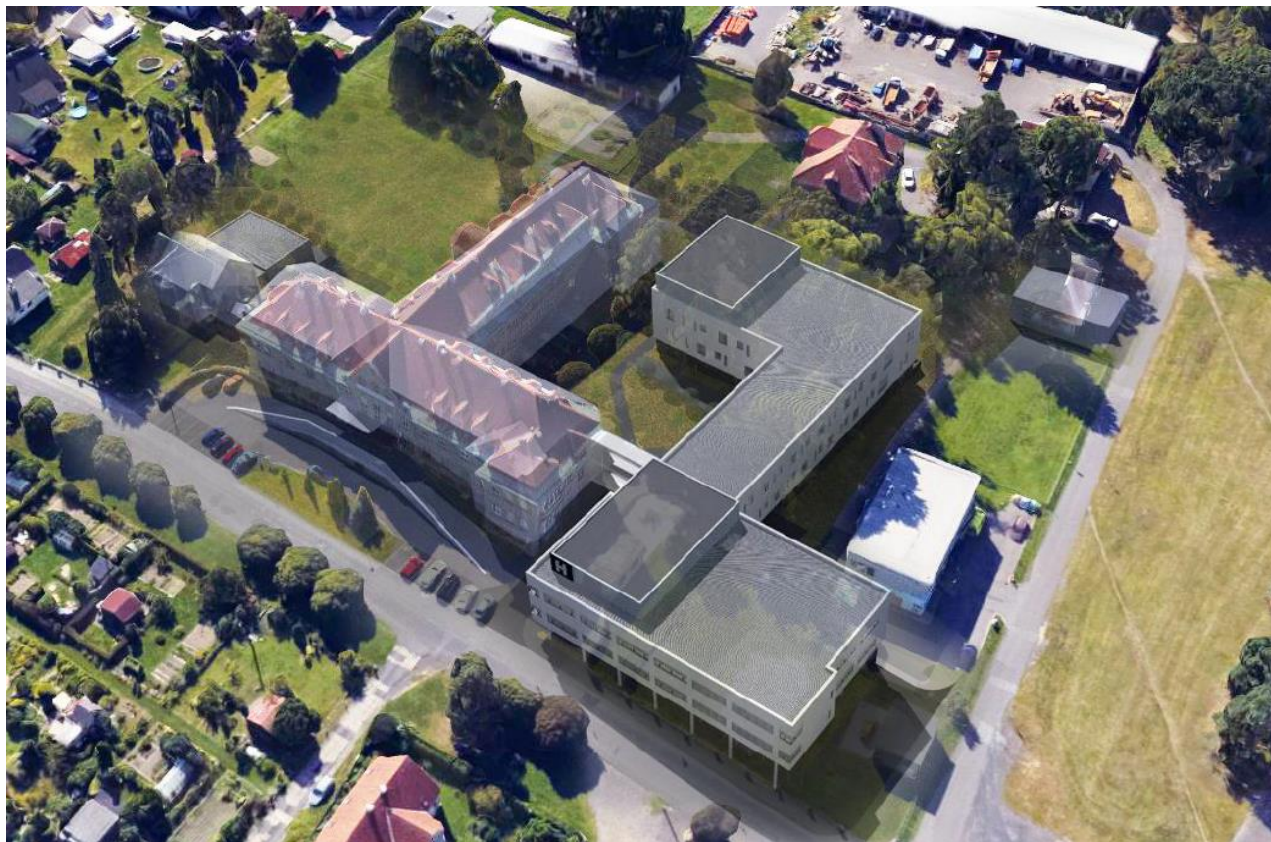

NEMOCNICE RUMBURK | STUDIE | 2.S.15 | VIZUALIZACE




# Vybudování heliportu


V současné době je zadána Studie proveditelnosti na zřízení přistávací plochy pro vrtulník na pozemkové parcele p.č. 2770/1.

Vzhledem k tomu, že předchozí zvažované varianty umístění heliportu, byly shledány jako provozně či jinak nevyhovující (např. počet výškových překážek, provozní omezení veřejné pozemní komunikace či soulad s územním plánem města), byla jako další varianta zvolena v uvedené lokalitě. Tato varianta je z pohledu provozu vhodná, nicméně je nutno zpracovat a posoudit možnosti umístění právě studií proveditelnosti.

Termín realizace: **do 12.2025**

Předpokládané náklady: **8 mil. vč. DPH (dotace IROP)**

  
*Vývoj lokalizace umístění heliportu*

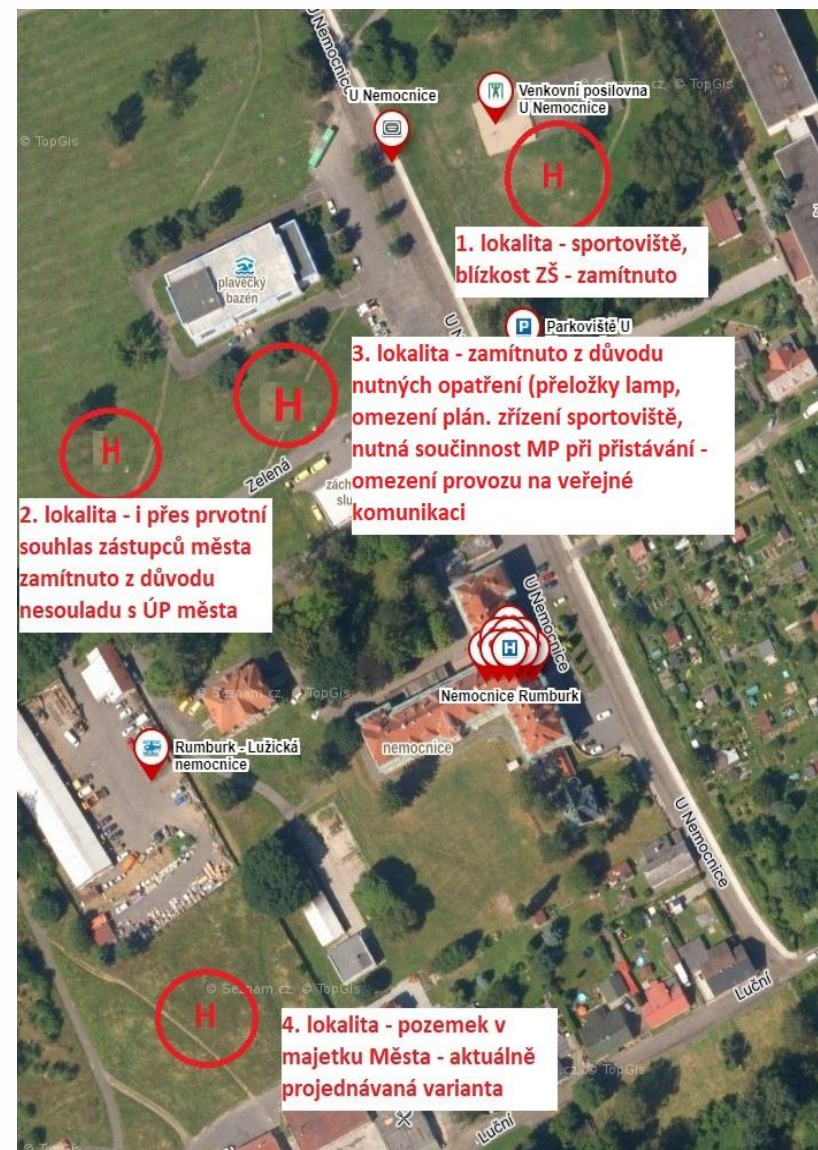

# Zahražany



# Zahražany

- Krajská zdravotní, a.s., nechala zpracovat znalecký posudek o ceně pozemků a staveb areálu Oddělení následné péče „Zahražany“ (součást Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.)
- Cílem není jakékoliv omezení rozsahu poskytovaných zdravotních služeb
- Součástí generelu mostecké nemocnice je mj. přesun oddělení následné péče do areálu nemocnice
- Přesun oddělení je vázán na výstavbu a úpravy v současném areálu nemocnice (zejména výstavba urgentního příjmu, která uvolní některé prostory v současných budovách areálu nemocnice, resp. v budoucnu možná výstavba nebo rekonstrukce samostatné budovy LDN v areálu nemocnice)

# Zahražany

- Přesunem oddělení do areálu nemocnice dojde např. k:
  - Redukci nákladů na dopravu mezi areály
  - Vyřešení energetické náročnosti budov současného oddělení
  - Vyřešení převozu pacientů na vyšetření do areálu nemocnice
- Pro možný budoucí přesun oddělení je nutné znát hodnotu současného areálu
- Cílem posudku je tak zejména hospodárné vynakládání investičních prostředků Krajské zdravotní, a.s., a možnost efektivního vyhodnocení investičních záměrů v areálu nemocnice

# Jednodenní chirurgie KZ s.r.o.

# Jednodenní chirurgie KZ s.r.o.

- září/říjen - podávány přihlášky na výběrová řízení na další obory - praktický lékař pro děti a dorost v Ústí nad Labem, psychiatrie (vč. adiktologie a dětské psychiatrie) v Mostě a gynekologie v Litoměřicích
- plánováno doplnit síť primární péče i o praktického lékaře pro dospělé
- leden 2024 - spuštění provozu prvních ambulancí
- Představenstvem Krajské zdravotní, a.s., schváleno přejmenování Jednodenní chirurgie KZ s.r.o. na Jednodenní chirurgie a ambulance KZ s.r.o.

**Děkuji za pozornost.**
