

Ústecký kraj
Doruceno: 31.03.2025 14:03
KUUK/048452/2025

listy: 1 přílohy:
Počet listů, sv. příloh: 1



kuukes97fec30

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Petr Severa
Vedoucí odboru zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Naše značka

Vaše značka

Linka
477 111 111

E-mail
sekretariat@kzcr.eu

Ústí nad Labem
28.03.2025

Předložení výsledné kalkulace SOHZ 2023

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 Smlouvy o poskytnutí veřejné služby a podmínkám poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Ústeckým krajem dne 23. 6. 2020 v platném znění zasíláme ve stanovené lhůtě výslednou kalkulaci vyrovnávací platby SOHZ 2023 za rok 2024.

Výsledná kalkulace – vyúčtování poskytnuté investiční dotace je předkládáno v dohodnuté struktuře, investiční prostředky, poskytnuté Ústeckým krajem dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro rok 2023 ze dne 2.6. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023 ve výši 1 320 mil. Kč byly v letech 2023-2024 řádně vyčerpány v plné výši.

S pozdravem



Ing. Ludek Růžek
náměstek pro ekonomické řízení a controlling
Krajská zdravotní, a.s.

Příloha: Výsledná kalkulace vyrovnávací platby pro období 2023-2024 ze dne 28.3. 2024

**Vyúčtování investiční dotace SOHZ 2023 – předložení výsledné kalkulace výše
Vyrovnávací platby pro rok 2024 (výsledná kalkulace) v souladu se smlouvou
SOHZ ze dne 23. 6. 2020 v platném znění a Smlouvou o poskytnutí investiční dotace
ze dne 2. 6. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023**

1. Identifikační údaje o žadateli:

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: Krajská zdravotní, a.s.

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): Akciová společnost

1.3 Datum narození/IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627

1.4 Adresa bydliště/Sídlo:

obec: Ústí nad Labem část obce: Severní Terasa PSČ : 401 13
ulice: Sociální péče č. p. 3316 č. or.: 12A
telefon/fax: +420 477 114 105 e-mail: sekretariat@kzcr.eu http://www.kzcr.eu
datová schránka: 5gueuef

1.5 Registrace

(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):

1.6 Číslo účtu: 280078178/0300, nebo 216686400/0300 u peněžního ústavu: CSOB

2. U právnických osob identifikace:

a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu zastoupení)

I. Jméno, titul, funkce: MUDr. Jiří Laštůvka, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
Kontaktní adresa: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon/Fax: +420 477 114 105
E-mail: sekretariat@kzcr.eu

II. Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III. Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

b) osob s podílem v této právnické osobě

- I. Jméno, příjmení/název: **Ústecký kraj**
adresa: **Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem**
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ: **70892156**
Telefon/E-mail: **+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz**
- II. Jméno, příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)

- I. Název: **Jednodenní chirurgie KZ, s.r.o.**
Sídlo: **Duchcovská 962/53, 415 01 Teplice**
IČ: **17375291**
Telefon/E-mail:
Výše podílu: **100 %**
- II. Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3. Kontaktní osoba

Jméno, titul, funkce: **Ing. Luděk Růckl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 130**

E-mail: Ludek.Ruckl@kzcr.eu

4. Výsledná kalkulace na dotaci Ústeckého kraje za rok 2024 (SOHZ 2023)

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 23. 6. 2020 v platném znění, Smlouvou o poskytnutí investiční dotace pro rok 2023 ze dne 2. 6. 2023; dodatku č. 1 ze dne 10.11.2023 a aplikací „Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ je předkládána výsledná kalkulace investiční dotace ve výši 1 320 000 000 Kč, přičemž podrobný seznam jednotlivých investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v příloze č. 3 tohoto vyúčtování.

5. Celková výše požadované dotace: 1 320 000 000,- Kč, celkem v roce 2024 vyčerpáno 465 744 423,- Kč. Celkem v r. 2023 a 2024 vyčerpáno 1 320 000 000,- Kč.

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE 2023-2024	SKUTEČNÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE 2023-2024	DRUH INVESTICE
Prioritní investiční akce						
1	Masarykova nemocnice ÚL	Objekt Kardiocentra MNUL	Investiční dotace ÚK	100 000 000,00	286 784 817,48	NOVÁ
2	Nemocnice Chomutov	Urgentní příjem a op. sály CV	Investiční dotace ÚK	217 500 000,00	285 973 386,03	NOVÁ
3	Nemocnice Děčín	Urgentní příjem a op. sály DC	Investiční dotace ÚK	200 000 000,00	379 303 732,42	NOVÁ
4	Masarykova nemocnice ÚL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, oddělení JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie	Investiční dotace ÚK	41 500 000,00	41 513 909,36	NOVÁ
5	Masarykova nemocnice ÚL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, oddělení JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie	Investiční dotace ÚK	32 500 000,00	32 499 598,12	OBNOVOVACÍ
6	Nemocnice Chomutov	Počítačový tomograf pro RDG oddělení	Investiční dotace ÚK	18 500 000,00	14 217 500,00	OBNOVOVACÍ
7	Nemocnice Děčín	Pavilon péče o matku a dítě	Investiční dotace ÚK	150 000 000,00	158 411 225,36	NOVÁ
8	Nemocnice Litoměřice	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	Investiční dotace ÚK	20 000 000,00	0,00	NOVÁ
9	Nemocnice Most	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	Investiční dotace ÚK	30 000 000,00	0,00	NOVÁ
10	Nemocnice Teplice	Modernizace technického zařízení pavilonu F ve vazbě na modernizaci GYNPOR	Investiční dotace ÚK	30 000 000,00	73 566 543,76	ROZVOJOVÁ
11	Nemocnice Teplice	Rozšíření Urgentního příjmu	Investiční dotace ÚK	100 000 000,00	11 017 466,62	ROZVOJOVÁ
12	Masarykova nemocnice ÚL	Rekonstrukce Centrální sterilizace I	Investiční dotace ÚK	150 000 000,00	0,00	ROZVOJOVÁ
13	Masarykova nemocnice ÚL	Objekt Kardiocentra - zvýšení bezpečnosti provozu objektu (změna napájení el. energií)	Investiční dotace ÚK	81 000 000,00	0,00	NOVÁ
14	Nemocnice Litoměřice	Rekonstrukce porodnice	Investiční dotace ÚK	34 000 000,00	3 250 238,12	ROZVOJOVÁ
15	Nemocnice Most	Trafostanice	Investiční dotace ÚK	85 000 000,00	1 000 000,00	NOVÁ
16	Krajská zdravotní, a.s.	Realizace opatření v souvislosti s MDR (upgrade SW+HW)	Investiční dotace ÚK	30 000 000,00	32 461 582,73	ROZVOJOVÁ
Celkem prioritní investiční akce				1 320 000 000	1 320 000 000	
z toho obnovovací				51 000 000	46 717 098	
z toho rozvojová				391 000 000	120 295 831	
z toho nová				878 000 000	1 152 987 071	

V roce 2024 byly vynaloženy v oblasti prioritních investičních akcí investiční výdaje v celkové výši 465 744 423 Kč. Z hlediska členění dle druhu investice, pak byly vynaloženy investiční prostředky na nové investice ve výši 344 947 823,76 Kč, na obnovovací 14 217 500 Kč a na rozvojové investice 106 579 099,24 Kč. Podrobný přehled čerpání je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto vyúčtování.

Přehled jednotlivých investičních akcí vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v příloze č. 3 tohoto vyúčtování.

Zadání jednotlivých investičních akcí bylo provedeno v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž u dokončených investičních akcí jsou doklady k zadávacímu řízení uvedeny v příloze č. 4. tohoto vyúčtování.

Realizací uvedených investičních aktivit (zejména strategických investičních akcí) je řešení nedostatečné kapacity zdravotnických provozů a z hlediska požadavků současné medicíny nevyhovujících prostor, které jsou nezbytné pro naplnění současných standardů poskytování zdravotních služeb a jejich další rozvoj.

V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2025



MUDr. Jiří Laštůvka, mocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Přílohy vyúčtování:

1. Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. informace o skutečných vynaložených nákladech
2. Položkový přehled účetních dokladů vč. čerpání dotačních prostředků
3. Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktiv vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti
4. Seznam dokumentace k doložení hospodárnosti realizovaných investic

Plánek 1

23/SML1151-01				výsledná kalkulace 2023				výsledná kalkulace 2024			
		OZ	NÁZEV AKCE	druh investice	předpokládané výdaje celkem	skutečně vyčerpáno 2023 (z dotace)	investice, které nebyly v roce 2023 zcela či částečně realizovány/odložené investice/dokončené inv.	předpokládané výdaje 2024	skutečně vyčerpáno 2024 (z dotace)*	celková skutečná hodnota investiční akce**	% podíl dotace na investiční akci
č.poř.		Prioritní investiční akce		Filtr	Filtr	Filtr	Filtr				
1	046/24Z/2023 ze dne 30.10.2023	KZ-MNUL	Objekt Kardiocentra MNUL	NOVÁ	100 000 000,00	212 051 826,87	dokončeno	0,00	74 732 990,61	1 885 100 466,54	15,21%
2		KZ-CV	Urgentní příjem a op. sály CV	NOVÁ	217 500 000,00	238 698 959,32	dokončeno	0,00	47 274 426,71	980 288 849,61	29,17%
3		KZ - DC	Urgentní příjem a op. sály DC	NOVÁ	200 000 000,00	315 774 551,34	dokončeno	0,00	63 529 181,08	980 778 520,12	38,67%
4		KZ-MNUL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie	NOVÁ	41 500 000,00	41 513 909,36	dokončeno	0,00	0,00	41 513 909,36	100,00%
5		KZ-MNUL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie	OBNOVOVACÍ	32 500 000,00	32 499 598,12	dokončeno	0,00	0,00	32 499 598,12	100,00%
6		KZ-CV	Počítačový tomograf pro RDG oddělení	OBNOVOVACÍ	18 500 000,00	0,00	dokončeno	18 500 000,00	14 217 500,00	14 217 500,00	100,00%
7		KZ - DC	Pavilon péče o matku a dítě	NOVÁ	150 000 000,00	0,00	částečná realizace	150 000 000,00	158 411 225,36	0,00	
8		KZ-LT	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	NOVÁ	20 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	12 000 000,00	0,00	0,00	
9		KZ-MO	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	NOVÁ	30 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	27 000 000,00	0,00	0,00	
10		KZ-TP	Modernizace technického zařízení pavilonu "F" ve vazbě na modernizaci GYNPOR	ROZVOJOVÁ	30 000 000,00	13 716 731,99	dokončeno	43 274 423,00	59 849 811,77	74 221 428,00	99,12%
11		KZ-TP	Rozšíření Urgentního příjmu	ROZVOJOVÁ	100 000 000,00	0,00	částečná realizace	50 000 000,00	11 017 466,62	0,00	
12		KZ-MNUL	Rekonstrukce centrální sterilizace I	ROZVOJOVÁ	150 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	45 000 000,00	0,00	0,00	
13		KZ-MNUL	Objekt Kardiocentra - zvýšení bezpečnosti provozu objektu (změna napájení el. energií)	NOVÁ	34 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace	0,00		0,00	
14		KZ-LT	Modernizace porodnice	ROZVOJOVÁ	81 000 000,00	0,00	částečná realizace	40 000 000,00	3 250 238,12	0,00	
15		KZ-MO	Trafostanice	NOVÁ	85 000 000,00	0,00	částečná realizace	50 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
16		KZ	Realizace opatření v souvislosti s MDF (upgrade SW+HW)	ROZVOJOVÁ	30 000 000,00	0,00	dokončeno	30 000 000,00	32 461 582,73	36 374 782,02	89,24%


Filtr:	1 320 000 000	854 255 577,00	465 774 423,00	465 744 423,00	4 044 995 053,77
Celkem prioritní investiční akce	1 320 000 000	854 255 577	465 774 423,00	465 744 423,00	4 044 995 053,77
z toho obnovovací	51 000 000	32 499 598	18 500 000	14 217 500	
z toho rozvojová	391 000 000	13 716 732	208 274 423	106 579 099	
z toho nová	878 000 000	808 039 247	239 000 000	344 947 824	

Náhradní investiční akce		druh investice	výsledná kalkulace 2023				výsledná kalkulace 2024			
			předpokládané investiční výdaje	skutečně vyčerpano 2023 (z dotace)	realizace/nerealizace náhradních investic	předpokládané výdaje 2024	skutečně vyčerpano 2024 (z dotace)*	celková skutečná hodnota investiční akce**	% podíl dotace na investiční akci	
11				0	-	0,00	0,00	0,00		
12				0	-	0,00	0,00	0,00		
13				0	-	0,00	0,00	0,00		
14				0	-	0,00	0,00	0,00		

Celkem náhradní investiční akce	0	0	0,00	0	0
z toho obnovovací	0	0	0	0	
z toho rozvojová	0	0	0	0	
z toho nová	0	0	0	0	

Zpracoval:

Schválil:



1 320 000 000,00	854 255 577,00	465 774 423,00	465 744 423,00 Kč
předpokládané výdaje za veškeré investiční akce	čerpano z dotace v roce 2023 (prioritní a náhradní inv.akce)	předpokládané výdaje r. 2024	čerpano z dotace v roce 2024 (prioritní a náhradní inv. akce)
1 320 000 000,00		465 744 423,00	
max. výše poskytnuté dotace		nedočerpano	
			1 320 000 000,00 Kč
			Σ čerpáno z dotace r. 2023 a 2024

převod do roku 2024

465 744 423,00 Kč

Případné stručné informace k vvúčtování:

Položkový přehled účetních dokladů

Poř.číslo	Pracovní úsek	ID	Název investiční akce	Nákl.druh	Označení nákl.druh	Protiúčet	Popis protiúčtu	Datum účtování	Číslo dokladu	Fakturace	Označení	Čerpáno (uhrazeno)	Reference	Dokl.o vyrovnání	Datum vyrovnání	Číslo účtu
1	2000	2ST20001	Objekt Kardiocentra MNUL	4207000	Pořízení DHM - stave		1002469 Domy společnost s.r.o.	01.05.2023	280000120	108 295,00	SOHZ_AD-kardiocentrum MNUL	108 295,00	235021	310071170	14.07.2023	280078178/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.05.2023	280000134	34 553 651,18	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	12 269 573,10	2308300170	120010419	31.07.2023	280078178/0300
							DPH	31.05.2023	280000134	7 256 266,75	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	3 302 237,03	2308300170	120010419	31.07.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	30.04.2023	280000099	60 567 699,23	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	22 991 642,61	2308300114	120009128	03.07.2023	280078178/0300
							DPH	30.04.2023	280000099	12 719 216,84	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	6 100 166,63	2308300114	120009128	03.07.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	30.06.2023	280000177	49 092 070,65	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	23 078 552,09	2308300245	120011946	28.08.2023	280078178/0300
							DPH	30.06.2023	280000177	10 309 334,84	SOHZ_stav.práce-kardiocentrum	5 877 429,43	2308300245	120011946	28.08.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.07.2023	280000209	61 300 101,26	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	21 532 886,57	2308300308	140302595	29.09.2023	280078178/0300
							DPH	31.07.2023	280000209	12 873 021,26	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	5 809 208,30	2308300308	140302595	29.09.2023	216686400/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	31.07.2023	280000212	85 910,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	85 910,00	235039	310102839	10.10.2023	280078178/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.08.2023	280000236	10 755 804,39	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	3 778 191,41	2308300386	310098152	27.09.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000236	2 258 718,92	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	1 019 292,09	2308300386	310098152	27.09.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.08.2023	280000237	11 690 008,73	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	10 521 007,85	2308300387	310108582	30.10.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000237	2 454 901,83	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	2 454 901,83	2308300387	310108582	30.10.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.08.2023	280000238	4 944 368,65	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	4 449 931,79	2308300388	310108583	30.10.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000238	1 038 317,42	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	1 038 317,42	2308300388	310108583	30.10.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.08.2023	280000239	15 738 601,73	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	14 164 741,56	2308300389	310108584	30.10.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000239	3 305 106,36	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	3 305 106,36	2308300389	310108584	30.10.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.08.2023	280000240	14 020 934,25	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	12 618 840,82	2308300390	310108585	30.10.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000240	2 944 396,19	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	2 944 396,19	2308300390	310108585	30.10.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	30.09.2023	280000280	33 697 250,72	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	13 585 280,18	2308300488	120017209	04.12.2023	280078178/0300
							DPH	30.09.2023	280000280	7 076 422,65	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	3 560 551,10	2308300488	120017209	04.12.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	31.10.2023	280000340	25 261 724,15	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	8 873 685,85	2308300587	120018537	27.12.2023	280078178/0300
							DPH	31.10.2023	280000340	5 304 962,07	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	2 393 970,23	2308300587	120018537	27.12.2023	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	30.11.2023	280000414	29 191 958,58	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	19 809 582,07	2308300709	120018536	27.12.2023	280078178/0300
							DPH	30.11.2023	280000414	6 130 311,30	SOHZ - stav.práce-kardiocentrum	4 773 043,36	2308300709	120018536	27.12.2023	216686400/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	18.12.2023	280000452	341 220,00	SOHZ_nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	341 220,00	235065	310131011	27.12.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	01.11.2023	280000378	218 103,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	218 103,00	235060	310131010	27.12.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	05.02.2023	280000016	24 000,00	koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230006	310034573	06.04.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	23.02.2023	280000039	125 235,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	125 235,00	235007	310037720	17.04.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	02.03.2023	280000050	24 000,00	koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230010	310044589	03.05.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	10.04.2023	280000077	24 000,00	koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230020	310058361	09.06.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	07.05.2023	280000103	24 000,00	koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230023	310068657	07.07.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	07.06.2023	280000145	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP	24 000,00	20230030	310079421	07.08.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	01.06.2023	280000152	178 778,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	178 778,00	235028	310081939	14.08.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	14.07.2023	280000188	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP	24 000,00	20230037	310091982	12.09.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	09.08.2023	280000213	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP	24 000,00	20230043	310101248	09.10.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	01.08.2023	280000224	134 310,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	134 310,00	235017	310086853	28.08.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	11.09.2023	280000248	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230049	310113163	10.11.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	01.09.2023	280000268	203 885,00	SOHZ_AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	203 885,00	235048	310113756	14.11.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	12.10.2023	280000303	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230054	310123575	11.12.2023	280078178/0300
							1002469 Domy společnost s.r.o.	01.10.2023	280000311	115 555,00	AD-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	115 555,00	235054	310125621	14.12.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	12.11.2023	280000365	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230062	310131047	27.12.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	04.12.2023	280000391	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230067	310131048	27.12.2023	280078178/0300
							1013982 Ing. Jaroslav Horák	04.12.2023	280000392	24 000,00	SOHZ_koord.BOZP-nový pav.oper.sálů, JIP a odd.	24 000,00	20230068	310131049	27.12.2023	280078178/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	01.12.2024	280000275	54 651 077,96	přeúčt 28_275/24zNI240002475naNI24_2149 SOHZčástec	49 717 271,01	2408300662	120018174	04.11.2024	216686400/0300
							1018118 DPH	01.12.2024	280000275	11 476 726,37	přeúčt 28_275/24zNI240002475naNI24_2149 SOHZčástec	11 476 726,37	2408300662	120018174	04.11.2024	216686400/0300
							1018118 Metrostav DIZ s.r.o.	01.12.2024	280000322	11 087 968,59	přeúčt 28_322/24zNI240002475naNI24_2149 SOHZ	11 087 968,59	2408300768	310129399	03.12.2024	216686400/0300
							1018118 DPH	01.12.2024	280000322	2 451 024,64	přeúčt 28_322/24zNI240002475naNI24_2149 SOHZ	2 451 024,64	2408300768	310129399	03.12.2024	216686400/0300
2	3000	3ST20001	Urgentní příjem a op. sály CV	4207000	Pořízení DHM - stave		1019816 OHLA ŽS, a.s.	30.06.2023	280000181	35 923 720,82	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	22 146 102,09	3023000485	120012092	04.09.2023	280078178/0300
							DPH	30.06.2023	280000181	7 543 981,37	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	4 650 681,44	3023000485	120012092	04.09.2023	216686400/0300
							1019816 OHLA ŽS, a.s.	31.07.2023	280000215	36 768 817,50	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	23 441 943,75	3023000592	120013635	27.09.2023	280078178/0300
							DPH	31.07.2023	280000215	7 721 451,68	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	4 922 808,19	3023000592	120013635	27.09.2023	216686400/0300
							1019816 OHLA ŽS, a.s.	31.08.2023	280000247	42 084 767,13	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	37 003 893,65	3023000683	120015748	06.11.2023	280078178/0300
							DPH	31.08.2023	280000247	8 837 801,10	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	7 770 817,67	3023000683	120015748	06.11.2023	216686400/0300
							1019816 OHLA ŽS, a.s.	30.09.2023	280000283	29 857 928,26	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	29 857 928,26	3023000794	120017289	05.12.2023	280078178/0300
							DPH	30.09.2023	280000283	6 270 164,93	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JIP,k	6 270 164,93	3023000794	120017289	05.12.2023	216686400/0300
							1019816 OHLA ŽS, a.s.	31.10.2023	280000352	73 087 211,34	*0208**OHLA ŽS, a.s.-Nový pav.Emerg.,COS,JI	73 087 211,34	3023000904	120018532	27.12.2023	280078178/0300
							DPH	31.10.2023	280000352	15 348 314,38	SOHZ-Nový pav.Emerg.,COS,JI	15 348 314,38	3023000904	120018532	27.12.2023	216686400/0300
							1019816 OHLA ŽS, a.s.	20.12.2								

Poř.číslo	Pracovní úsek	ID	Název investiční akce	Nákl.druh	Označení nákl.druhů	Protiúčt	Popis protiúčtu	Datum účtování	Číslo dokladu	Fakturační	Označení	Čerpáno (uhrazeno)	Reference	Dokl.o vyrovnání	Datum vyrovnání	Číslo účtu
						1014976	DPH	01.12.2024	280000168	1 270 831,34	přeúčt 280000168/24zNI640000467naNI640000426-SOHZ	1 270 831,34	2451010047	310076294	15.07.2024	216686400/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	01.12.2024	280000169	46 451 877,61	přeúčt 280000169/24zNI640000467naNI640000426-SOHZ	46 451 877,61	2451010058	120011093	15.07.2024	216686400/0300
						1014976	DPH	01.12.2024	280000169	9 754 894,30	přeúčt 280000169/24zNI640000467naNI640000426-SOHZ	9 754 894,30	2451010058	120011093	15.07.2024	216686400/0300
						1000183	Philips Česká republika s.r.o.	21.12.2023	280000523	41 513 909,36	SOHZ - angiografický přístroj - KARDIO	41 513 909,36	7266016013	120018534	27.12.2023	280078178/0300
5	2000	2ZP22012	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologické oddělení	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1000183	Philips Česká republika s.r.o.	21.12.2023	280000524	32 499 598,12	SOHZ - angiografický přístroj - KARDIO	32 499 598,12	7266016014	120018535	27.12.2023	280078178/0300
6	3000	3ZP23001	Počítačový tomograf pro RDG oddělení	4201000	Pořízení DHM -zdravo	1006243	Stargen EU s.r.o.	20.12.2024	280000434	14 217 500,00	SOHZ_počítačový tomograf vč.přísl.- RDG Chomutov	14 217 500,00	4040000160	310140082	30.12.2024	280078178/0300
7	6000		Pavilon péče o matku a dítě	4207000	Pořízení DHM - stave	1014976	VW WACHAL a.s.	30.09.2024	280000335	647 914,71	SOHZ/stav.pr. 9/24-dod.č.1/Nový pav. péče o MaD	647 914,71	2451010142	310129277	02.12.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	30.09.2024	280000335	136 062,09	SOHZ/stav.pr. 9/24-dod.č.1/Nový pav. péče o MaD	136 062,09	2451010142	310129277	02.12.2024	216686400/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	30.09.2024	280000333	13 674 354,62	SOHZ/staveb.práce 9/24/Nový pav. péče o MaD	13 674 354,62	2451010141	310129276	02.12.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	30.09.2024	280000333	2 871 614,47	SOHZ/staveb.práce 9/24/Nový pav. péče o MaD	2 871 614,47	2451010141	310129276	02.12.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	30.09.2024	300000051	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 9/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24090	310129275	02.12.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	30.09.2024	280000324	54 450,00	SOHZ/technický doz. 9/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240292	310129159	02.12.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.08.2024	280000265	4 037 000,28	SOHZ/staveb.pr. 8/24-dod.č.1/Nový pav. péče o MaD	4 037 000,28	2451010123	310118121	30.10.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.08.2024	280000265	847 770,06	SOHZ/staveb.pr. 8/24-dod.č.1/Nový pav. péče o MaD	847 770,06	2451010123	310118121	30.10.2024	216686400/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.08.2024	280000264	12 499 137,26	SOHZ/staveb.práce 8/24/Nový pav. péče o MaD	12 499 137,26	2451010122	310118120	30.10.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.08.2024	280000264	2 624 818,82	SOHZ/staveb.práce 8/24/Nový pav. péče o MaD	2 624 818,82	2451010122	310118120	30.10.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.08.2024	300000044	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 8/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24073	310118119	30.10.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	30.08.2024	280000263	54 450,00	SOHZ/technický doz. 8/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240235	310116260	29.10.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	31.07.2024	280000251	54 450,00	SOHZ/technický doz. 7/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240232	310107814	03.10.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.07.2024	280000254	15 740 693,01	SOHZ/staveb.pr.7/24-dod.č.1/Nový pav.péče o MaD	15 740 693,01	2451010107	310107772	02.10.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.07.2024	280000254	3 305 545,53	SOHZ/staveb.pr.7/24-dod.č.1/Nový pav.péče o MaD	3 305 545,53	2451010107	310107772	02.10.2024	216686400/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.07.2024	280000253	12 102 829,48	SOHZ/staveb.práce 7/24/Nový pav. péče o MaD	12 102 829,48	2451010106	310107771	02.10.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.07.2024	280000253	2 541 594,19	SOHZ/staveb.práce 7/24/Nový pav. péče o MaD	2 541 594,19	2451010106	310107771	02.10.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.07.2024	300000042	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 7/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24066	310105936	30.09.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	30.06.2024	280000222	54 450,00	SOHZ/technický doz. 6/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240203	310097575	05.09.2024	280078178/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	30.06.2024	300000036	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 6/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24060	310095481	02.09.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	30.06.2024	280000229	11 733 061,25	SOHZ/staveb.práce 6/24/Nový pav. péče o MaD	11 733 061,25	2451010092	310095142	30.08.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	30.06.2024	280000229	2 463 942,86	SOHZ/staveb.práce 6/24/Nový pav. péče o MaD	2 463 942,86	2451010092	310095142	30.08.2024	216686400/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	31.05.2024	280000201	54 450,00	SOHZ/technický doz. 5/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240171	310086847	09.08.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.05.2024	280000208	10 958 675,53	SOHZ/staveb.práce 5/24/Nový pav. péče o MaD	10 958 675,53	2451010070	310084167	02.08.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.05.2024	280000208	2 301 321,86	SOHZ/staveb.práce 5/24/Nový pav. péče o MaD	2 301 321,86	2451010070	310084167	02.08.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.05.2024	300000032	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 4/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24050	310083884	31.07.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	30.04.2024	280000154	54 450,00	SOHZ/technický doz. 4/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240133	310073259	08.07.2024	280078178/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	30.04.2024	300000025	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 4/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24040	310070709	01.07.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	30.04.2024	280000165	6 192 657,32	SOHZ/staveb.práce 4/24/Nový pav. péče o MaD	6 192 657,32	2451010048	310067851	24.06.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	30.04.2024	280000165	1 300 458,04	SOHZ/staveb.práce 4/24/Nový pav. péče o MaD	1 300 458,04	2451010048	310067851	24.06.2024	216686400/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.03.2024	280000115	8 591 335,84	SOHZ/staveb.práce 3/24/Nový pav. péče o MaD	8 591 335,84	2451010031	310059449	03.06.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.03.2024	280000115	1 804 180,53	SOHZ/staveb.práce 3/24/Nový pav. péče o MaD	1 804 180,53	2451010031	310059449	03.06.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.03.2024	300000019	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 3/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24030	310059448	03.06.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	31.03.2024	280000111	54 450,00	SOHZ/technický doz. 3/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240073	310059332	03.06.2024	280078178/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	29.02.2024	280000056	54 450,00	SOHZ/tech.dozor 2/24/Nový pav. péče o M a D	54 450,00	20240062	310048021	03.05.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	01.03.2024	280000073	9 136 382,39	SOHZ/staveb.práce 2/24/Nový pav. péče o MaD	9 136 382,39	2451010017	310047865	02.05.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	01.03.2024	280000073	1 918 640,30	SOHZ/staveb.práce 2/24/Nový pav. péče o MaD	1 918 640,30	2451010017	310047865	02.05.2024	216686400/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	29.02.2024	300000012	8 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 2/24/Nový pav. péče o M a D	8 000,00	24018	310047863	02.05.2024	280078178/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.01.2024	300000006	8 000,00	SOHZ/plán BOZP 1/24/Nový pav. péče o M a D	8 000,00	24009	310036776	05.04.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.01.2024	280000037	5 075 127,94	SOHZ/staveb.práce 1/24/Nový pav. péče o MaD	5 075 127,94	2451010007	310034777	02.04.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.01.2024	280000037	1 065 776,87	SOHZ/staveb.práce 1/24/Nový pav. péče o MaD	1 065 776,87	2451010007	310034777	02.04.2024	216686400/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	31.01.2024	280000035	54 450,00	SOHZ/tech.dozor 1/24/Nový pav. péče MaD	54 450,00	20240034	310026130	08.03.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.	31.10.2024	280000363	8 009 249,16	SOHZ/staveb.pr. 10/24/Nový pav.péče o matku a dítě	8 009 249,16	2451010160	310139636	27.12.2024	280078178/0300
						1014976	DPH	31.10.2024	280000363	1 681 942,32	SOHZ/staveb.pr. 10/24/Nový pav.péče o matku a dítě	1 681 942,32	2451010160	310139636	27.12.2024	216686400/0300
						1000712	INGREAL DECÍN spol. s r.o.	31.10.2024	280000359	54 450,00	SOHZ/technický doz. 10/24/Pav.péče o M a D	54 450,00	20240322	310139534	27.12.2024	280078178/0300
						1014742	Ing. Petr Kapoun	31.10.2024	300000055	6 000,00	SOHZ/výkon koord.BOZP 10/24/Pav.péče o M a D	6 000,00	24109	310139632	27.12.2024	280078178/0300
						1014976	VW WACHAL a.s.									

Poř.číslo	Pracovní úsek	ID	Název investiční akce	Nákl.druh	Označení nákl.druh	Protitůčet	Popis protitůčtu	Datum účtování	Číslo dokladu	Fakturace	Označení	Čerpáno (uhrazeno)	Reference	Dokl.o vyrovnání	Datum vyrovnání	Číslo účtu						
11	5000	5ST23005	Rozšíření Urgentního příjmu	4207000	Pořízení DHM - stave	1023574	Stanislav Hanzlík	04.10.2024	300000053	3 000,00	*0208**Modernizace a rozšíření urgent příjmu-posud	3 000,00	2124		310114014	22.10.2024	280078178/0300					
						1018118	Metrostav DIZ s.r.o.	31.10.2024	280000369	808 378,55	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj	808 378,55	2408300916	310139645	27.12.2024	280078178/0300						
						1018118	DPH	31.10.2024	280000369	169 759,50	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-RCH	169 759,50	2408300916	310139645	27.12.2024	216686400/0300						
						1013596	Correct BC, s.r.o.	26.11.2024	300000060	7 991,81	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-dozor	7 991,81	20240340	310139625	27.12.2024	280078178/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	08.12.2024	300000064	5 785,00	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj BOZP	5 785,00	20240081	310139627	27.12.2024	280078178/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	12.12.2024	300000068	5 785,00	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj BOZP	5 785,00	20240084	310139629	27.12.2024	280078178/0300						
						1013596	Correct BC, s.r.o.	30.11.2024	280000388	23 557,25	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-TDS	23 557,25	20240348	310139623	27.12.2024	280078178/0300						
						1013596	Correct BC, s.r.o.	30.11.2024	280000389	3 339 494,66	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-RCH	3 339 494,66	2408300995	310139646	27.12.2024	280078178/0300						
						1018118	Metrostav DIZ s.r.o.	30.11.2024	280000389	701 293,88	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-RCHVR	701 293,88	2408300995	310139646	27.12.2024	216686400/0300						
						1018118	DPH	30.11.2024	280000389	4 405 997,83	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj RCH	4 405 997,83	2408301096	310139647	27.12.2024	280078178/0300						
						1018118	Metrostav DIZ s.r.o.	16.12.2024	280000417	925 259,54	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíře urgent příj RCH vra	925 259,54	2408301096	310139647	27.12.2024	216686400/0300						
						1018118	DPH	16.12.2024	280000417	925 259,54	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíře urgent příj RCH vra	925 259,54	2408301096	310139647	27.12.2024	216686400/0300						
						1013596	Correct BC, s.r.o.	16.12.2024	280000413	31 084,42	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-TDS	31 084,42	20240380	310139624	27.12.2024	280078178/0300						
						1014506	G DESIGN, spol. s r.o.	16.12.2024	280000415	22 022,00	*0208**SOHZ Moderniz.a rozšíření urgent příj-dozor	22 022,00	2024055	310139631	27.12.2024	280078178/0300						
14	7000	7ST23002	Rekonstrukce porodnice	4207000	Pořízení DHM - stave	1013982	Ing. Jaroslav Horák	06.10.2024	300000050	7 000,00	*0208**SOHZ MODERN. PORODNICE LTM PAVILON E BOZ	7 000,00	20240062	310131159	05.12.2024	280078178/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	08.09.2024	280000277	16 000,00	*0208**SOHZ MODERN.POR.STAV.PRÁCE	16 000,00	20240058	310120773	07.11.2024	280078178/0300						
						1011798	METALL QUATRO spol. s.r.o.	31.08.2024	280000273	591 901,30	*0208**RCH MODERN.PORODNICE STAV.PRÁCE	591 901,30	4240269	310118712	04.11.2024	280078178/0300						
						1011798	DPH	31.08.2024	280000273	124 299,27	*0208**RCH MODERN.PORODNICE STAV.PRÁCE	124 299,27	4240269	310118712	04.11.2024	216686400/0300						
						1011798	DPH	31.08.2024	280000273	124 299,27	*0208**RCH MODERN.PORODNICE STAV.PRÁCE	124 299,27	4240269	310118712	04.11.2024	216686400/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	10.11.2024	300000057	7 000,00	*0208**SOHZ MODERN.PORODNICE 1NP PAV.E	7 000,00	20240068	310139626	27.12.2024	280078178/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	08.12.2024	300000066	5 785,00	*0208** SOHZ DOT.KU MODER. PORODNICE 1NP PAV. E	5 785,00	20240076	310139628	27.12.2024	280078178/0300						
						1013982	Ing. Jaroslav Horák	12.12.2024	300000069	5 785,00	*0208**SOHZ DOT.KU MODER.PORODNICE 1.NP PAVILO	5 785,00	20240082	310139630	27.12.2024	280078178/0300						
						1011798	METALL QUATRO spol. s.r.o.	15.12.2024	280000424	2 059 890,54	SOHZ_stavební práce - modernizace porodnice LT	2 059 890,54	4240383	310139621	27.12.2024	280078178/0300						
						1011798	DPH	15.12.2024	280000424	432 577,01	SOHZ_stavební práce - modernizace porodnice LT	432 577,01	4240383	310139621	27.12.2024	216686400/0300						
						1011766	ČEZ Distribuce, a.s.	05.01.2024	120000105	1 000 000,00	*0208** PŘIPOJENÍ ODBĚR.MÍSTA MO	1 000 000,00	3992248570	310004924	10.01.2024	216686400/0300						
						1008237	DATASYS s.r.o.	29.11.2024	280000393	961 231,26	SOHZ_2x pásková knihovna-licence - URIS	829 053,28	3102411059	310139614	27.12.2024	280078178/0300						
						1021306	Abacus Electric, s.r.o.	13.12.2024	280000408	2 521 414,00	SOHZ_5x server PCS - URIS OPI	2 521 414,00	24201279	310139653	27.12.2024	280078178/0300						
						1002294	Teta s.r.o.	13.12.2024	280000409	5 009 400,00	SOHZ_22x MDR switch 1 - URIS OPI	5 009 400,00	17910824	310139553	27.12.2024	280078178/0300						
1017310	Rexonix s.r.o.	13.12.2024	280000412	8 666 416,88	SOHZ_9x MDR diskové pole 3PAR - URIS OPI	6 432 266,83	2520529	310139642	27.12.2024	280078178/0300												
16	1000	1SW23013	Realizace opatření v souvislosti s MDR (upgrade SW+HW)	4101000 ;4204000	Pořízení dlouhodob.;Pořízení DHM - výpoč	1002651	TECHNISERV spol. s r.o.	17.12.2024	280000421	1 334 176,00	SOHZ_2x MDR páteřní switch 1U - URIS OPI	1 334 176,00	1015260	310139573	27.12.2024	280078178/0300						
						1002651	DPH	17.12.2024	280000421	280 176,96	SOHZ_2x MDR páteřní switch 1U - URIS OPI	280 176,96	1015260	310139573	27.12.2024	216686400/0300						
						1000072	Stapro s.r.o.	13.12.2024	280000426	2 395 800,00	SOHZ_MDR upgrade Medix IM 110000335 - URIS OPI	2 395 800,00	22405797	310139442	27.12.2024	280078178/0300						
						1017310	Rexonix s.r.o.	13.12.2024	280000427	3 252 817,59	SOHZ_3x MDR NOD - URIS OPI	2 788 896,33	2520548	310139643	27.12.2024	280078178/0300						
						1002294	Teta s.r.o.	18.12.2024	280000430	1 867 039,68	SOHZ_MDR segmentační Firewall - URIS OPI	784 089,68	18125124	310139554	27.12.2024	280078178/0300						
						1002294	Teta s.r.o.	19.12.2024	280000431	5 178 800,00	SOHZ_MDR switch II - URIS OPI	5 178 800,00	18153824	310139555	27.12.2024	280078178/0300						
						1021306	Abacus Electric, s.r.o.	20.12.2024	280000433	2 488 508,00	SOHZ_MDR server II - URIS OPI	2 488 508,00	24202325	310140124	30.12.2024	280078178/0300						
						1021194	Networksys a.s.	01.04.2024	280000129	2 419 001,65	MDS 9396T 32G PC switch 16-port - TZ 11/648+9	2 419 001,65	2410070	310045158	25.04.2024	216686400/0300						
											</											

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

a) Seznam realizovaných a dokončených prioritních investičních akcí

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2023-2024 (z dotace)	STAV REALIZACE
	Prioritní investiční akce					
1	Masarykova nemocnice UL	Objekt Kardiocentra MNUL	NOVÁ	100 000 000	286 784 817,48	dokončená investice
2	Nemocnice Chomutov	Urgentní příjem a op. sály CV	NOVÁ	217 500 000	285 973 386,03	dokončená investice
3	Nemocnice Děčín	Urgentní příjem a op. sály DC	NOVÁ	200 000 000	379 303 732,42	dokončená investice
4	Masarykova nemocnice UL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiouchirurgie	NOVÁ	41 500 000	41 513 909,36	dokončená investice
5	Masarykova nemocnice UL	Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiouchirurgie	OBNOVOVACÍ	32 500 000	32 499 598,12	dokončená investice
6	Nemocnice Chomutov	Počítačový tomograf pro RDG oddělení	OBNOVOVACÍ	18 500 000	14 217 500,00	dokončená investice
10	Nemocnice Teplice	Modernizace technického zařízení pavilonu F ve vazbě na modernizaci GYNPOR	ROZVOJOVÁ	30 000 000	73 566 543,76	dokončená investice
16	Krajská zdravotní, a.s.	Realizace opatření v souvislosti s MDR (upgrade SW+HW)	ROZVOJOVÁ	30 000 000	32 461 582,73	dokončená investice

1. „Objekt Kardiocentra MNUL“ - Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca 1 397 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou

Investičním záměrem byla výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

V návaznosti na centralizaci vysoce specializované zdravotní péče byla kapacita zdravotnické infrastruktury Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nedostatečná a rozsah poskytovaných zdravotních služeb byl do značné míry limitován nedostatečným počtem lůžek intenzivní péče, počtem standardních lůžek i počtem operačních sálů. Krajská zdravotní, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na poskytování zdravotních služeb v oboru kardiochirurgie, přičemž pro pokrytí potřeb regionu bylo nezbytné již tak poddimenzovanou zdravotnickou infrastrukturu dále rozšířit. Výhodou shora uvedeného byla výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními, díky kterému došlo k doplnění potřebné infrastruktury k pokrytí vyžadovaných zdravotních služeb. Byly řešeny z hlediska požadavků současné medicíny nevyhovující prostory pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče, která je centralizovaná do zřizovaných center pro její poskytování. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. provozuje 11 těchto center.

Objekt je navržen jako osmipodlažní objekt se sedmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, který je situován v klínu mezi pavilony B a C (operační sály a JIP). V budově je umístěno oddělení KAPIM, kardiocentrum (kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení, kardioanesteziologické oddělení), oddělení Hrudní chirurgie a operační trakt vč. odpovídajícího zázemí, vše plně vyhovující současným požadavkům moderní medicíny.

Jedná se o nový pavilon, který je řešen jako železobetonový skelet založený na základové desce podepřené železobetonovými pilotami. Tuhost objektu je zajištěna doplněním skeletu o železobetonové stěny, které tvoří vertikály a obvodové zdi 1.PP. Stropní desky a schodiště jsou rovněž ze železobetonu.

Programová náplň nového pavilonu:

Výstavba pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie s přibližně 20 915 m² podlahové plochy. Pavilon je umístěn v intravilánu stávajícího areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Obsahem nového pavilonu je:

- a) Centrální operační sály
 - 7 operačních sálů (5 sálů standardních a 2 sály hybridní s angiolinkou, jeden s MR) – jeden ze sálů přísluší ke kardiologii
- b) Kardiologie
 - 3 operační sály (hybridní s angiolinkou)
 - 30 standardních lůžek
 - 6 lůžek denní stacionář
 - 16 lůžek JIP (akutní příjem)
- c) Kardiochirurgie
 - 2 operační sály
 - 15 standardních lůžek
 - 7 lůžek intermediárních
 - 7 lůžek JIP
- d) Hrudní chirurgie
 - 25 standardních lůžek

- 12 lůžek KAPIM
- e) KAPIM a JIP
 - 12 lůžek JIP
 - 12 lůžek KAPIM
- f) Ambulance – centrální umístění – přísluší ke kardiologii, kardiochirurgii a hrudní chirurgii
 - 11 ordinací

Stav prací za rok 2024:

KAPIM – stavebně dokončeno, napojeno na TS4. Proběhly stavební práce pro úpravnu vody – rozvody TZB, elektro, voda.

KARDIO – dokončily se omítky a podlahy, dokončeny čisté vestavby. 2.NP proběhla montáž angio linek PHILIPS, proběhly kompletační práce na OS, kompletace rozvodů elektro a TZB COS/HOS – dokončily se čisté vestavby COS, provedly se vestavby HOS, montáže a kompletace rozvodů TZB, dokončily se omítky a štuky, proběhly výmalby. SIEMENS – proběhla stavební připravenost pro montáž chlazení a provádění prostupů, dokončeny podlahy, montáže ocelových konstrukcí.

Dodávka a montáž speciálního nábytku.


VENKOVNÍ ÚPRAVY – proběhly venkovní úpravy, finalizovaly se práce na komunikaci a opěrné gabionové zdi, náhradní výsadba

OBECNĚ – Proběhly kompletace všech rozvodů, dokončovací práce. Proběhl návoz a montáž MRI. Proběhla realizace orientačního systému.

Proběhly předpřejímkové kontroly DOSS – HZS a KHS pro schválení a projednání změny stavby před jejím dokončením.

Dne 28. 6. 2024 vydán Kolaudační souhlas.

Vizualizace pavilonu:

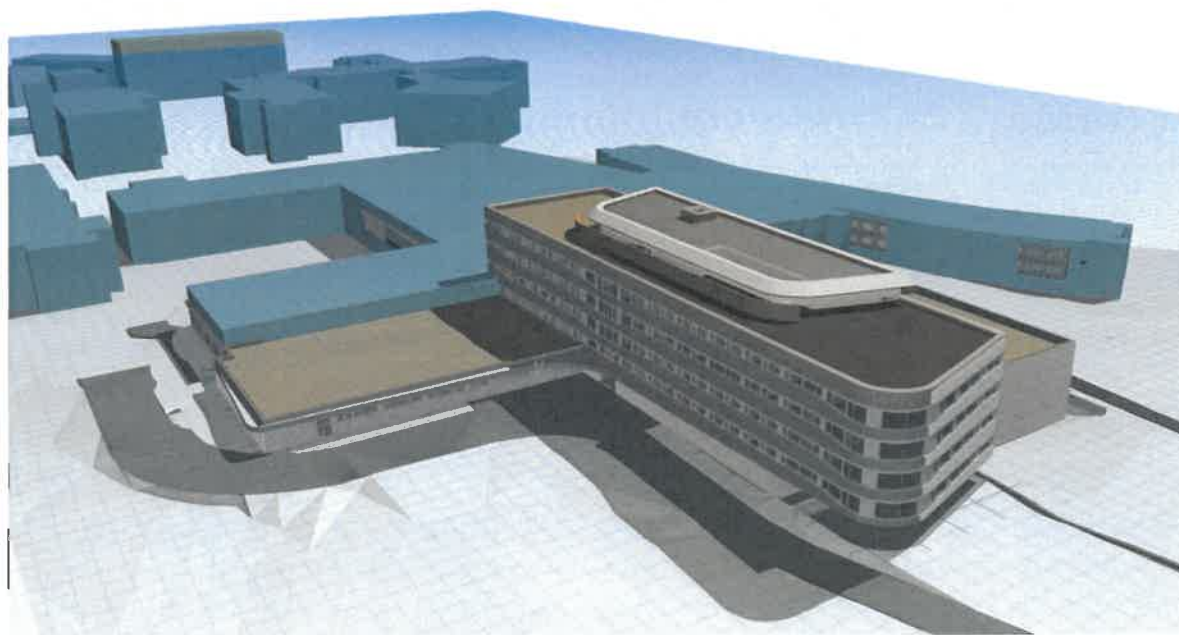



Aktuální fotografie z probíhající výstavby za rok 2024:









Náklady stavební části a technologických celků:

Náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí dle smlouvy o dílo uzavřené na základě realizované veřejné zakázky a následně uzavřených dodatků ke smlouvě 1 793 503 643,22 Kč, uvedená hodnota nezahrnuje vybavení zdravotnickou technikou a náklady na zabezpečení TDS a AD.

Cena díla dle SoD:

1 397 493 297 Kč vč. DPH

Dodatek č. 1:

2 195 948,87 Kč vč. DPH

Dodatek č. 2:	3 228 333,17 Kč vč. DPH
Dodatek č. 3:	40 390 857,73 Kč vč. DPH
Dodatek č. 4:	20 937 254,31 Kč vč. DPH
Dodatek č. 5:	14 672 681,32 Kč vč. DPH
Dodatek č. 6:	40 547 725,19 Kč vč. DPH
Dodatek č. 7:	16 965 330,44 Kč vč. DPH
Dodatek č. 8:	176 821 840, 33 Kč vč. DPH
Dodatek č. 9	66 127 804, 33 Kč vč. DPH
Dodatek č. 10	14 122 570, 53 Kč vč. DPH

Harmonogram realizace:

Dokončení projektové dokumentace:	12/2019
Vyhlášení veřejné zakázky:	29. 5. 2020
Uzavření smlouvy o dílo:	29. 9. 2020
Zahájení stavebních prací:	29. 10. 2020
Dokončení stavebních prací dle SoD:	20. 12. 2023 - doba realizace 3,2 roku (1147 dní)
Prodloužení termínu dokončení:	31. 7. 2024 dle dodatku
Kolaudace	28. 6. 2024

Zhotovitel:

Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ s vedoucím členem sdružení spol. Metrostav a.s.

Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady 1. finanční etapy:	150,0 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady 2. finanční etapy:	529,0 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady 3. finanční etapy:	579,0 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady 4. finanční etapy:	222,5 mil. Kč

Celkové investiční náklady investiční akce: **1 885 100 466,54 Kč vč. DPH**

Investiční náklady financované z investiční dotace SOHZ v roce 2024: **286 784 817,48 Kč vč. DPH**

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala, v jejichž prostorách bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 a 23. 6. 2020.

Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujícími usneseními Rady Ústeckého kraje – Usnesení č. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/29Z/2020 ze dne 20.4.2020.

Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to včetně požadavků pacientů.

2. „Urgentní příjem a op. sály CV“ - Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. – cca 834 mil. Kč, 969 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou

Předmětem investičního záměru byla výstavba nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, jednotek intenzivní péče a nadzemního spojovacího koridoru do stávajícího pavilonu „D“.

Současná moderní medicína jako jeden ze základních požadavků vyžaduje centralizaci diagnostiky a řešení zdravotního stavu u akutních případů, což je možné zajistit pouze budováním vysokoprahových či nízkoprahových urgentních příjmů (emergency), na kterých je soustředěna diagnostika a zdravotní péče napříč medicínskými odbornostmi, přičemž na ně navazuje potřebná zdravotnická infrastruktura v podobě operačních sálů, jednotek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení. V Nemocnici Chomutov, o.z. takovéto pracoviště doposud neexistovalo a příjem pacientů se závažným zdravotním stavem byl řešen řadou organizačních opatření, která však plnohodnotně nemohly zajistit úroveň zdravotních služeb, poskytovaných na pracovištích urgentních příjmů. Značnou nevýhodou předešlé podoby chomutovské nemocnice byl kromě chybějícího urgentního příjmu rovněž dislokace oddělení ARO, chirurgického a ortopedického oddělení, CT a NMR od pavilonu „dostavby“, ve kterém jsou umístěna nechirurgická oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení a oddělení zdravotnického komplementu, kdy je v řadě případů pacientům s akutním zdravotním stavem nezbytné zajišťovat jejich transport mezi jednotlivými objekty venkovním prostředím či sanitními vozy. Vedle toho jsou v rámci chirurgického a ortopedického oddělení provozovány operační sály, které neodpovídají současným požadavkům a potřebám moderní medicíny a dlouhodobě bylo jejich používání neudržitelné. Uvedené nedostatky nelze řešit dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi stávající infrastruktury, ale bylo možné je řešit pouze novou výstavbou pavilonu Emergency, zahrnujících vlastní urgentní příjem, operační sály, jednotky intenzivní péče vč. ARO, přičemž díky spojovacímu koridoru budou odpovídajícím způsobem umožněny transporty pacientů na diagnostická vyšetření na CT, popř. NMR a dále pak jsou zabezpečeny služby komplementu a dostupnost konziliárních služeb napříč všemi odbornostmi. Součástí této investiční akce byly rovněž nezbytné přeložky, demolice stávajících objektů.

Popis záměru

Předmětem investičního záměru bylo vybudování nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem „G“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. Spojovacím koridorem došlo k nezbytnému propojení chirurgických pavilonů s interními pavilony.

Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu

1. NP Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová část, expektace (4 lůžka)
ARO 10 lůžek
2. NP Operační sály (5 sálů), centrální sterilizace, JIP 10 lůžek
3. NP Technické a administrativní zázemí

Stav prací za rok 2024:

Připojení k elektrice – pavilon připojen fyzicky v TS, 10. 1. 2024 proběhlo revizní měření odporů kabelů a došlo k nahození deonů. - finálně připojeno dne 16. 1. 2024.

Proběhly dokončovací práce a průběžné odstraňování vad a nedodělků subdodavatelů na základě přejímek GDS.

Venkovní práce – navezena ornice, terénní úpravy

Proběhl návoz vnitřního vybavení (nerezová skříně na chemikálie, dále úklidové vozíky, proběhlo vzorkování laminátového nábytku) a instalace dávkovačů (mýdlo, ručníky, háčky atp.) na hygienické zázemí a kuchyňských koutů, návoz zdravotnického mobiliáře.


Proběhly dokončovací práce na teracu – finální broušení a montáž soklů.


Na základě prohlídky HZS proběhla montáž podhledů v plném rozsahu (požadavek HZS na vizuální kontrolu stavebních konstrukcí, kabeláže, požár. ucpávek, atp.).

Proběhly provozní zkoušky veškerého zařízení – MaR, VZT, výtahy EPS atp.

Došlo k zprovoznění systémů IT.

Vizualizace

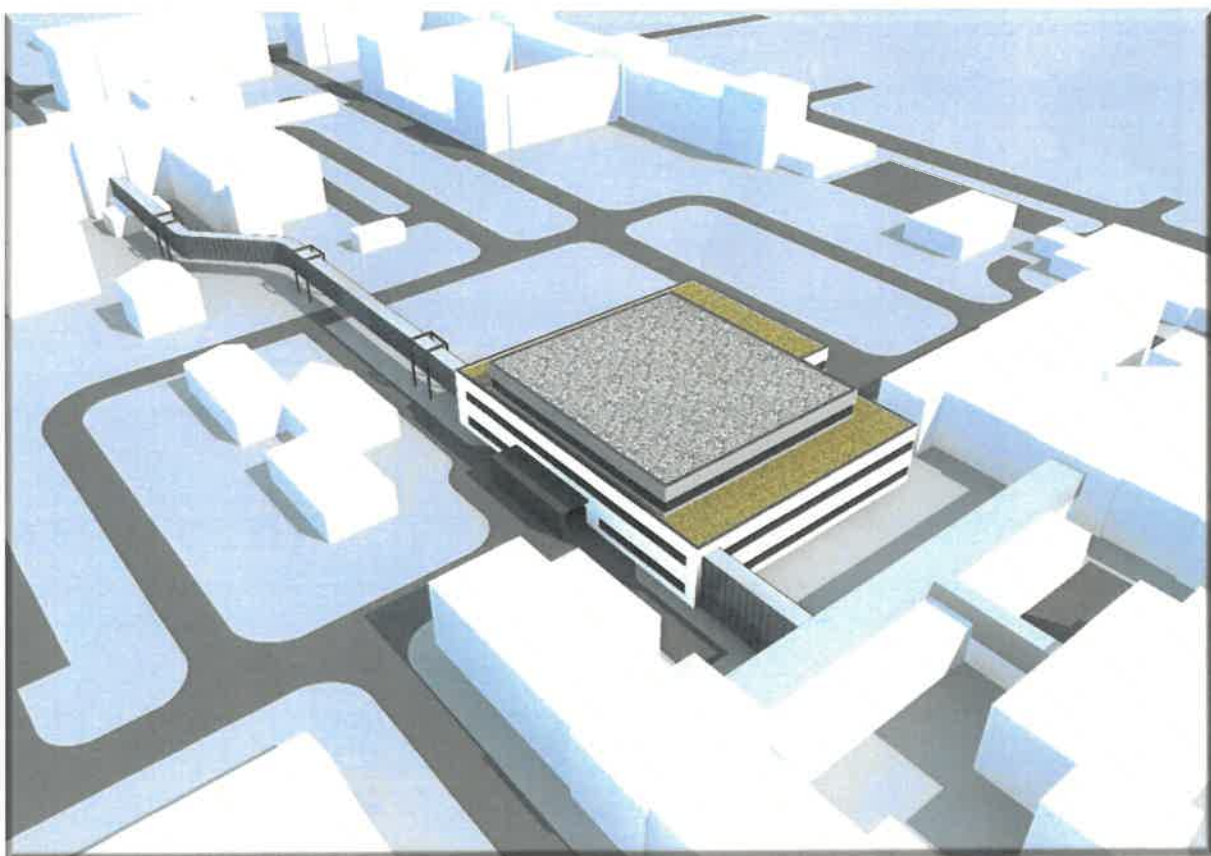

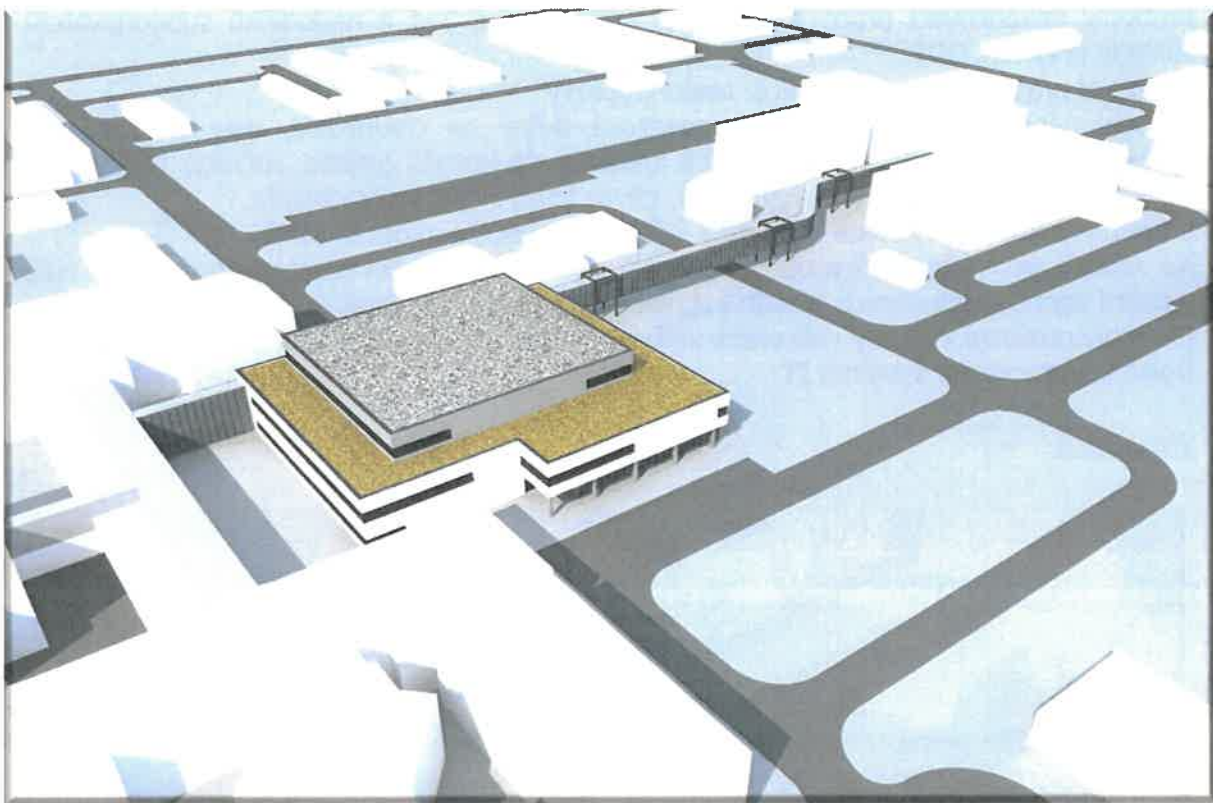

Fotografie z probíhající výstavby za rok 2024:











Náklady stavební části a technologických celků:

Náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí dle smlouvy o dílo uzavřené na základě realizované veřejné zakázky vč. dodatků 884 942 020,-Kč, uvedená hodnota nezahrnuje vybavení zdravotnickou technikou a náklady na zabezpečení TDS a AD a požadované navýšení ceny v důsledku skokových změn cen materiálu.

Cena díla dle VZ:	833 862 444,36 Kč vč. DPH
Dodatek č. 1:	4 787 815 Kč vč. DPH
Dodatek č. 2:	1 786 395,12 vč. DPH
Dodatek č. 3:	- 17 961 106,99 vč. DPH
Dodatek č. 4:	10 959 929, 71 vč. DPH
Dodatek č. 5:	prodloužení termínu do 28. 3. 2024
Dodatek č. 6:	26 479 141,04 Kč vč. DPH
Dodatek č. 7:	25 027 401,63 Kč vč. DPH (vč. indexace cen)

Harmonogram:

Dokončení projektové dokumentace:	11/2019
Vyhlášení veřejné zakázky:	21. 5. 2021
Uzavření smlouvy o dílo:	13. 9. 2021
Zahájení stavebních prací:	23. 9. 2021
Dokončení stavebních prací:	15. 12. 2023 (vč. legislativního povolení užívání díla)
Prodloužení termínu dokončení:	31.3.2024
Předání dokončeného díla:	22.3.2024
Legislativní povolení užívání stavby:	25.3.2024 (zkušební provoz)
Kolaudace:	27.11.2024

Zhotovitel:

Sdružení společností Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“
Vedoucí společník – OHL ŽS, a.s.

Celkové investiční náklady investiční akce: **980 288 849,61 Kč vč. DPH**

Investiční náklady financované z investiční dotace SOHZ v roce 2024: **285 973 386,03 Kč vč. DPH**

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala a za pomoci níž bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. poskytovat Služby – zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 a 23. 6. 2020.

Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujícími usneseními Rady Ústeckého kraje – Usnesení č. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/29Z/2020 ze dne 20.4.2020.

Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to včetně požadavků pacientů.

3. „Urgentní příjem a op. sály DC“ - Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – I. Etapa, cca 915 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou

Předmětem investičního záměru byla výstavba nového pavilonu Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně také vybudování nových parkovacích míst ve dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra (I. Etapa). Součástí záměru bylo také vybudování nadzemního spojovacího koridoru nového pavilonu s pavilonem „I“, výstavba nového pavilonu Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska na místě pavilonu bývalého dětského oddělení (II. etapa).

Současná moderní medicína jako jeden ze základních požadavků vyžaduje centralizaci diagnostiky a řešení zdravotního stavu u akutních případů, což je možné zajistit pouze budováním vysokoprahových či nízkoprahových urgentních příjmů (emergency), na kterých je soustředěna diagnostika a zdravotní péče napříč medicínskými odbornostmi, přičemž na ně navazuje potřebná zdravotnická infrastruktura v podobě operačních sálů, jednotek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení. V Nemocnici Děčín, o.z. takovéto pracoviště neexistovalo a příjem pacientů se závažným zdravotním stavem byl řešen řadou organizačních opatření, která však plnohodnotně nemohla zajistit úroveň zdravotních služeb, poskytovaných na pracovištích urgentních příjmů. Určitou nevýhodou děčínské nemocnice bylo kromě chybějícího urgentního příjmu rovněž dislokace pavilonu chirurgických oborů a pavilonu interních onemocnění, kdy bylo v řadě případů pacientům s akutním zdravotním stavem nezbytné zajišťovat jejich transport mezi jednotlivými pracovišti sanitními vozy. Vedle toho byly v rámci chirurgického oddělení provozovány operační sály, které neodpovídaly současným požadavkům a potřebám moderní medicíny a dlouhodobě bylo jejich používání neudržitelné. Uvedené nedostatky nešlo řešit dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi stávající infrastruktury, ale bylo možné je řešit pouze novou výstavbou pavilonů Emergency, zahrnujících vlastní urgentní příjem, operační sály vč. centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče, porodního traktu a hemodialýzy, přičemž díky spojovacímu koridoru budou odpovídajícím způsobem zabezpečeny služby komplementu a dostupnost konziliárních služeb napříč všemi odbornostmi. Součástí této investiční akce byly rovněž nezbytné přeložky, demolice stávajících objektů a řešení energetického hospodářství, ve vazbě na vlastní urgentní příjem pak parkoviště pro klienty urgentního příjmu.


Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu operačních sálů a Emergency (I. etapa)


- 1. NP – Technické podlaží a šatnové zázemí personálu. Samostatný vstup pro personál.
- 2. NP – Vstup do objektu – urgentní příjem pacientů, nově vytvořený vjezd pro RZS z ulice Lužická. Urgentní příjem obsahuje expektační pokoj, 2 zákrové sálky, 3 lůžka crash roomu. Součástí podlaží je i část RDG oddělení – pracoviště CT.
- 3. NP – Operační trakt a centrální sterilizace operační trakt je tvořen 4 operačními sály včetně pooperačního pokoje s 6 lůžky, centrální sterilizace s 3 sterilizátory. Podlaží je navázáno na lůžkové oddělení chirurgie.
- 4. NP – Podlaží, které obsahuje oddělení intenzivní péče, je tvořeno 8 lůžky JIP, 6 lůžky ARO, dále je součástí gynekologicko-porodnické části pavilonu E i nová slehárenská část porodnice se 3 porodními pokoji, operačním sálem a dalším zázemím porodního oddělení.

Prováděné práce za rok 2024:

Kompletace elektro sil. + slaboproud. – funkční zkoušky, programování MaR, VZT, EPS – funkční zkoušky, Revize elektro
Kompletace a propojení ZTI a ÚT, Montáže LT (Medimosty apod.)
Montáže VO, Kompletace závor, NO apod.
Dokončeny stavební práce pro montáž technologií
Návozy a montáže VZT části pro Diesel generátor
Návozy a montáže výfukového systému pro Diesel generátor
Proběhla přepojení a zkouška DAG, 23.1. přepojení stávajících rozvaděčů.
Komunikace a chodníky – nátěry, dopravní značení apod.
Montáž a kompletace dveří a systémů v komunikačním koridoru

OBECE – Proběhly dokončovací práce, předpřejímky místností od 1.NP, Objekt E – kompletace, proběhl návoz CT, příprava podlah a místnosti pro SKIAGRAF -16.1. návoz technologie SKIAGRAF. Školení ODP – medicínální plyny, slaboproud, VZT a chlazení. Plán na dveře, výtahy, EZS. Proběhla funkční zkouška EPS a zkoušky pro HZS. Dokončeno nastavení systému Videomanagementu.

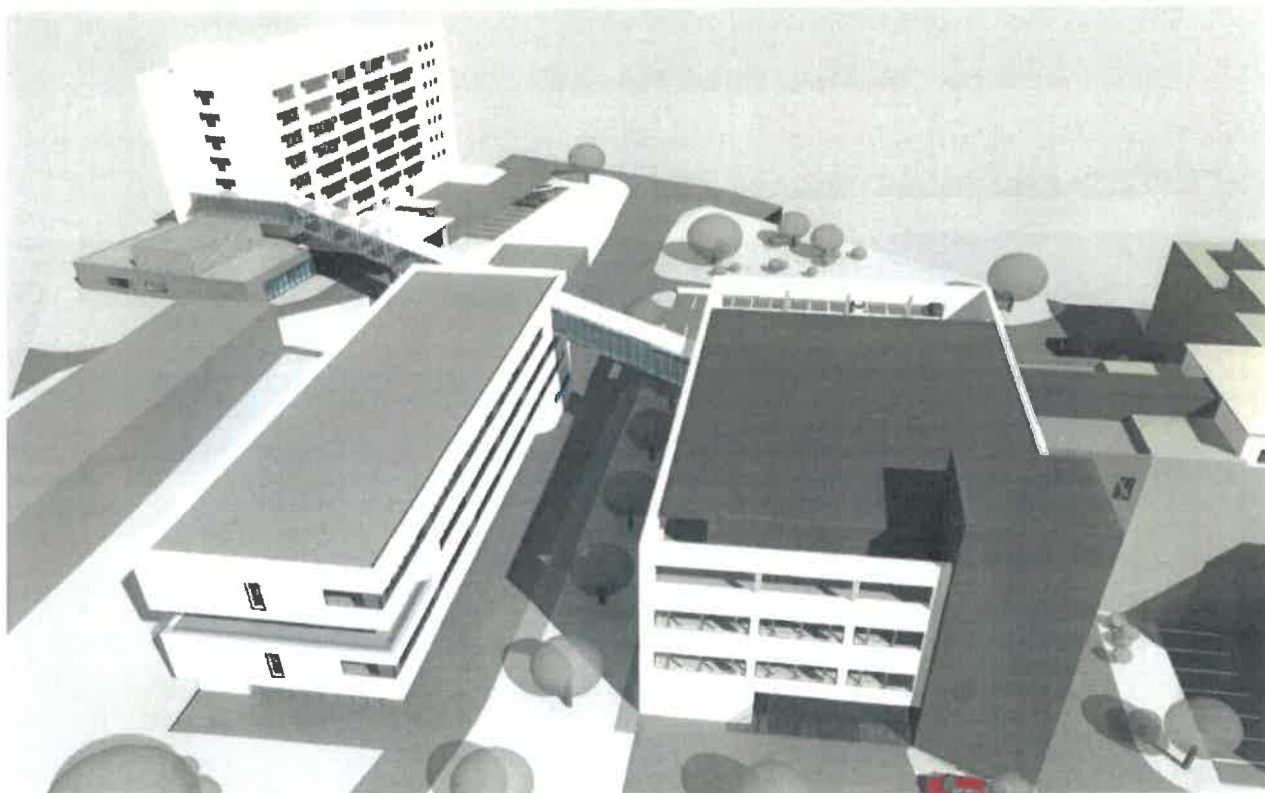
Vizualizace:

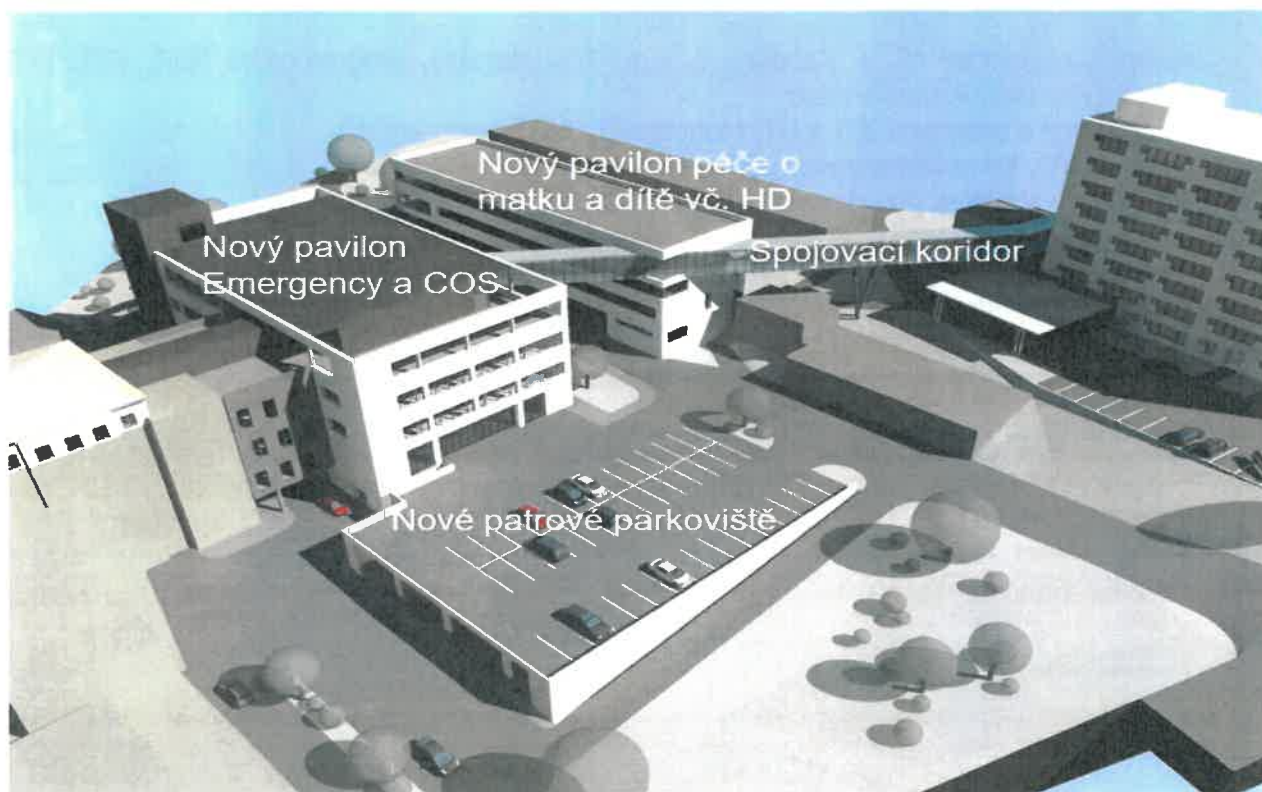

Fotografie z probíhající stavby za rok 2024:





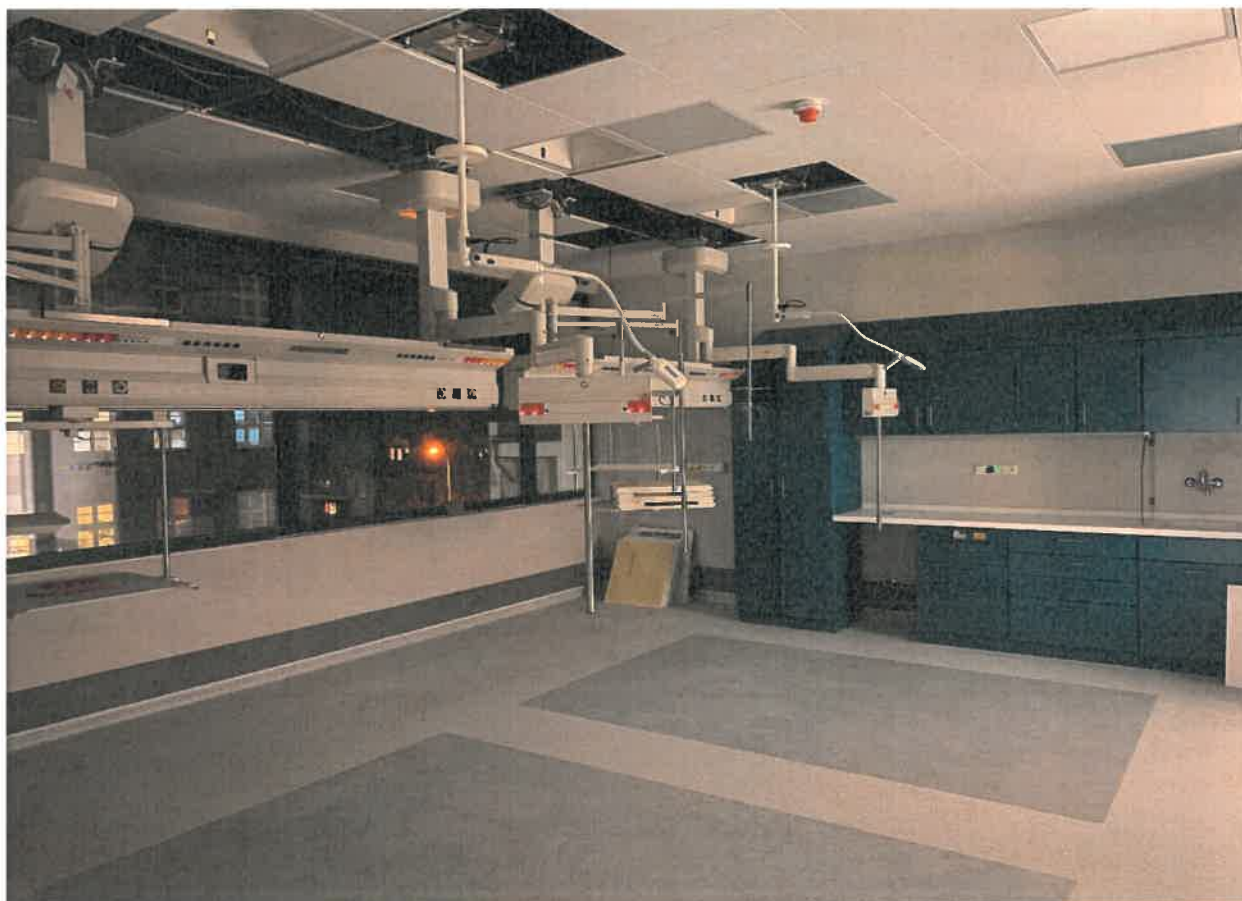





Náklady stavební části a technologických celků:

Náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí dle smlouvy o dílo uzavřené na základě realizované veřejné zakázky vč. smluvních dodatků 952 952 661,32 Kč, uvedená hodnota nezahrnuje vybavení zdravotnickou technikou a náklady na zabezpečení TDS a AD a požadované navýšení ceny v důsledku skokových změn cen materiálu.

Cena díla dle VZ:	784 406 795,05 Kč vč. DPH
Dodatek č. 1:	3 094 476, 08 Kč vč. DPH
Dodatek č. 2:	9 391 329,27 Kč vč. DPH
Dodatek č. 3:	9 718 019, 95 Kč vč. DPH
Dodatek č. 4:	5 819 828,63 Kč vč. DPH
Dodatek č. 5:	33 002 198,18 Kč vč. DPH
Dodatek č. 6:	34 891 126, 39 Kč vč. DPH
Dodatek č. 7:	16 422 116, 74 Kč vč. DPH
Dodatek č. 8:	prodloužení termínu do 31. 3. 2024
Dodatek č. 9:	16 642 508, 80 Kč vč. DPH + indexace cen 21 729 449,06
Kč vč. DPH	
Dodatek č.10:	17 834 813, 16 Kč vč. DPH

Předpokládaný harmonogram (I. etapa):

Dokončení projektové dokumentace:	01/2019
Vyhlášení veřejné zakázky:	21. 5. 2021
Uzavření smlouvy o dílo:	22. 9. 2021
Zahájení stavebních prací:	4. 10. 2021
Dokončení stavebních prací:	15. 12. 2023 (vč. legislativního povolení užívání díla)
Prodloužení termínu:	31.3.2024
Kolaudační souhlas vydán:	11. 3. 2024

Zhotovitel:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlíntav a.s.

Celkové investiční náklady investiční akce: **980 778 520,12 Kč vč. DPH**

Investiční náklady (2023-2024) financované z investiční dotace SOHZ: **379 303 732,42 Kč vč. DPH**

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 a 23. 6. 2020.

Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujícími usneseními Rady Ústeckého kraje – Usnesení č. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 017/29Z/2020 ze dne 20.4.2020.

Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to včetně požadavků pacientů.

4. „Angiografický rtg. komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Angiografický rtg. komplet vč. příslušenství je určen pro nový operační sál Kardiologické kliniky v rámci výstavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

V Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla zahájena výstavba nového pavilonu Centra komplexní kardiiovaskulární péče s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními. Součástí tohoto pavilonu jsou nové operační sály Kardiologické kliniky. V rámci zajištění zdravotnických technologií pro tyto operační sály je nutné pořídit nový angiografický rtg. systém vč. příslušenství s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro potřeby zejména arytmologie-elektrofyzologie a částečně i intervenční kardiologie. Oddělení elektrofyzologie na Klinice kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajské zdravotní, a.s. je jediným specializovaným pracovištěm pro spádovou oblast Ústeckého kraje čítající více než 830 000 obyvatel. Zajišťuje specializované výkony u nemocných s různými typy srdečních arytmií – katetrizační ablace arytmií včetně ablací s 3D mapovacím systémem. Počty výkonů každým rokem narůstají (rok 2020–151 výkonů, rok 2021–217 výkonů) a stejně tak i komplexnost výkonů s čímž je spojeno i prodlužování doby výkonů. Ablace komplexních forem arytmií s pomocí 3D mapování jsou o více než 1 hod delší oproti běžným výkonům. Podle údajů z celonárodních registrů dochází k růstu počtu arytmiologických výkonů celorepublikově. Z důvodu neustále se zvyšujícího věku obyvatel, jejich nemocnosti, zvyšující se prevalence arytmií, zlepšení diagnostiky a možností léčby je jednoznačný předpoklad dalšího růstu počtu arytmiologických zákroků.

V současné době se všechny elektrofyzilogické výkony provádí na angiografickém kompletu pracoviště invazivní kardiologie. Sál je pro potřeby elektrofyzologie k dispozici 3x týdně v době od 11:00 – 15:30 díky vstřícnosti pracoviště invazivní kardiologie. I přes vstřícnost kolegů na těchto sálech nestačí souhrnná sálová kapacita pro arytmologii v současné době k možnosti ani minimálního růstu počtu zejména komplexních výkonů s využitím 3D mapování. Samozřejmě dochází i k limitaci pracoviště invazivní kardiologie a výsledkem je prodlužování čekací doby na vyšetření jak na elektrofyzilogické zákroky, tak i na výkony prováděné na pracovišti invazivní kardiologie (zejména selektivní koronarografie). Tento stav je vzhledem k výše uvedeným důvodům nadále neudržitelný, a proto chceme pracoviště elektrofyzologie vybavit novým angiografickým kompletem. Tento přístroj by současně sloužil i jako záloha pro pracoviště invazivní kardiologie v případě nenadálých situací (porucha, léčba IM v případě obsazení zbývajících 2 angiolinek, ...atd.).

Celkové investiční náklady: 41 513 909,36 Kč vč. DPH

Realizace: 12/2023


Datum převzetí 21.12.2023

Dodavatel: Philips Česká republika, s.r.o.

Jedná se o novou investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace výše uvedené investiční akce byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

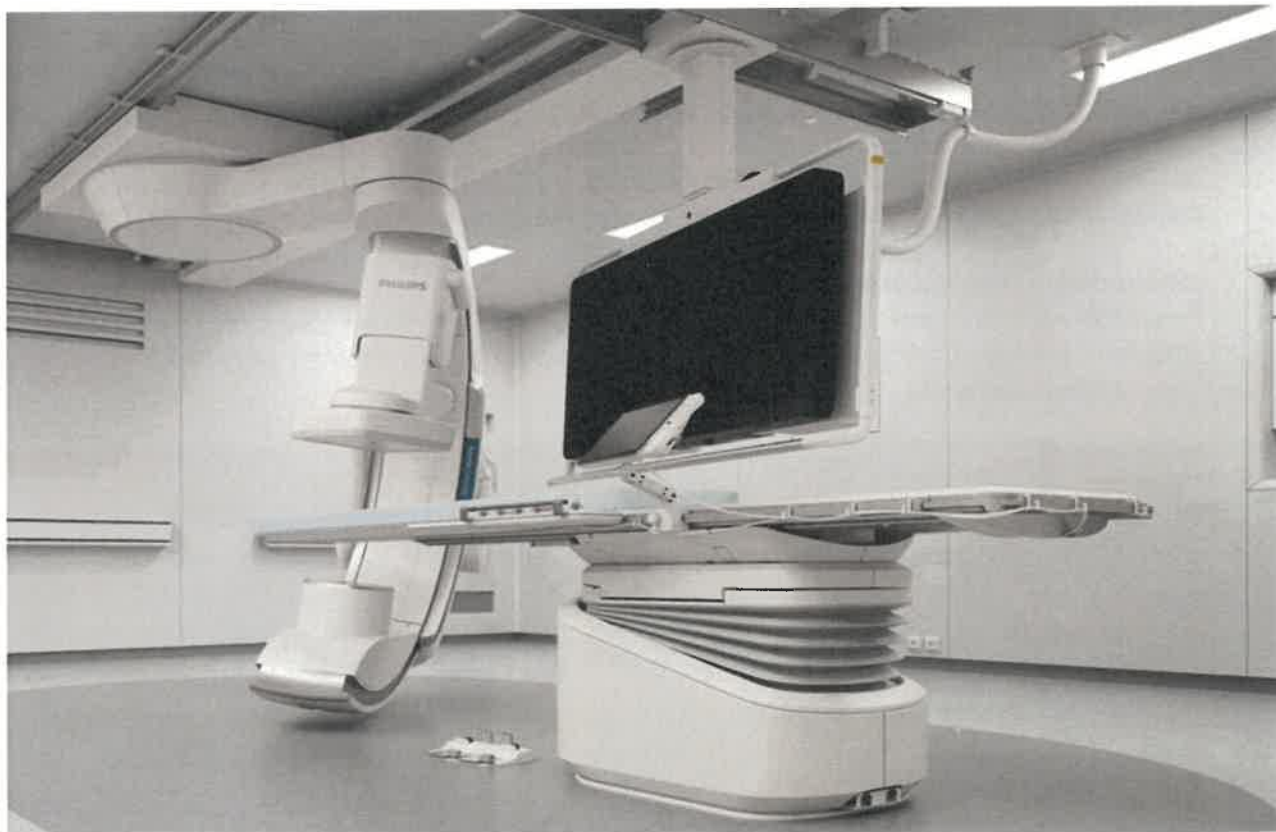

5. Angiografický rtg komplet vč. příslušenství pro Kardiologickou kliniku v novém pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Angiografický rtg. komplet vč. příslušenství je určen pro nový operační sál Kardiologické kliniky v rámci výstavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

V Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla zahájena výstavba nového pavilonu Centra komplexní kardiiovaskulární péče s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními. Součástí tohoto pavilonu jsou nové operační sály Kardiologické kliniky. V rámci zajištění zdravotnických technologií pro tyto operační sály je nutné provést obnovu stávajícího kardio-angiografického systému Siemens Artis Zee floor. Tento systém byl pořízen v roce 2013 a je na hranici morální a technické živostnosti. Svými

parametry a SW vybavením již nesplňuje standardní kritéria pro moderní kardio – angiografická vyšetření.

Celkové investiční náklady: 32 499 598,12 Kč vč. DPH

Realizace: 12/2023

Datum převzetí 21.12.2023


Dodavatel: Philips Česká republika, s.r.o.

Obnovovaná technologie: Artis Zee Floor, výrobce Siemens HealthCare, rok výroby 2013

Jedná se o obnovovací investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace výše uvedené investiční akce byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

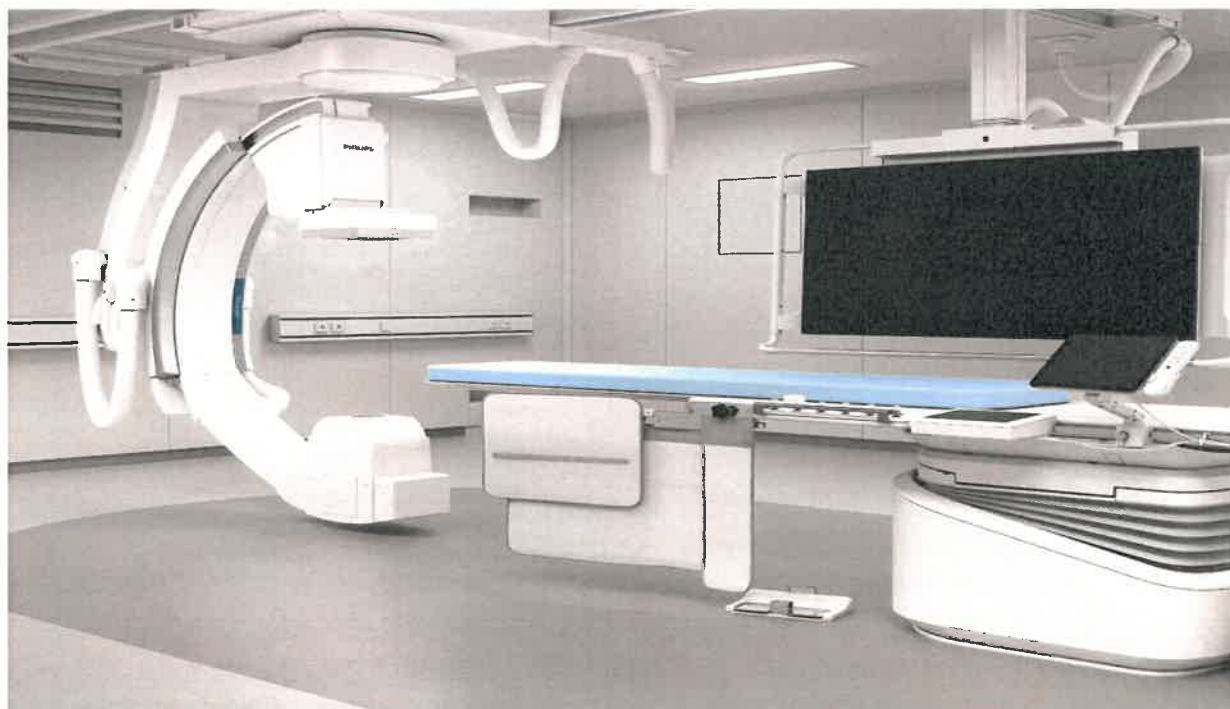

6. Počítačový tomograf pro RDG oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Obnova počítačového tomografu byla nutná vzhledem ke stáří stávajícího CT Siemens Somatom AS 64 r.v. 2011. Jedná se o základní diagnostickou modalitu v rámci RDG oddělení. Stávající CT již nesplňovalo nároky na moderní diagnostické vyšetřovací metody. Dále je avizováno ukončení servisní podpory. Dalším důležitým argumentem je nutnost plné funkčnosti v rámci iktového centra (výměna CT každých 8 let).

Obnovovaná technologie: CT Siemens Somatom AS 64, výrobce Siemens HealthCare, rok výroby 2011

Celkové investiční náklady: 14 217 500 Kč vč. DPH

Realizace: 12/2024

Datum převzetí: 20.12.2024

Typ: GE Revolution Ascend

Výrobce: GE HealthCare


Dodavatel: Stargen EU s.r.o.

Jedná se o obnovovací investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace výše uvedené investiční akce byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.



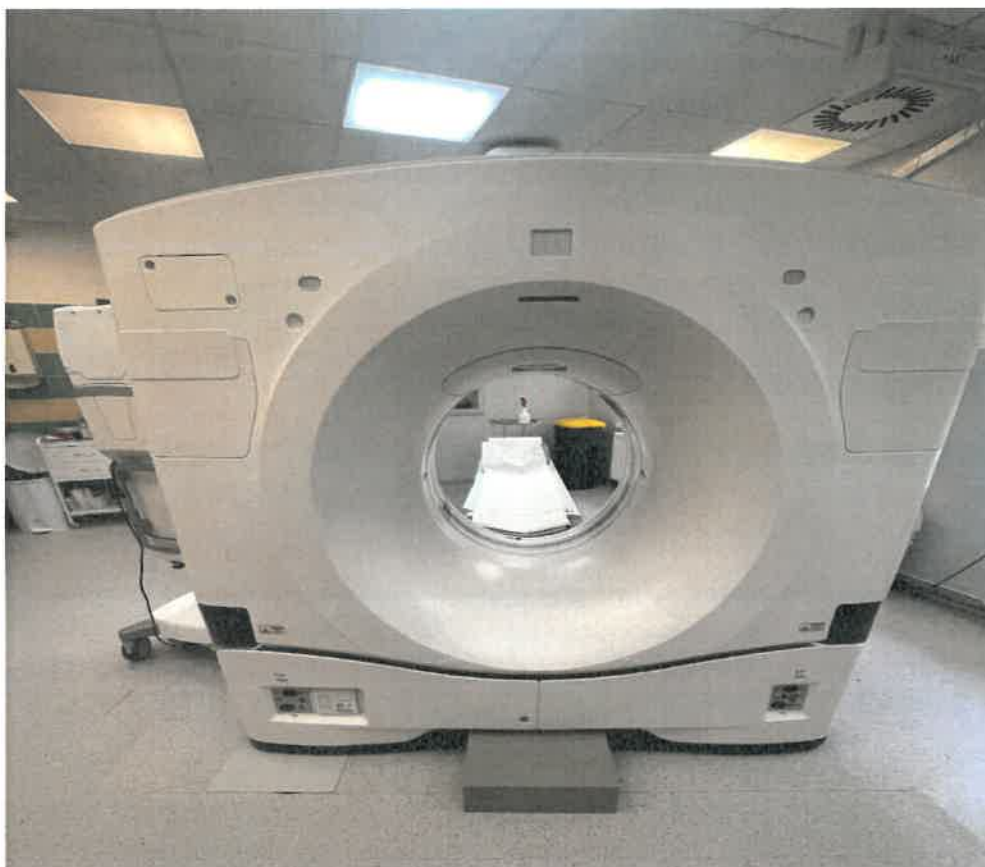

10. Modernizace technického zařízení pavilonu "F" ve vazbě na modernizaci GYNPOR, cca 30 mil. Kč

Předmětem investičního záměru byla modernizace technického zařízení pavilonu "F" ve vazbě na probíhající modernizaci gynekologicko porodnického oddělení teplické nemocnice, a to především v důsledku potřeby řešení nevyhovujících kapacit a technického stavu inženýrských sítí a technického zařízení budov (dále TZB).

„Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“

Cílem modernizace zdravotně technických instalací bylo zejména zkapacitnění a odstranění stávajícího havarijního technického stavu rozvodů vody (SV, TUV, C) a kanalizace (splašková, dešťová) v daných částech zájmového objektu. Provedly se nové vodovodní stoupačky a obezdívky stoupaček včetně protipožárních prostupů.

Modernizace rozvodů ZTI v části C a D pavilonu F -

Zhotovitel:	Společnost „SDR Porodnice – ZTI. Teplice POHL – BLOCK“
Cena stavebních prací:	25 182 962,- Kč vč. DPH
Smlouva podepsána dne:	25. 8. 2023
Předání staveniště:	31. 8. 2023
Dodatek č.1	14 506 477,10 Kč vč. DPH
Kolaudace:	26.8.2024

„Modernizace elektrotechnických instalací v pavilonu F vč. nové objektové přípojky z trafostanice TS1, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“

Předmětem byla modernizace elektrotechnických instalací v rámci stávajícího pavilonu F na úrovni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, a to včetně zřízení nové přípojky NN ze stávající trafostanice TS1. Zároveň bylo v rámci záměru nutné řešit i systém elektronické požární signalizace (EPS) a nouzový zvukový systém (NZS). Proběhly práce na nové elektropřípojce a provedlo se přepojení objektu na nové trasy a rozvaděč.

Modernizace elektroinstalací-

Zhotovitel:	Metrostav DIZ, s.r.o.
Cena stavebních prací:	31 592 114,80 Kč vč. DPH
Smlouva podepsána dne:	14. 11. 2023
Předání staveniště:	16. 11. 2023
Dodatek č.1	2 058 063,48 Kč vč. DPH
Kolaudace:	14.6.2024

Celkové investiční náklady investiční akce: **73 566 543,76 Kč vč. DPH**

Investiční náklady (2023-2024) financované z investiční dotace SOHZ: **74 221 428 Kč vč. DPH**

Fotografie z probíhající stavby za rok 2024:





Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je modernizace inženýrských sítí a technologických zařízení, díky kterým bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice,

o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020

Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to včetně požadavků pacientů.

16. Realizace opatření v souvislosti s MDR (upgrade SW+HW), investiční náklady cca 30 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je dílčí realizace opatření k naplnění nových legislativních požadavků v oblasti zdravotnických prostředků, kdy v souladu s „MDR“ bude nezbytné zajistit jejich důslednou evidenci v rámci distribuce a používání, a to jak u distributorů, tak u poskytovatelů zdravotních služeb. Konkrétně jde o Nařízení evropského parlamentu a rady 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které stanoví pravidla pro uvádění na trh, dodávání na trh nebo uvádění do provozu humánních zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v Unii. Krajská zdravotní, a.s. bude v rámci dílčí realizace opatření zabezpečovat upgrade některých SW produktů, zejména pak nemocničního informačního systému FONS Enterprise, Lékárenského informačního systému, informačního systému pro logistiku NEOS, Middleware pro zajištění distribuce dat mezi systémy a zajištění výpočetní a úložné kapacity pro běh těchto systémů včetně povinné evidence užití až na konkrétního pacienta.

Předpokládané náklady

Předpokládané náklady na realizaci opatření činí cca 30 mil. Kč.

Předpokládaný harmonogram:

Realizace zadávacího řízení:	4.Q/2023
Zahájení dodávek a prací:	1.Q/2024
Dokončení dodávek a prací:	4.Q/2024

Jedná se o **rozvojovou investici**, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Celkové investiční náklady investiční akce: **36 374 782,02 Kč vč. DPH**

Investiční náklady financované z investiční dotace SOHZ v roce 2024: **34 461 582,73 Kč vč. DPH**

V rámci jedenácti proběhlých veřejných zakázek bylo dosaženo nákupu následujících zakázek



Rozšíření datové infrastruktury o aktivní prvky - Switche .



Realizace: 12/2024


Datum převzetí: 12. 12. 2024, 19. 12. 2024


Typ: Catalyst 9200 – 40ks
Catalyst 9500 – 4ks

Výrobce: CISCO
Dodavatel: TETA s.r.o.

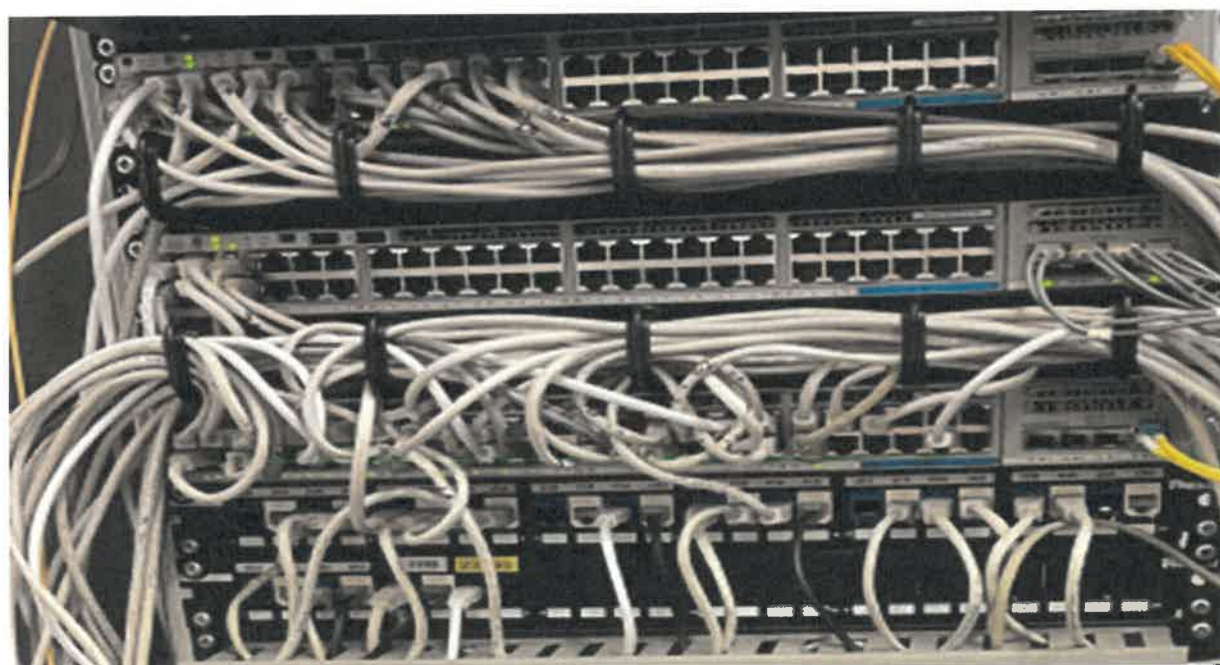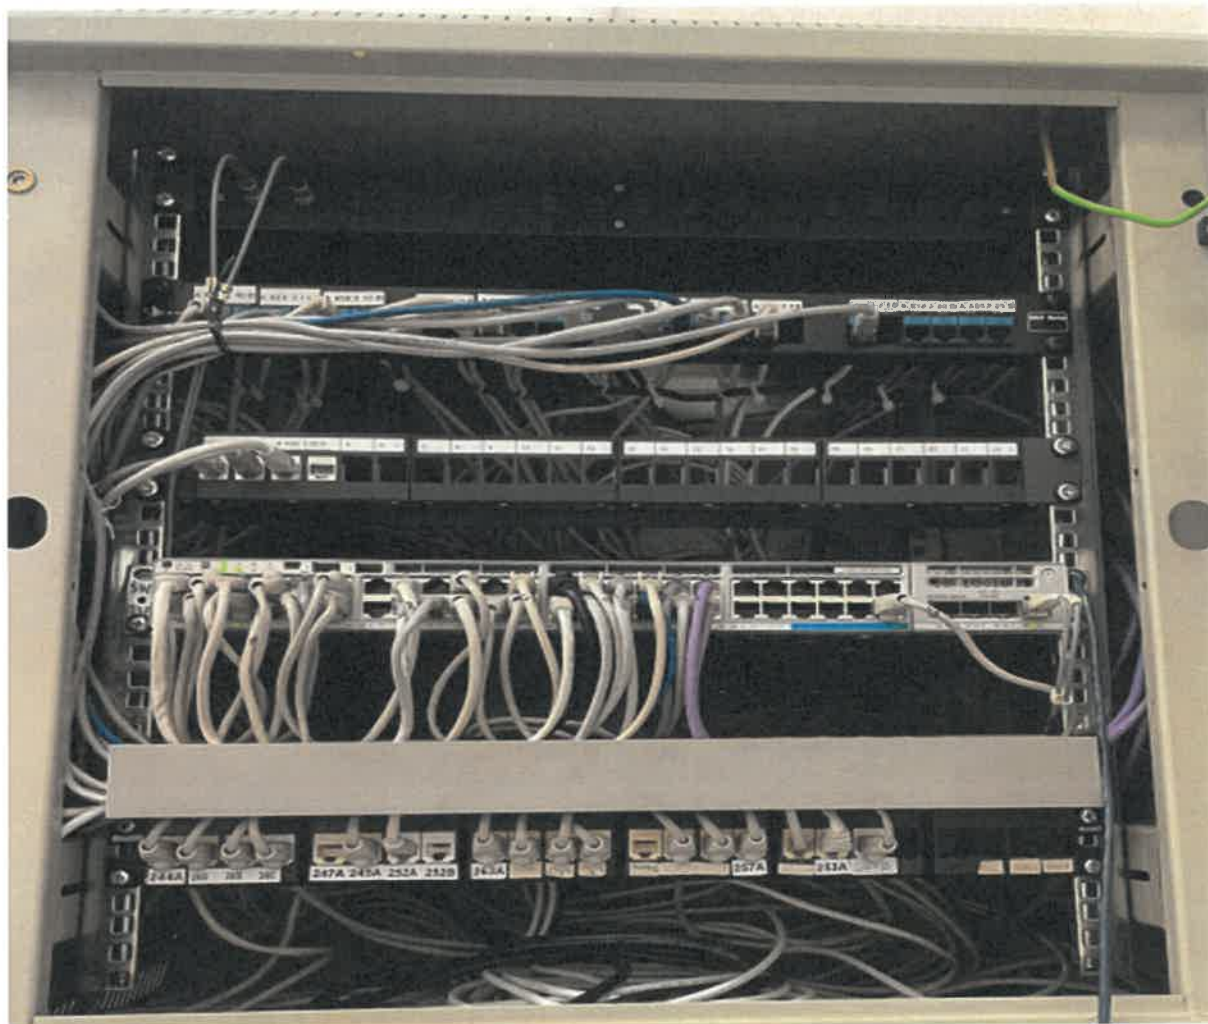

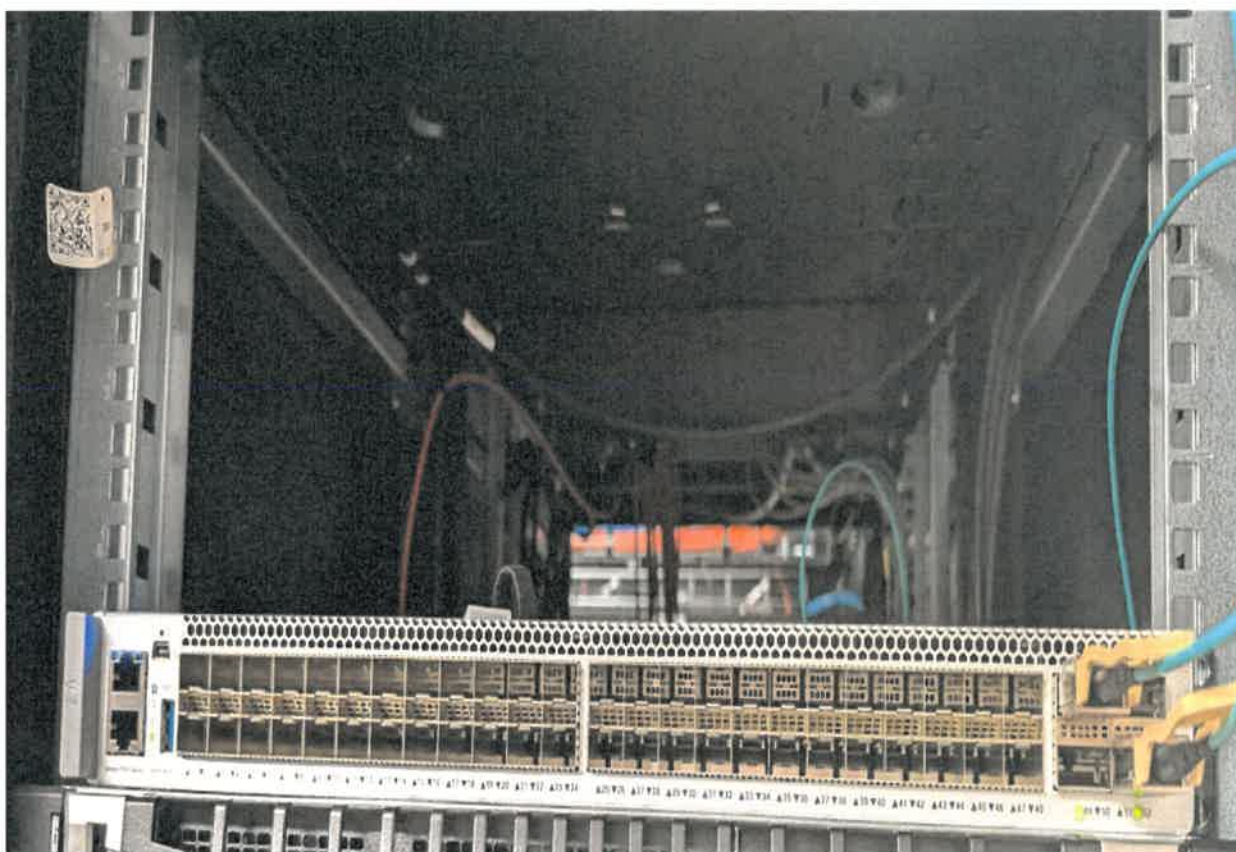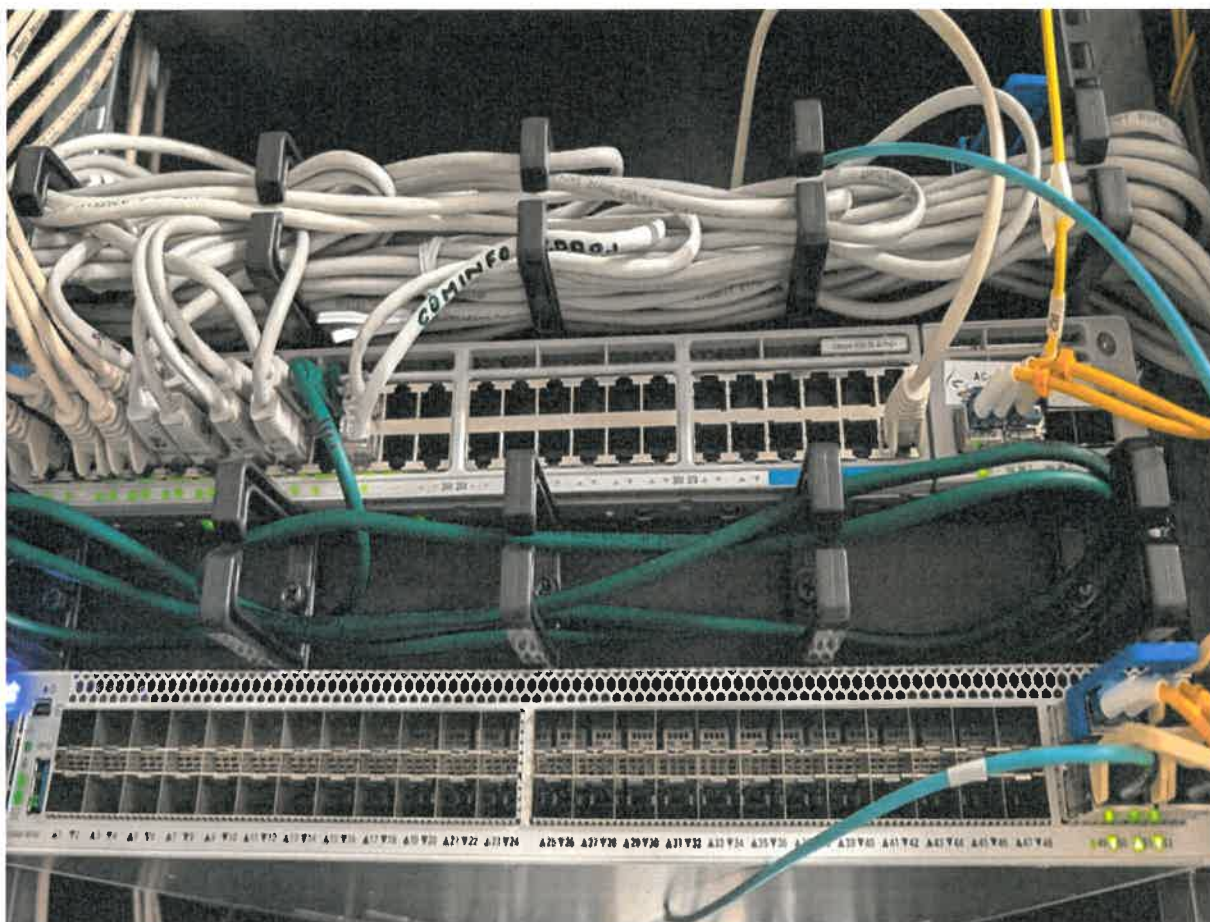

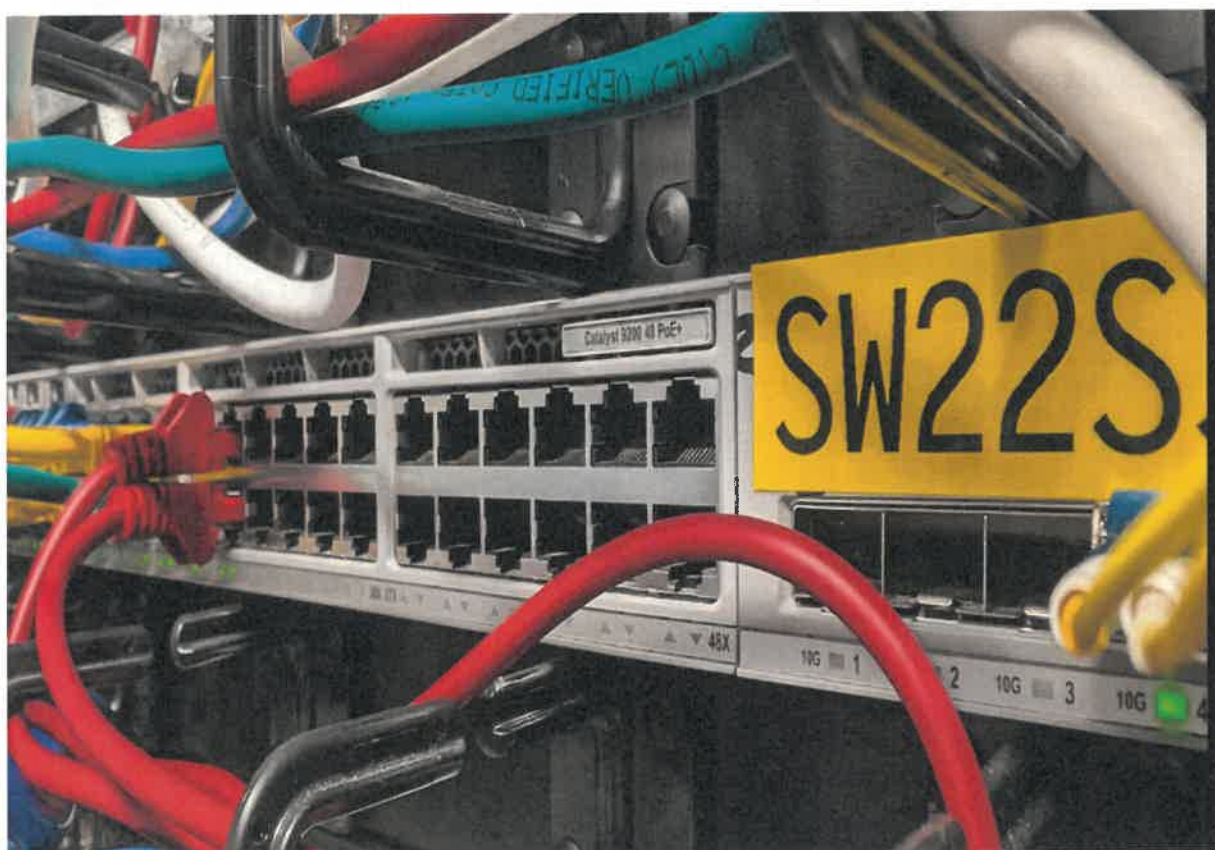

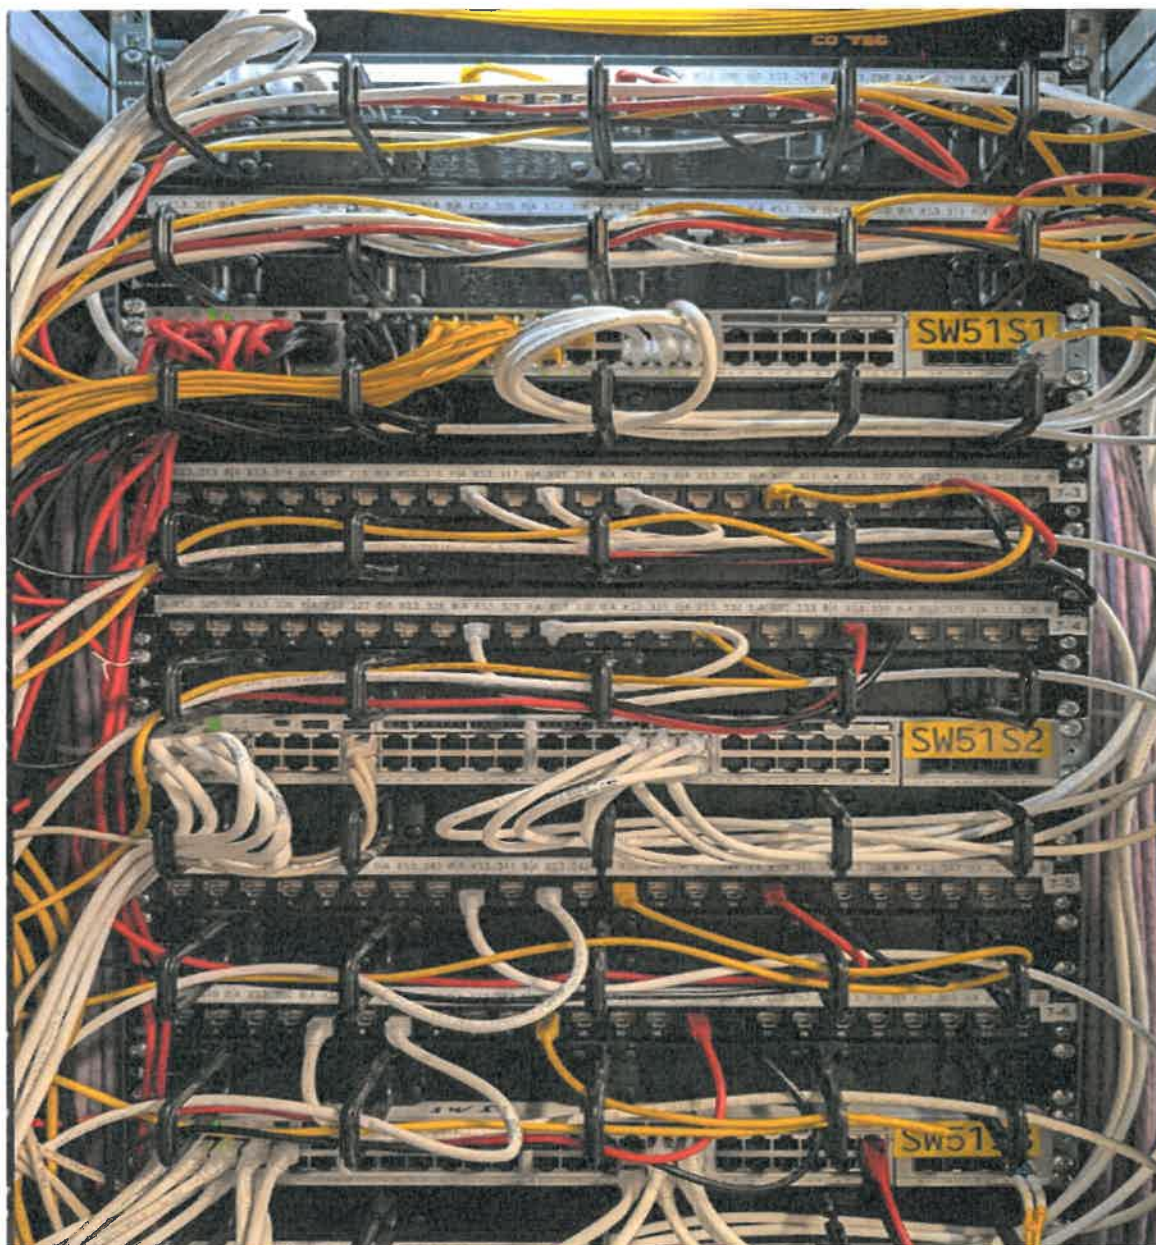

Nákup serverů pro doplnění infrastruktury KZ, a.s.


Realizace: 12/2024



Datum převzetí: 13. 12. 2024, 20. 12. 2024



Typ: Server ASUS RS720A – 10ks

Výrobce: ASUS

Dodavatel: Abacus Electric, s.r.o.

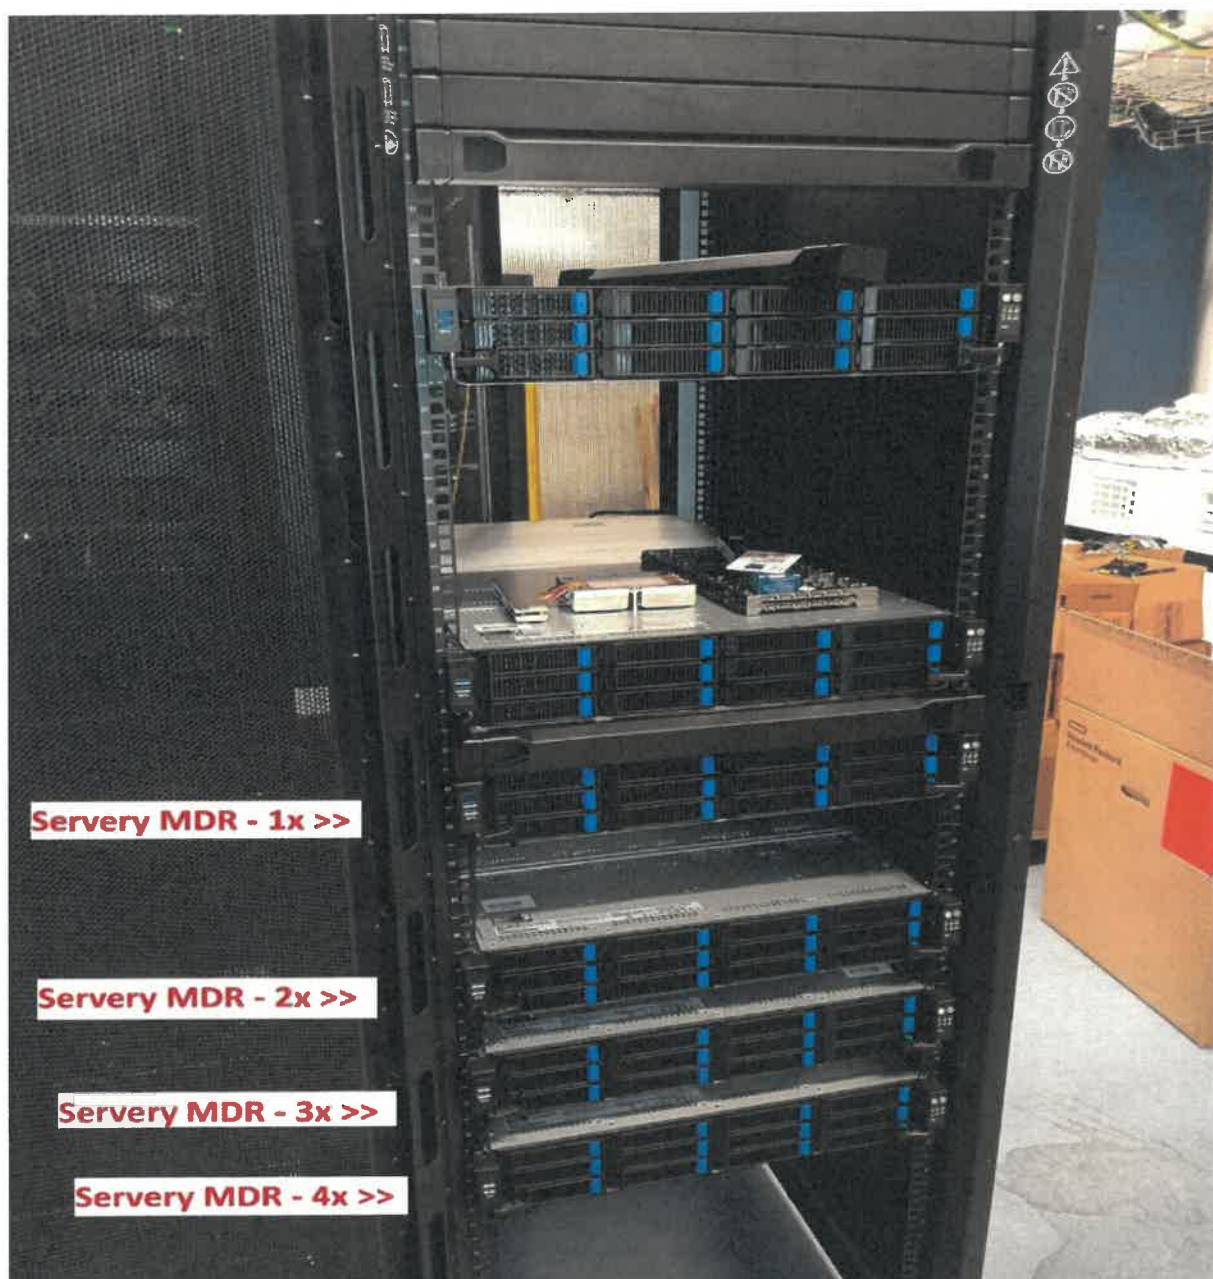

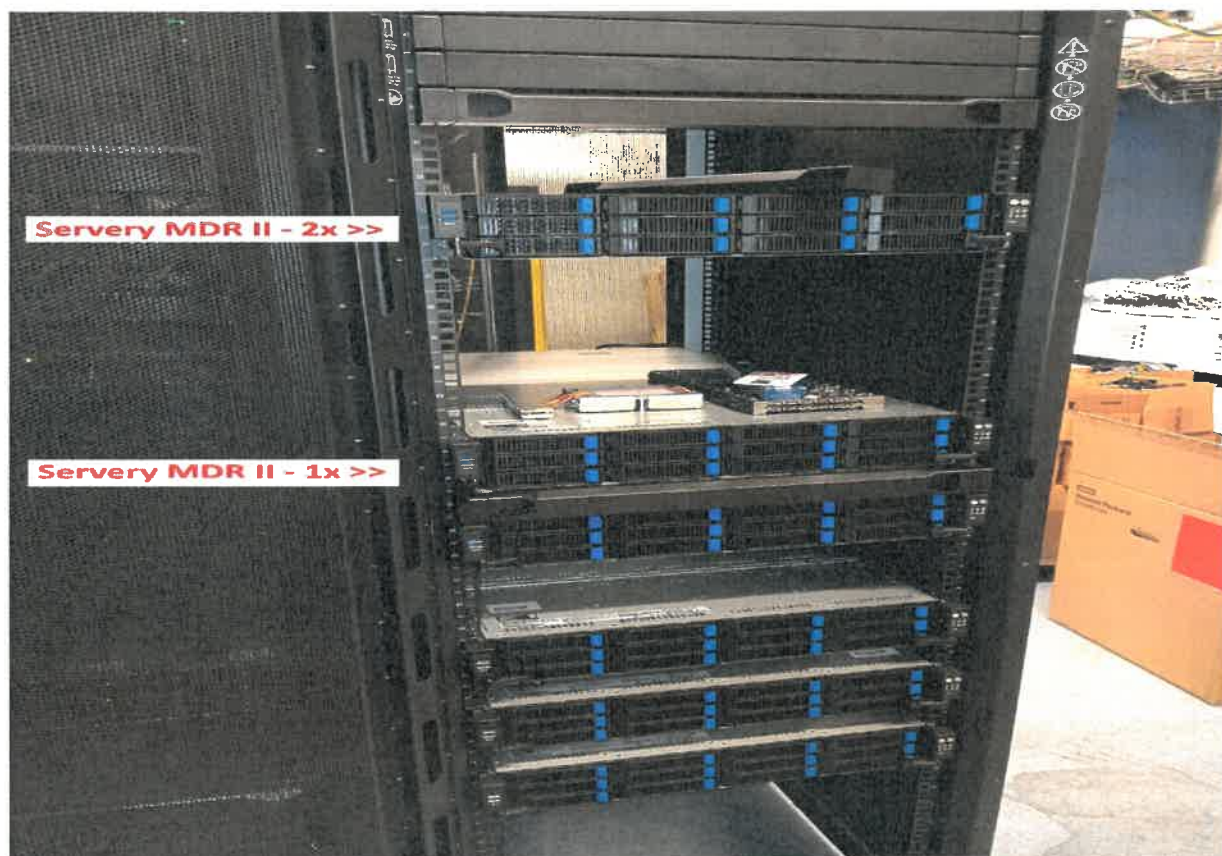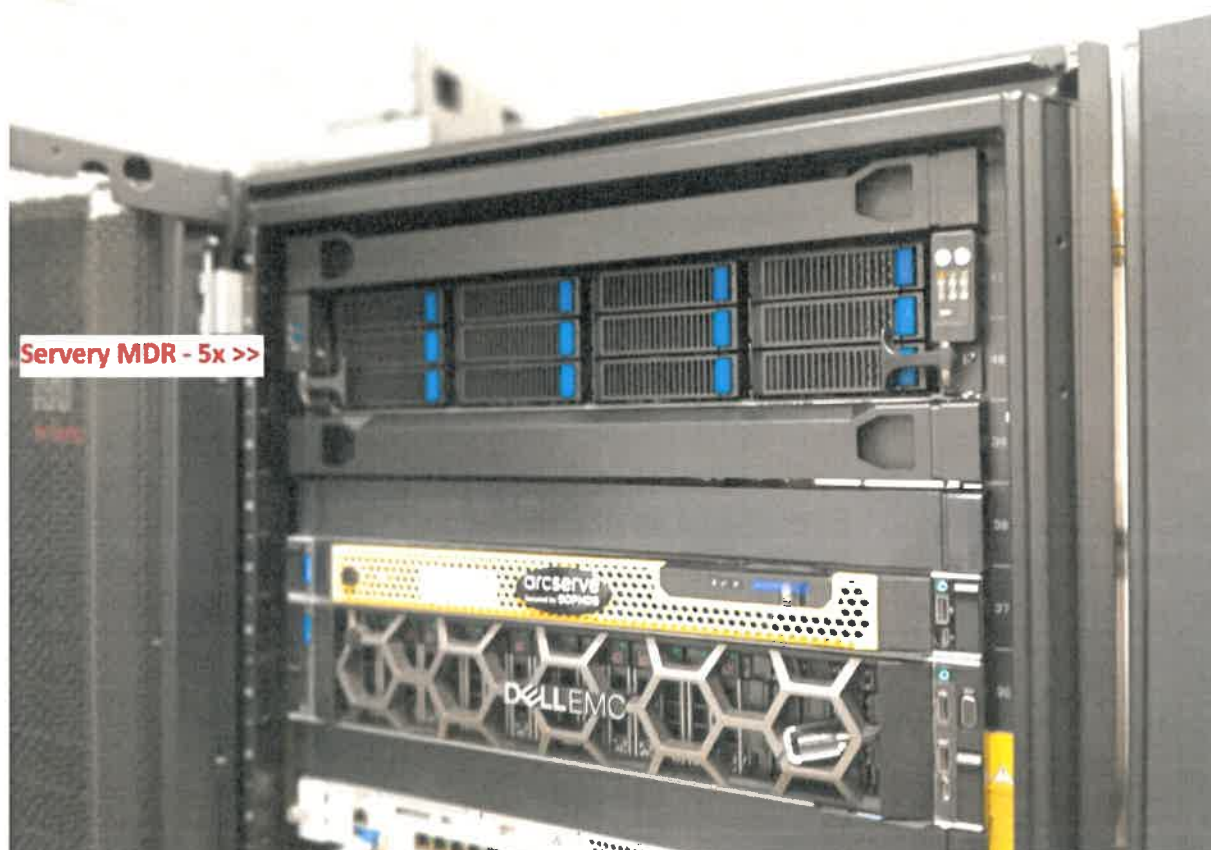

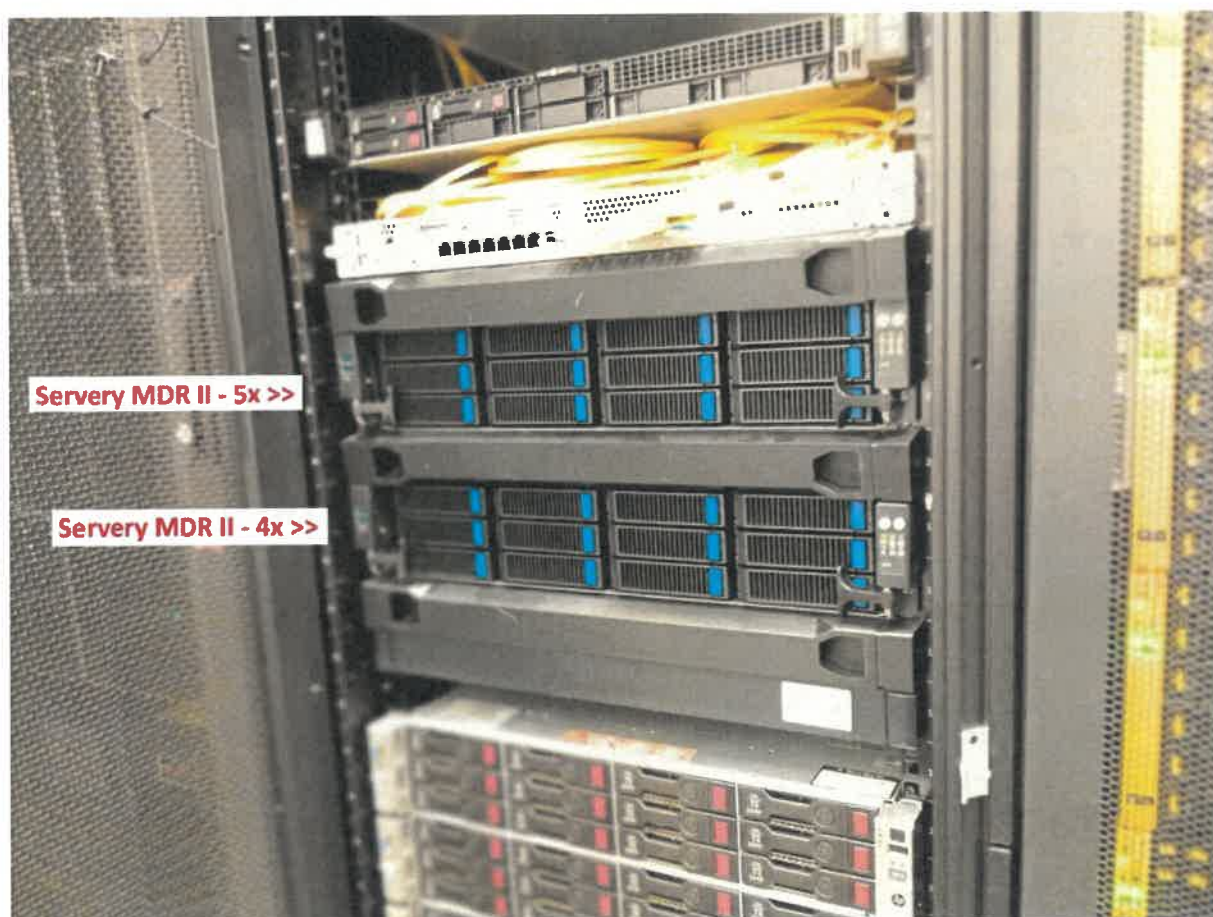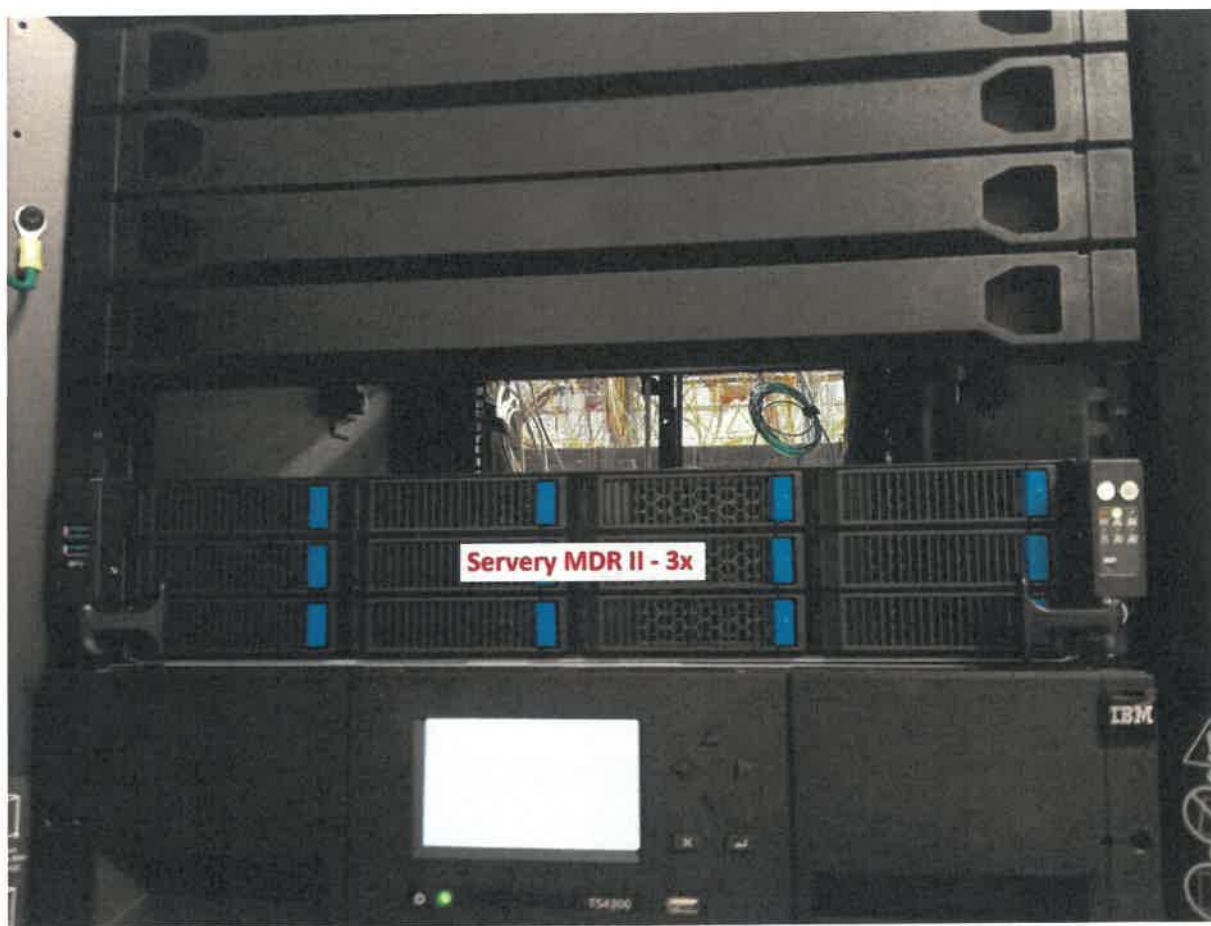

Rozšíření datové infrastruktury o aktivní prvky - routery



Realizace: 12/2024

Datum převzetí: 12. 12. 2024

Typ: Catalyst 9500 – 2ks

Výrobce: CISCO

Dodavatel: TECHNISERV, spol. s r.o.

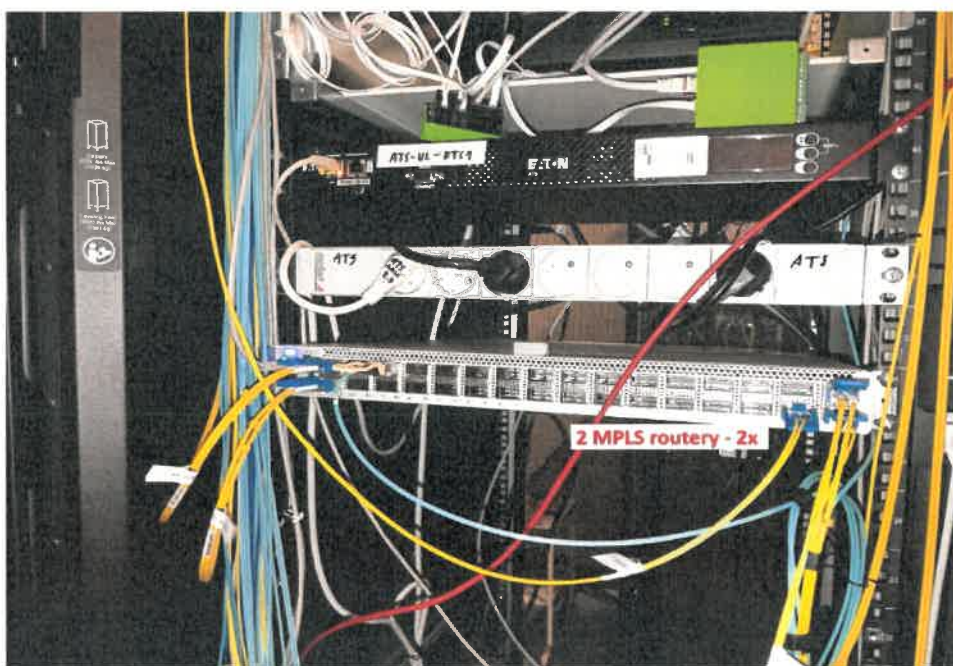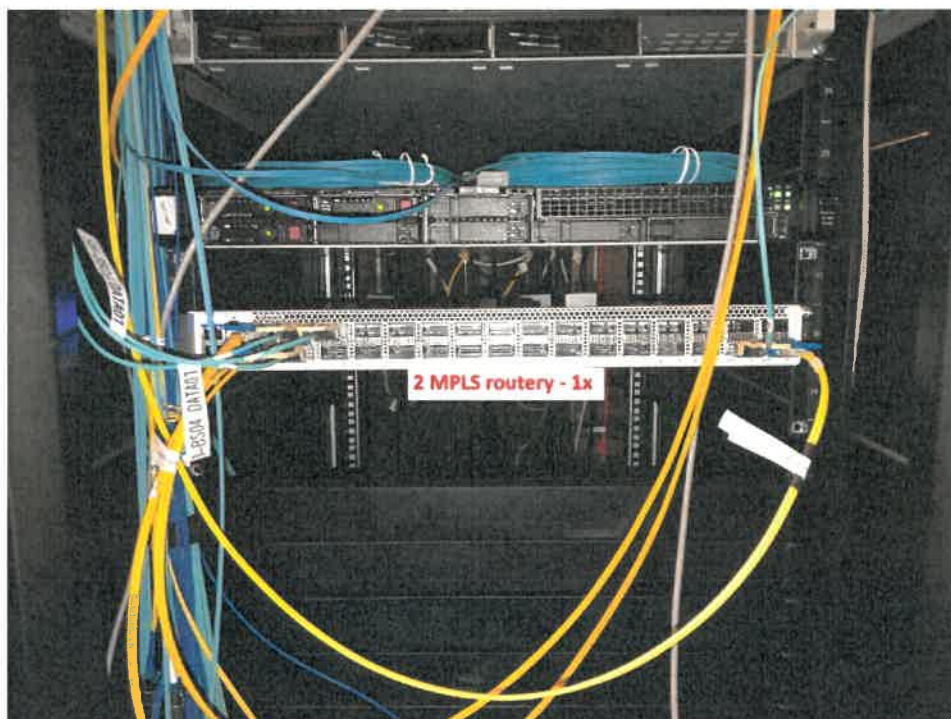

Dodání 3 kusů nodů pro ochranu dat společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Realizace: 12/2024


Datum převzetí: 13. 12. 2024

Typ: BACKUP NOD – 3ks

Výrobce: HPE

Dodavatel: Rexionix s.r.o.



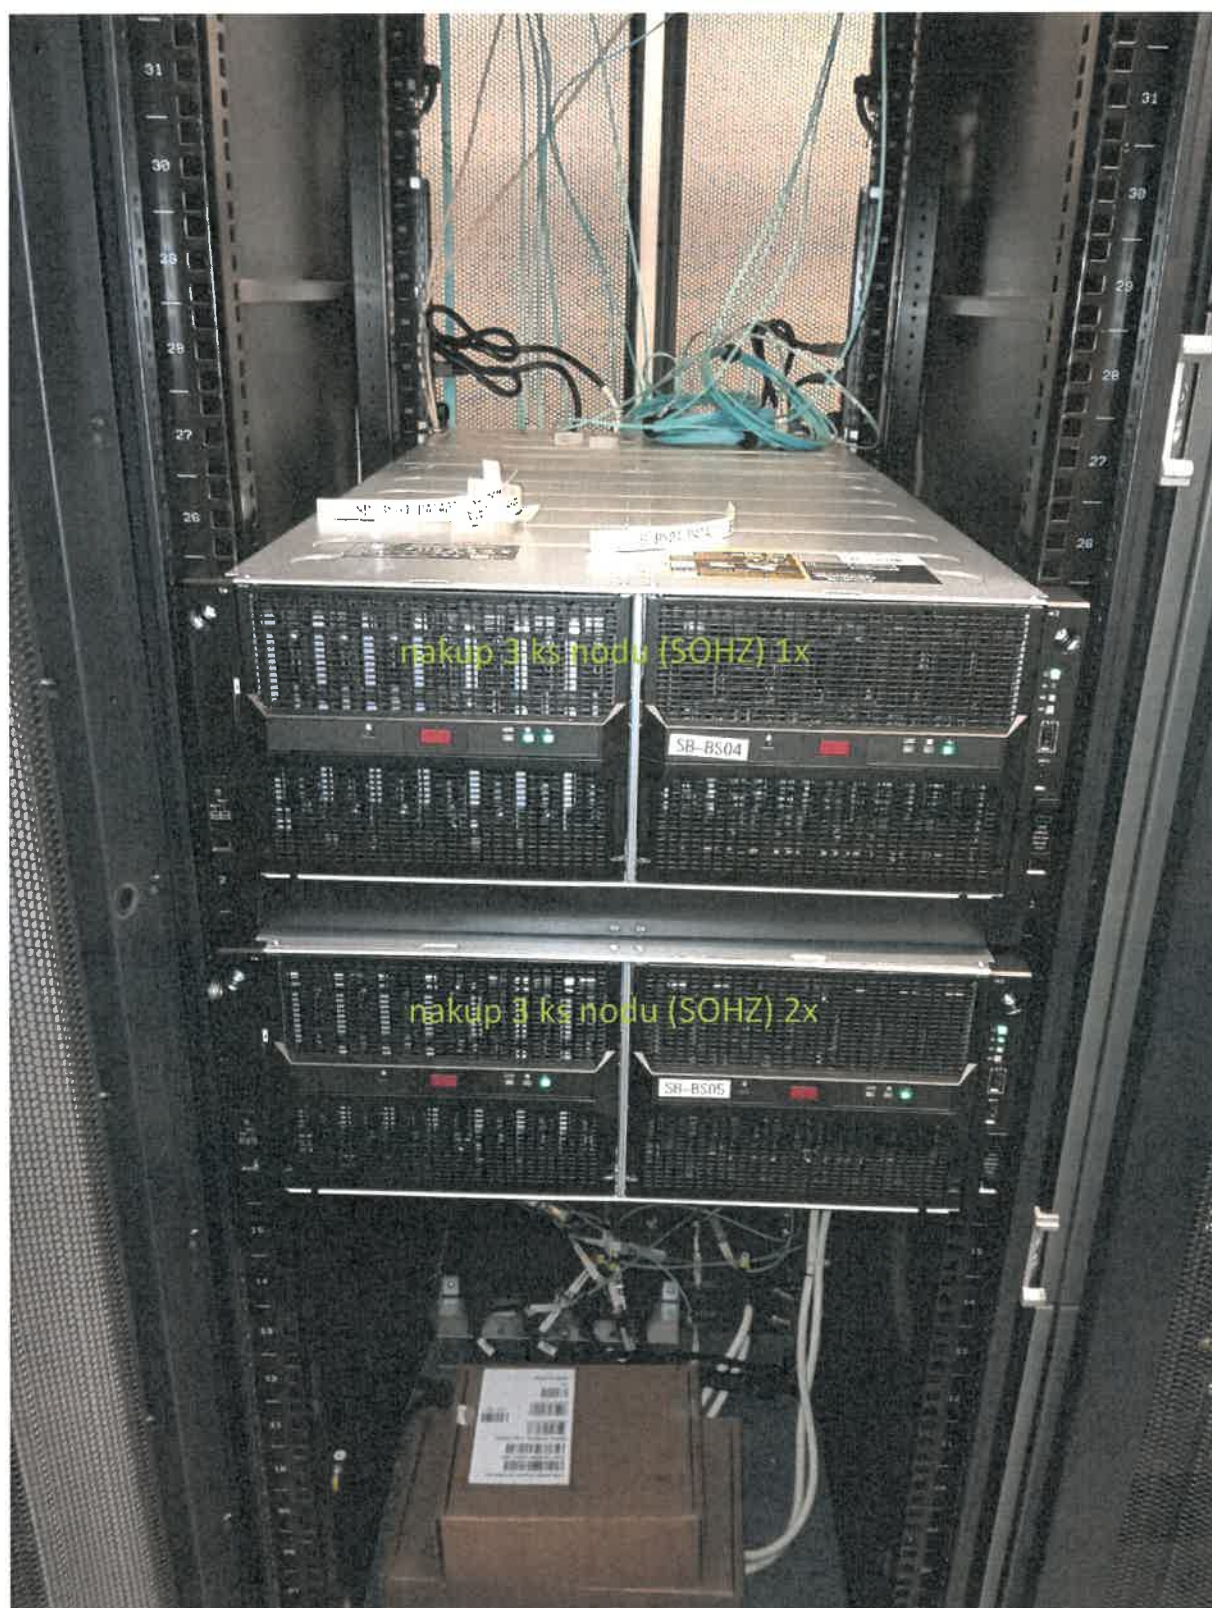

Upgrade Medix

Realizace: 12/2024

Datum převzetí: 18. 12. 2024

Typ: FONS MEDIX – 1ks

Výrobce: Stapro s.r.o.
Dodavatel: Stapro s.r.o.

The screenshot displays the FONS Medix software interface, which is used for managing medical equipment. The main window shows a list of devices, including various types of monitors and adapters. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains the application name 'FONS Medix' and various icons for navigation and settings.
- Left Panel:** A sidebar with a tree view showing the hierarchy of the device list.
- Main Table:** A large table with columns for 'Id', 'Kód', 'Název', 'EAN', 'Cena', and 'Množství'. It lists various medical devices such as 'Adaptér', 'Monitor', and 'Kamera'.
- Right Panel:** A detailed view of a selected device, showing its specifications and a list of related items.

The table below represents the data shown in the main table of the screenshot:

Id	Kód	Název	EAN	Cena	Množství
241	N	Adaptér	51000...	168...	203...
6...	N	Adaptér	51000...	160...	194...
246	N	Adaptér	51000...	160...	194...
...	...	...	...	...	...

Rozšíření kapacity diskových polí 3PAR fáze II


Realizace: 12/2024

Datum převzetí: 13. 12. 2024

Typ: Diskové pole 3PAR – 8ks

Výrobce: HPE

Dodavatel: Rexionix s.r.o.

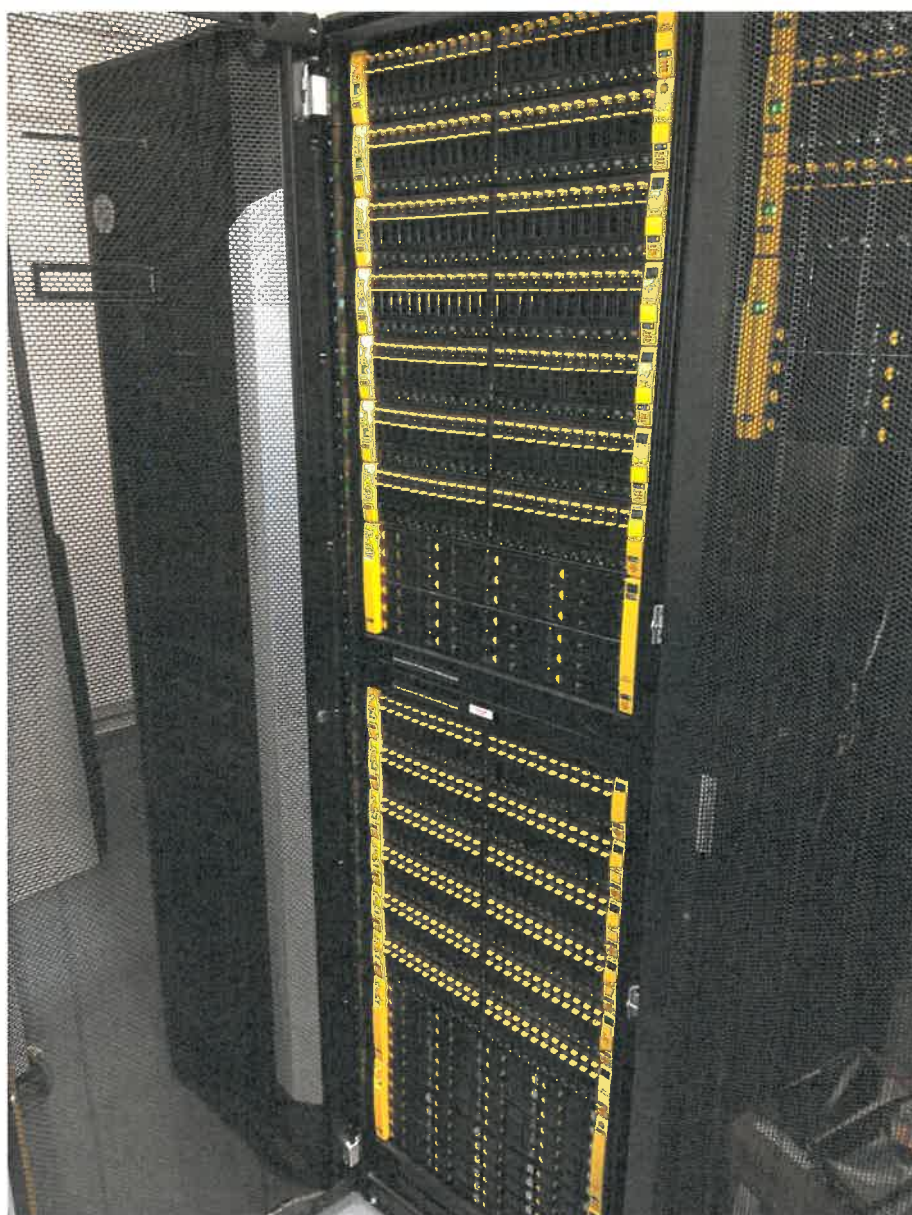



Dodání dvou páskových knihoven pro zálohování a archivaci dat 2024



Realizace: 11/2024

Datum převzetí: 28. 11. 2024

Typ: Pásková knihovna 3555-L3A – 2ks

Výrobce: IBM

Dodavatel: DATASYS s.r.o.

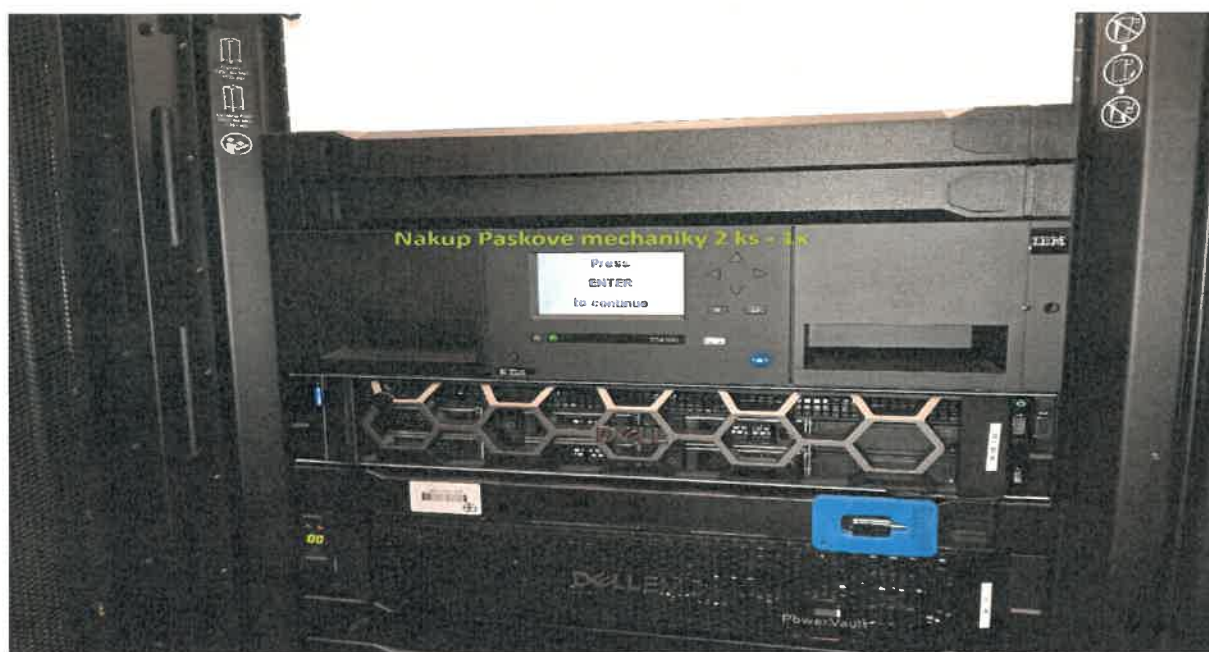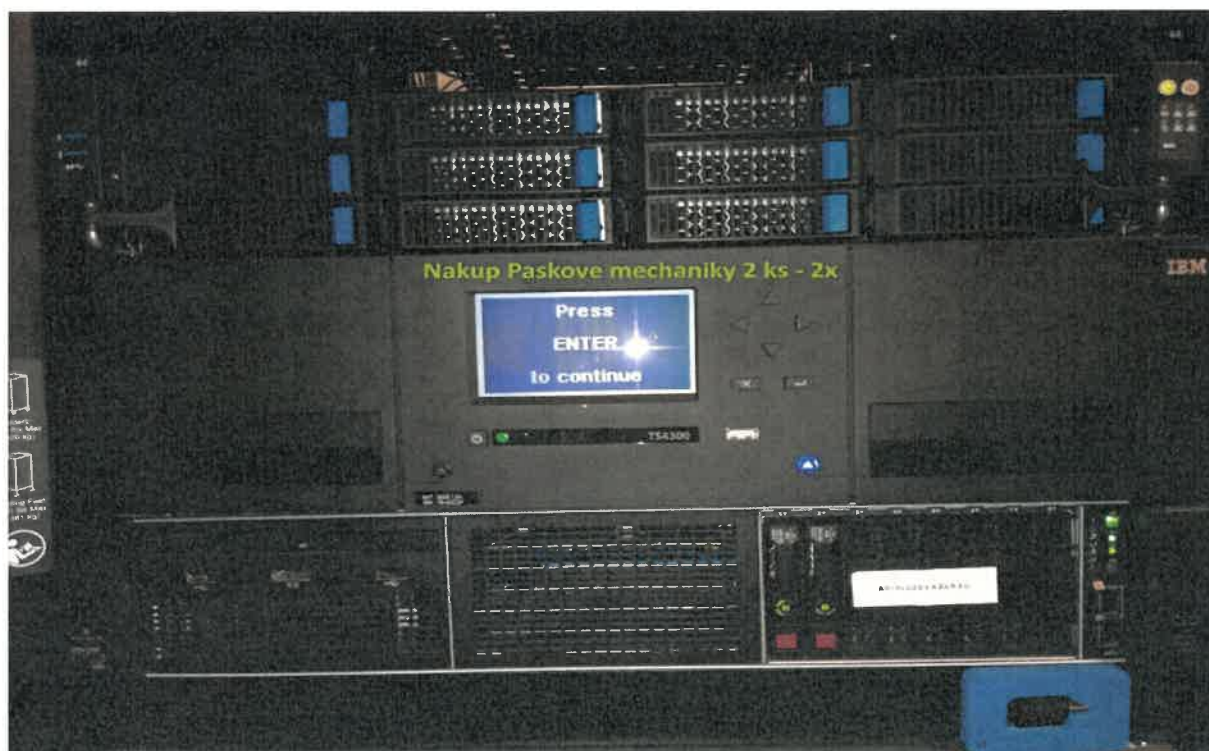

**Zvýšení dostupnosti služeb propagovaných za segmentačním Firewalllem
pořízením druhého prvku do clusteru pro Krajskou zdravotní, a.s.**


Realizace: 12/2024

Datum převzetí: 18. 12. 2024

Typ: Cisco Secure Firewall – 1ks

Výrobce: Cisco

Dodavatel: Teta s.r.o.

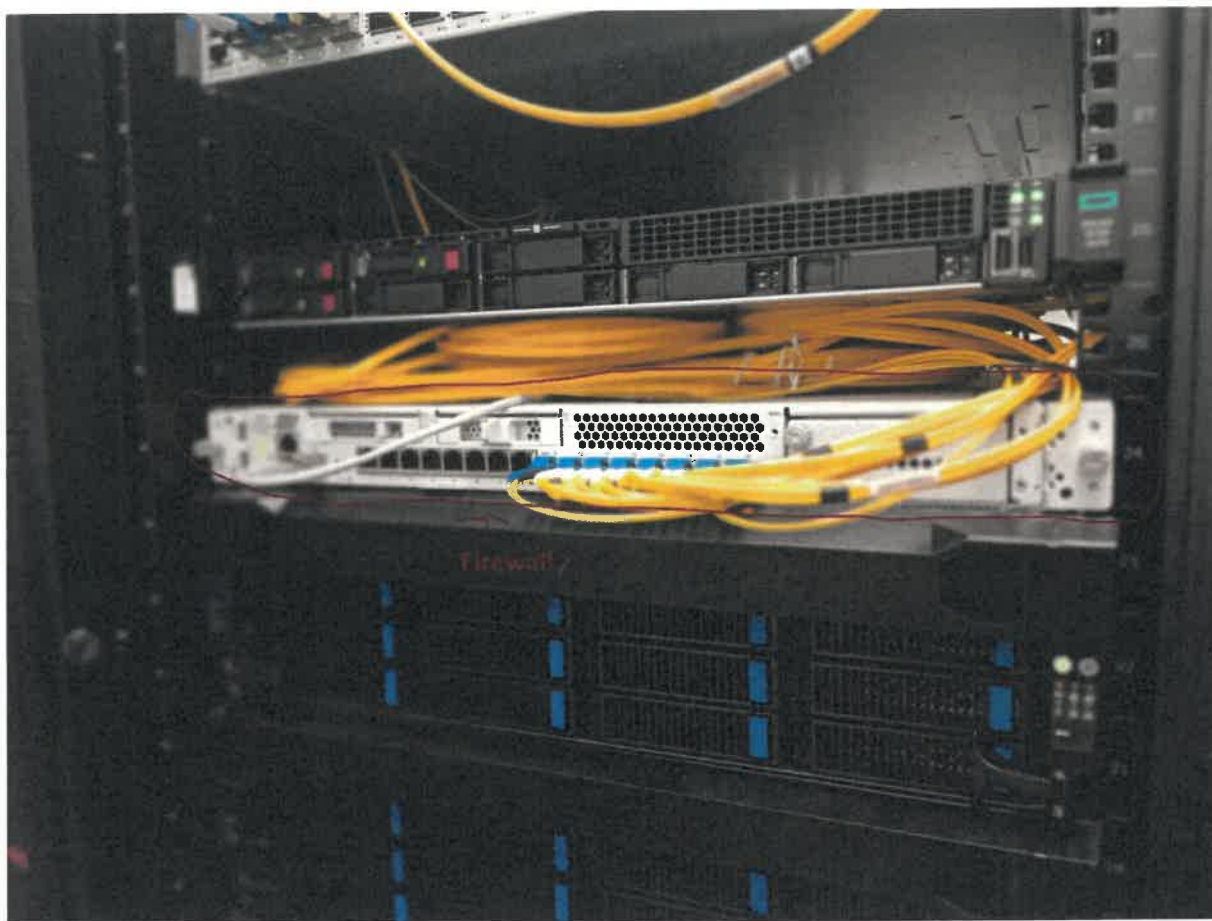

Licence Cisco (SAN switch)

Realizace: 03/2024

Datum převzetí: 05. 03. 2024

Výrobce: Cisco

Dodavatel: Networksys a.s.

Licenses								
Features Files Install Usage Port Licensing								
Feature	Installed Type	Installed Count	Status	ExpiryDate	GracePeriod	Missing	Warnings/Errors	DefaultLicenses
FM_SERVER_PKG	Permanent License		Unused	never		0		0
ENTERPRISE_PKG	Permanent License		In Use	never		0		0
SAN_ANALYTICS_PKG	Eval License		Unused		119 days 23 hours 6 mins 9 seconds	0	Grace Period: 119 days 23 hours 6 mins 9 seconds	0
PORT_ACTIV_9396T_PKG	Counted Permanent License	96	In Use	never		0		48

4 row(s)

Refresh Help Close

ul-do-san02 - Licenses								
Features Files Install Usage Port Licensing								
Feature	Installed Type	Installed Count	Status	ExpiryDate	GracePeriod	Missing	Warnings/Errors	DefaultLicenses
FM_SERVER_PKG	Permanent License		Unused	never		0		0
ENTERPRISE_PKG	Permanent License		In Use	never		0		0
SAN_ANALYTICS_PKG	Eval License		Unused			0		0
PORT_ACTIV_9396T_PKG	Counted Permanent License	96	In Use	never		0		48

Data retrieved at 18:49:09

Refresh Help Close

Odůvodnění hospodárnosti:

Realizace výše uvedené investiční akce byly zadány v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

Celá investice zahrnuje soubor veřejných zakázek pro nákup komponent sloužících k zabezpečení chodu MDR. Tento soubor se skládá z nákupu kapacity pro ukládání dat vždy minimálně ve dvou lokalitách pro zabezpečení nepřerušitelného provozu informačních systémů. Součástí je i upgrade systému centrální sterilizace na novou verzi s jednotnou databází, jeho implementace. Jako podpůrná aktiva práce s daty je řešena i výpočetní kapacita nákupem serverů, switchů a routerů pro distribuci. Jako zajištění bezpečnosti došlo k doplnění firewallu a zajištění bezpečnosti publikovaných služeb. Prostředí se využije i pro zajištění podpory MDR v oblasti provozu nemocniční lékárny a distribuce jejích služeb na jednotlivá oddělení včetně implementace evidence lokální lékárny a lokálního flow zdravotnického materiálu.

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

b) Seznam částečně realizovaných prioritních investičních akcí

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2023-2024 (z dotace)	STAV REALIZACE
7	Nemocnice Děčín	Pavilon péče o matku a dítě	NOVÁ	150 000 000,00	158 411 225,36	částečná realizace
11	Nemocnice Teplice	Rozšíření Urgentního příjmu	ROZVOJOVÁ	100 000 000,00	11 017 466,62	částečná realizace
14	Nemocnice Litoměřice	Rekonstrukce porodnice	ROZVOJOVÁ	81 000 000,00	3 250 238,12	částečná realizace
15	Nemocnice Most	Trafostanice	NOVÁ	85 000 000,00	1 000 000,00	částečná realizace

7. „Urgentní příjem a op. sály DC“ – II. Etapa – Pavilon péče o matku a dítě, investiční náklady cca 534 mil. Kč


Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu péče o matku a dítě, který je součástí investiční akce „Urgentní příjem a op. sály DC“ jako druhá etapa, která je nezbytná pro naplnění primárního záměru a zajištění komplexní provázanosti zdravotnických provozů pro poskytování zdravotních služeb.

Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu Péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska (II. etapa):

- 1. NP – Hemodialýza (14 křesel, 2 lůžka), nefrologická ambulance, technické zázemí (úpravná vody pro dialýzu, strojovna vzduchotechniky, rozvodna elektro)
- 2. NP – Gynekologie – lůžkové oddělení 16 lůžek, pooperační pokoj 4 lůžka, zákrokový sál
- 3. NP – Porodnice 3 porodní pokoje, 4 lůžka – 1. doba porodní, 1 operační sál – porodní
- 4. NP – Porodnice – lůžkové oddělení – 17 lůžek, 6x dvoulůžkový pokoj, 4x jednolůžkový pokoj, 1x apartmá

Vizualizace:



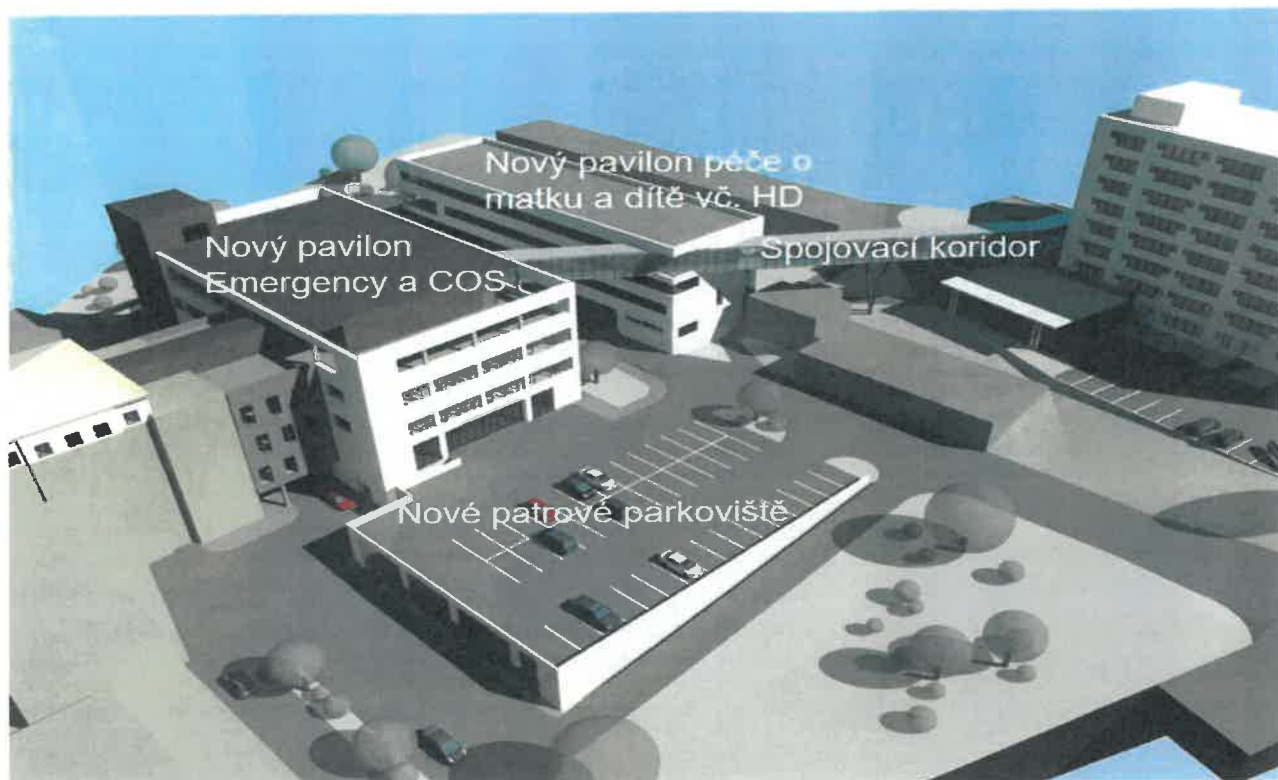

Fotodokumentace za rok 2024:









Přepokládané náklady

Náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí dle smlouvy o dílo uzavřené na základě realizované veřejné zakázky vč. smluvních dodatků 502 512 508,47 Kč, uvedená hodnota nezahrnuje vybavení zdravotnickou technikou a náklady na zabezpečení TDS a AD.

Popis prováděných prací za rok 2024:

- Strojní demolice objektu, zemní práce pro odpojení objektu a zřízení nové teplovodní přípojky, demolice pův. komunikací a VO
- Těžba a hloubení jámy, příprava základové spáry – zahájení pilotáže
- Svahování u objektu EMERY, přeložky obnaženého vedení vedle bouraného schodiště
- Odvoz sutí a zeminy, zakládání jeřábu, zapažení jámy a svahu
- Sanace zvodnělé pláně a podkladní vrstvy pro pilotáž – dokončena pilotáž, provedly se mikropiloty -
- Podkladní betony, provádění kanalizace, armování bednění a betonáže prvků a desky 2.PP, dokončena hydroizolace a ochranné betony výtahové šachty 2.PP, izolace spodní stavby a monolitické konstrukce
- Dokončeno 2.PP vč. stropů
- Bednění a armování pro 1.PP
- Pokračování v provádění kanalizace, pokračují zásypy 2.PP
- Izolace spodní stavby a monolitické konstrukce, izolace vodorovných betonů 1.PP
- Montáž stropního bednění 1.pp – 2.etapa
- Montáž bednění stěn 1.pp + betonáž
- Montáž výztuže stropu 1.pp – 1.etapa
- Asfaltová penetrace + svislá hydroizolace stěn 1.pp
- Montáž tepelné izolace stěn 1.pp
- Oprava trhlin v objektu S

Obecně:

Proběhla výstavba monolitické konstrukce. Postupné bednění, betonáže a související činnosti. Pokračují průběžně zásypy kolem objektů, provádění základů na druhý jeřáb. Návoz cihel pro celý objekt.

Harmonogram (II. etapa):

Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.
Cena stavebních prací:	477 572 236,- Kč vč. DPH
Smlouva podepsána dne:	7.11.2023
Předání staveniště:	8. 1. 2024
Předpoklad dokončení:	29. 10. 2025
Dodatek č.1	24 940 272,47 Kč

Investiční náklady (2024) financované z investiční dotace SOHZ: **158 411 225,36 Kč vč. DPH**

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to včetně požadavků pacientů.

11. Rozšíření Urgentního příjmu teplické nemocnice, cca 100 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je rozšíření Urgentního příjmu teplické nemocnice, a to ve vazbě na legislativní požadavky a provozní potřeby, vyplývající z dosavadního fungování oddělení urgentního příjmu. V nedávné době proběhla rekonstrukce prostor pro zřízení urgentního příjmu v teplické nemocnici, která však byla s ohledem na omezené prostorové a investiční možnosti zaměřena zejména na ambulantní část bez dostatečného zázemí pro urgentní medicínu. V návaznosti na stanovené legislativní požadavky a koncepční změnu v rámci urgentní medicíny v teplické nemocnici pak vyvstala nutnost rozšíření současných prostor a vybudování odpovídajícího zázemí pro poskytování urgentní péče, zejména pak rozšíření expektačních lůžek, zřízení prostor pro intenzivní a resuscitační péči, odpovídající prostory pro operační výkony na UP a další provozní zázemí.

<u>Dodavatel stavby:</u>	Metrostav DIZ s.r.o.
Cena dle VZ:	79 683 318,- Kč vč. DPH
Předpoklad dokončení	30.7.2025
Předání staveniště:	30.9.2024

Průběh prací za rok 2024:

Výkop a odvoz zeminy, úprava pláň, čištění stávajících sítí.
 Stávající budova: Bourání příček, obkladů, odvoz suti.
 Návoz a vázání výztuže základových pasů

Vizualizace:



Fotodokumentace z roku 2024:





Investiční náklady (2024) financované z investiční dotace SOHZ: **11 017 466,62 Kč vč. DPH**

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č.4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je modernizace současných prostor oddělení urgentního příjmu, díky kterým bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce je/bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

14. Modernizace Porodnice, cca 90 mil. Kč – NEMLT

Předmětem investičního záměru je modernizace porodnice litoměřické nemocnice, a to v návaznosti na současný nevyhovující dispozice, technický stav a narůstající požadavky klientely.

Oblast porodnictví je v současné době jednou z oblastí zdravotnictví, které je věnována významná pozornost, a to nejen s ohledem na narůstající požadavky na komfort zázemí, ale rovněž s ohledem na udržitelnost ve vazbě na demografické trendy a doporučené standardy. Součástí litoměřické nemocnice, jako součásti páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje,

provozující urgentní příjem II. typu je zcela nezbytně rovněž gynekologicko porodnické oddělení a existuje tedy reálný předpoklad zachování, popř. rozšiřování současného rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. Současné prostory jsou nedostatečné, s nevyhovujícími dispozicemi a neodpovídající současným požadavkům moderní medicíny. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření a úpravě stávajících prostor porodnice, úpravě dispozičního řešení tak, aby vyhovovalo legislativním požadavkům, zejména pak hygienickým normám a dále současným požadavkům v oblasti porodnictví.

<u>Dodavatel stavby:</u>	METALL QUATRO spol. s r.o.
Cena dle VZ:	63 376 477,8 Kč vč. DPH
Předání staveniště:	15. 8. 2024
Předpoklad dokončení:	6. 6. 2025
Předpoklad zahájení provozu:	09/2025

Přehled prací za rok 2024:

Bourací práce. Montáž rozvodů elektro (EPS) a MaR. Montáž VZT. Bourání stoupaček. Montáž SDK přiček. Úprava rozvodu topení. Rozebírání podhledů v 1.PP. Likvidace azbestu ve strojovně.

Vizualizace:



D.1.4.1.3.5

Vizualizace - Porodní apartmán



D.1.4.I.3.4

Vizualizace - Sesterna porodnice



D.1.4.I.3.3

Vizualizace - Čekárna

Fotodokumentace za rok 2024:



Investiční náklady (2024) financované z investiční dotace SOHZ: **3 250 238, Kč vč. DPH**

Odůvodnění částečné realizace:

K prodloužení v realizaci předmětné akce došlo zejm. s ohledem na požadavky na úpravy projektové dokumentace, tak aby návrh co nejvíce odpovídal dnešním trendům a dalším požadavkům. Současně bylo nutné provést výběr zpracovatele projektu – generálního projektanta, kde došlo k několika změnám a doplnění projektu. K vyhlášení veřejné zakázky na GDS došlo ke dni 03.04.2024 a k podpisu smlouvy o dílo pak 17.7.2024. V rámci realizaci stavebních prací pak došlo po odkrytí povlakových krytin ke zjištění nutnosti vybourání celé skladby podlah (praskliny a rovinatost), tedy činnost, která nebyla projektem stanovena, což mělo negativní vliv na termín realizace díla.

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic. V příloze č. 4 je vloženo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci realizovaného zadávacího řízení.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace současných prostor oddělení gynekologicko porodnického oddělení, díky kterým bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

15. „Výstavba trafostanice“, investiční náklady cca 85 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je výstavba nového objektu trafostanice v mostecké nemocnici, která je nezbytná s ohledem na stávající hraniční kapacitu zásobování areálu elektrickou energií, a především pak s ohledem na budoucí realizaci objektu „Urgentního příjmu“, jehož projekční příprava v současné době probíhá.

Předpokládané náklady

Probíhá projektová příprava. Předpokládané náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků dle rámcových propočtů činí cca 85 mil. Kč, uvedená hodnota nezahrnuje náklady na zabezpečení TDS a AD.

Projektová dokumentace:


Dodavatel dle VZ:	ALTRON, a.s.
Podepsaná SoD:	4.5.2023
Cena za PD dle VZ:	1 470 755 Kč vč. DPH
Dodatek č.1	249 999, 31 Kč vč. DPH
Revize PD:	7.10.2024

HARMONOGRAM – Nový ODHAD

DPS
IČ
vyhlášení VZ na stavební práce
nabídky
předání staveniště
kolaudace

04/2025
04/2025
06/2025
08/2025
10/2025
12/2026

Podhledy trafostanice TS5:

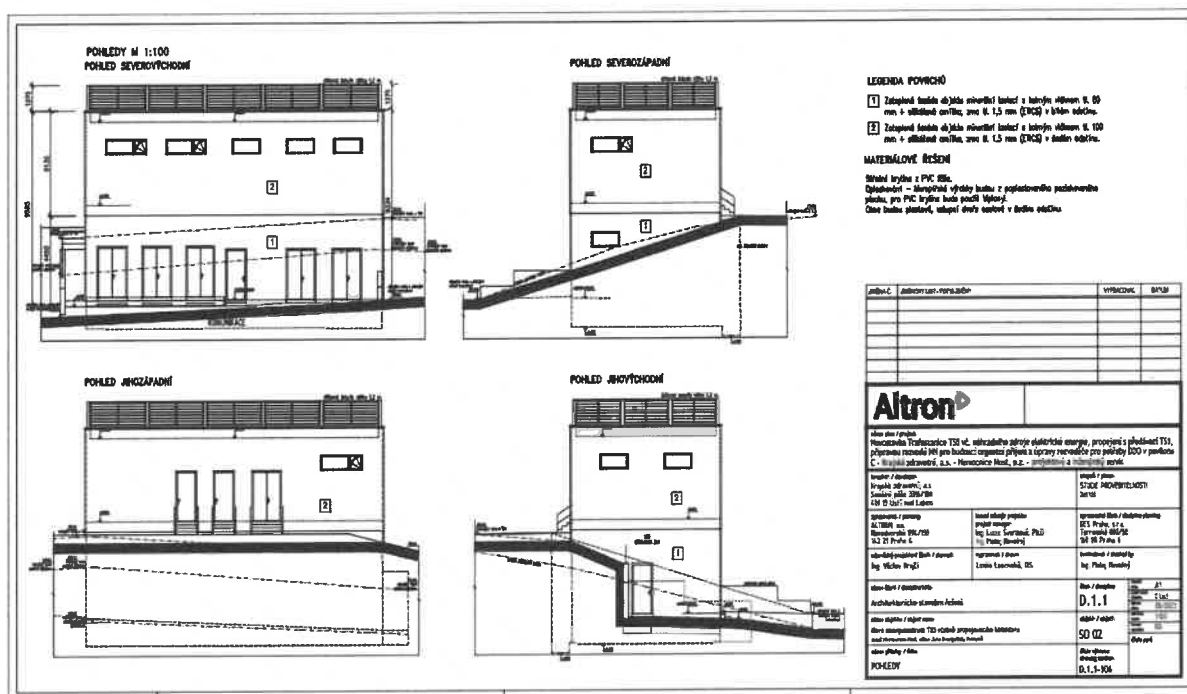

Investiční náklady (2024) financované z investiční dotace SOHZ: **1 000 000, Kč vč. DPH**

Odůvodnění odložení, nerealizace:

V rámci zpracování projektové dokumentace na dostavbu nového pavilonu Urgentního příjmu nejprve došlo ke zjištění nutnosti úprav způsobu napájení tohoto pavilonu, což mělo přímý vliv na přípravu PD na TS5.

Následně došlo k dopracování DPS (dle GP), která byla obdržena dne 20.12.2024. Nicméně následně bylo naměřeno podstatně vyšší okamžitá proudová maxima na TS2 a TS3, dále došlo ke zjištění, že na TS3 jsou napojeny další externí subjekty, kdy toto zatížení již v podstatě nelze přenést NN kabely. Bylo potřeba najít řešení, které se zohlednilo k finalizaci DPS. Postupem času vznikly další požadavky na saturaci budoucích rozvojových potřeb areálu, které nebyla na začátku procesu definovány a další možnosti, jak pojmout celou energetickou koncepci areálu NEMMO komplexněji. Např. změna dožitých TS1, TS3, případně TS diagnostika na rozvodny, ale včetně nových NN rozvaděčů, připravit kapacity pro případ instalace FVE či KJ, posílení zdrojů chladu, navýšení spotřeby kuchyně nebo pokrytí energetických a klimatických nároků datacentra. Vliv na změnu projektu měla i havarijní situace stávající TS1 v květnu 2024. V současné době probíhá detailní analýza způsobu dalšího pokračování v projektové přípravě.

Jedná se o **novou stavební investici**, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem

Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

e) Seznam nerealizovaných prioritních investičních akcí

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2023-2024	STAV REALIZACE
	Prioritní investiční akce					
8	Nemocnice Litoměřice	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	NOVÁ	20 000 000,00	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
9	Nemocnice Most	Projektová dokumentace Urgentní příjem-emergency	NOVÁ	30 000 000,00	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
12	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce Centrální sterilizace I	ROZVOJOVÁ	150 000 000,00	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace
13	Masarykova nemocnice UL	Objekt Kardiocentra – zvýšení bezpečnosti provozu objektu (změna napájení el. energií)	NOVÁ	34 000 000,00	0	nerealizováno/odstoupeno od realizace

8. „Urgentní příjem LT“ – projektová dokumentace, cca 20 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového pavilonu Urgentního příjmu – Emergency v litoměřické nemocnici, kde současné prostory nenaplňují legislativní požadavky a jejich řešení není reálné ve stávajících prostorách.

Nové umístění objektu urgentního příjmu vychází ze studie stavby, která byla zpracována 01/2023 a zároveň potvrzena i v rámci současně zpracovávaného generelu litoměřické nemocnice.

Předpokládané investiční náklady: 12 mil. Kč vč. DPH, předpokládané investiční náklady na vlastní stavební objekt budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace, dle současných předpokladů činí cca 300 mil. Kč.

Projektová dokumentace:

Dodavatel dle VZ: Společnost Best Hospital Designers (SDR společností ARTECH spol. s r.o., Siebert a Talaš a Energy Benefit centre)

Cena za PD dle VZ: 9 365 400 Kč vč. DPH

Termíny po prodloužení dokončení:

- DUR/DSP 18.08.2024 - dokončeno
- IČ 07.07.2025
- DPS 11.08.2025

K 31. 12. 2024 je skutečně vyčerpáno ve výši **0,- Kč**

Předpokládané investiční náklady na PD za rok 2024: **12 000 000, Kč vč. DPH.**

Vizualizace dle studie:





Odůvodnění nerealizace:

V současné době je dokončena projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a probíhá zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a současně probíhá inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení. Důvodem prodlžení v realizaci díla byly změny v projektu, kdy došlo k doplnění endoskopického pracoviště gastroenterologie v rámci ambulantního traktu a dále některým nepředvídatelným technickým okolnostem (např. kolize stavby s kanalizací a nutnost její pasportizace příp. řešení její přeložky, řešení majetko – právních vztahů v rámci dotčených pozemků atp.).

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

9. „Urgentní příjem MO“ – projektová dokumentace, cca 30 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového pavilonu Urgentního příjmu – Emergency v mostecké nemocnici, kde současné prostory nenaplnějí legislativní požadavky a jejich řešení není reálné ve stávajících prostorách. Umístění stávajícího centrálního příjmu je rovněž zcela nevhodné z důvodu konfliktu s páteřními komunikačními trasami spojujícími jednotlivé sekce objektu „Monobloku“.

Nové umístění objektu urgentního příjmu vychází ze zpracovaného generelu rozvoje mostecké nemocnice, kdy tento je navázán na pracoviště poskytující urgentní zdravotní služby.

Předpokládané investiční náklady: 30 000 000,- Kč vč. DPH, předpokládané investiční náklady na vlastní stavební objekt budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace, dle současných předpokladů činí cca 500 mil. Kč.

Zpracovatel PD: PENTA PROJEKT, s.r.o.
Cena PD dle VZ: 21 067 310,00 Kč vč. DPH
Termín podpisu SoD: 25. 8. 2023


Odhad nových termínů:

- 03/2025 – Dokončení a schválení studie
- 08/2025 – DSP
- 12/2025 – IČ
- 12/2025 – DPS


K 31. 12. 2024 je skutečně vyčerpáno ve výši **0,- Kč**

Předpokládané investiční náklady za rok 2024: **27 000 000, Kč vč. DPH.**


Situace navrženého stavu:

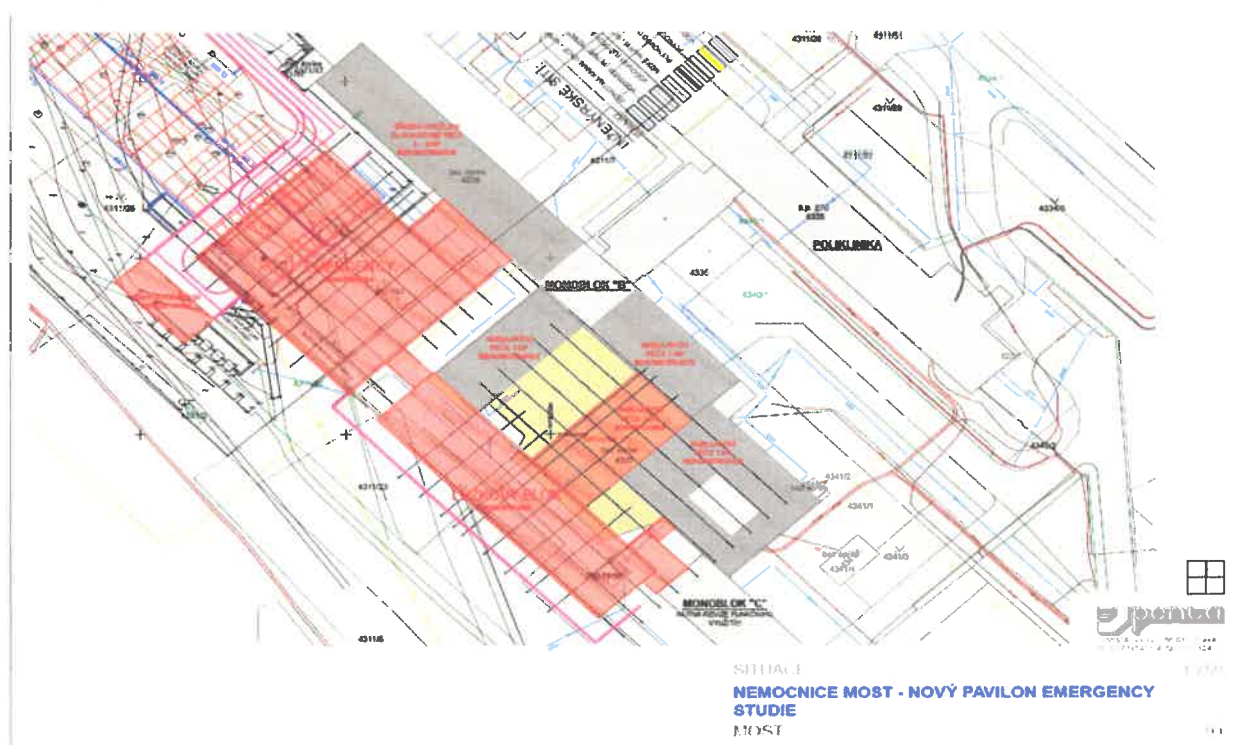


Dispozice navrženého stavu budovy Emergency:

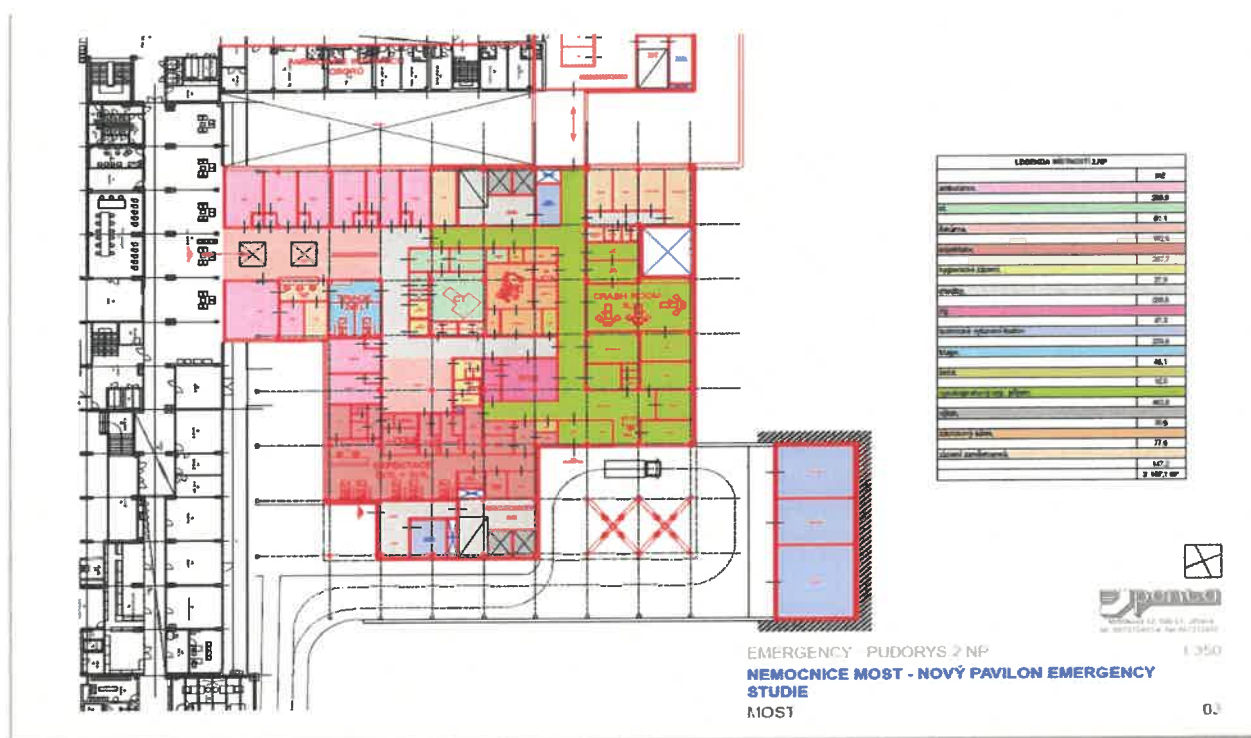

Dispozice navrženého stavu budovy ARO a CJIP:

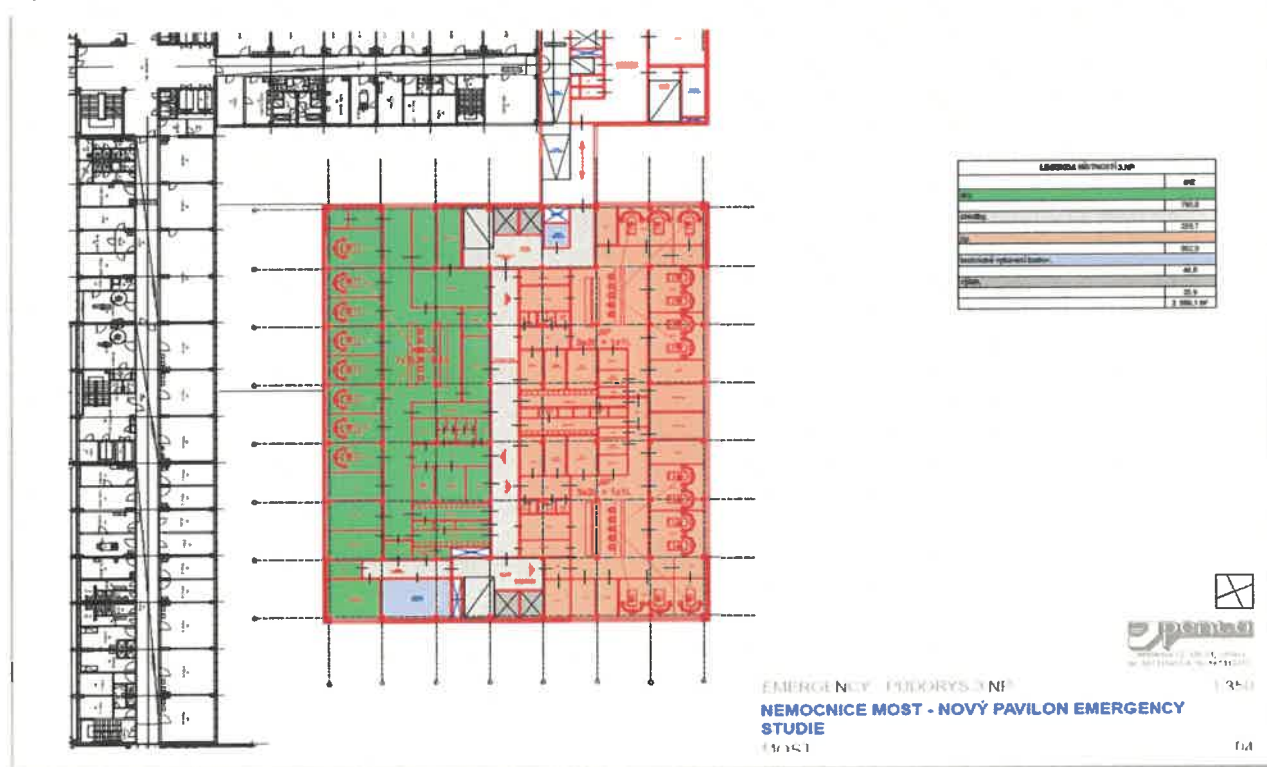

Dispozice navrženého stavu budovy COS:

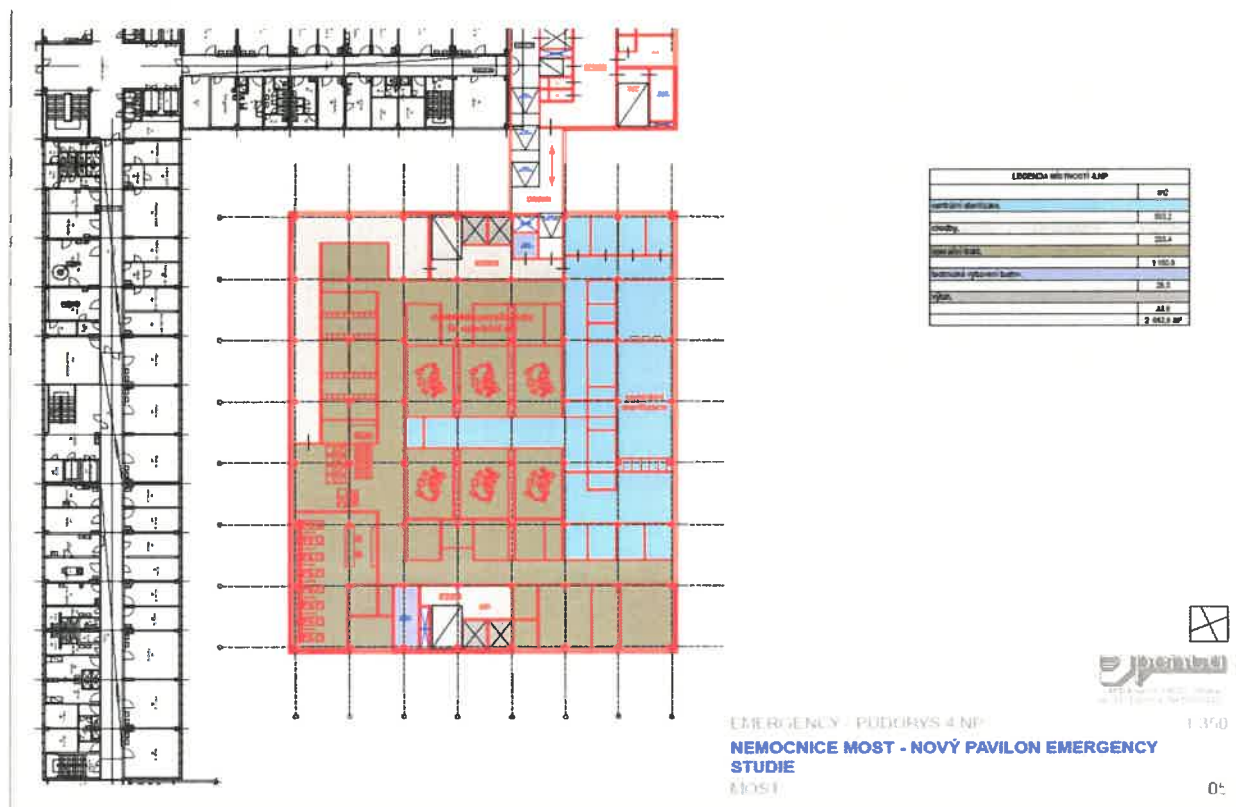

Návrh umístění ÚP z GENERELU NEMMO:



Odůvodnění nerealizace:

V současné době probíhá dokončení studie. Důvodem prodlení v realizaci díla byly změny v projektu, kdy bylo nezbytné v rámci studie posoudit provozně logistické potřeby zejm.

pracoviště operačních sálů, kdy byl na toto objednáán expertní posudek – výstupy z expertního posudky byly následně interně projednány a došlo k zapracování do studie. Dalším vlivem byla nutnost posouzení energetických potřeb a kapacit, kdy se řeší zejm. kapacity a způsob napojení na el. energii a teplo.

Odůvodnění hospodárnosti:

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020

12. Rekonstrukce Centrální sterilizace I, cca 150 mil. Kč

Předmětem investičního záměru je rekonstrukce Centrální sterilizace I ústecké nemocnice vč. modernizace a rozšíření technologických zařízení, a to v návaznosti na současný technický stav a nedostatečnou kapacitu v souvislosti s rozvojem operativy. Tato investiční akce byla plánována nejen v souvislosti s výstavbou objektu „Kardiocentra“, ale rovněž v souvislosti s potřebou modernizace a rozšířením technologií.


V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření stávajících prostor centrální sterilizace, modernizaci vzduchotechniky, úpravě dispozičního řešení tak, aby vyhovovalo legislativní požadavkům, zejména pak hygienickým normám a požadavkům na striktní oddělení provozů (čistý, nečistý) a respektování distribučních tras na centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Současně dojde k modernizaci (rozšíření kapacity a funkcionalit) a rozšíření zdravotnické techniky, určené k mytí, přípravě, sterilizaci a distribuci materiálu.

Na uvedenou akci je finalizována projektová dokumentace, přičemž předpokládaná cena rekonstrukce centrální sterilizace I vč. zdravotnických technologií je předpokládána ve výši 150 mil. Kč.

Předpokládaný harmonogram:

Vyhlášení veřejné zakázky na přístroje:	04/2024
Revize a dopracování PD:	06-07/2024
Vyhlášení VZ na GDS:	4.Q/2024
Zahájení realizace:	04/2025
Dokončení realizace:	09/2025

Půdorysný návrh:

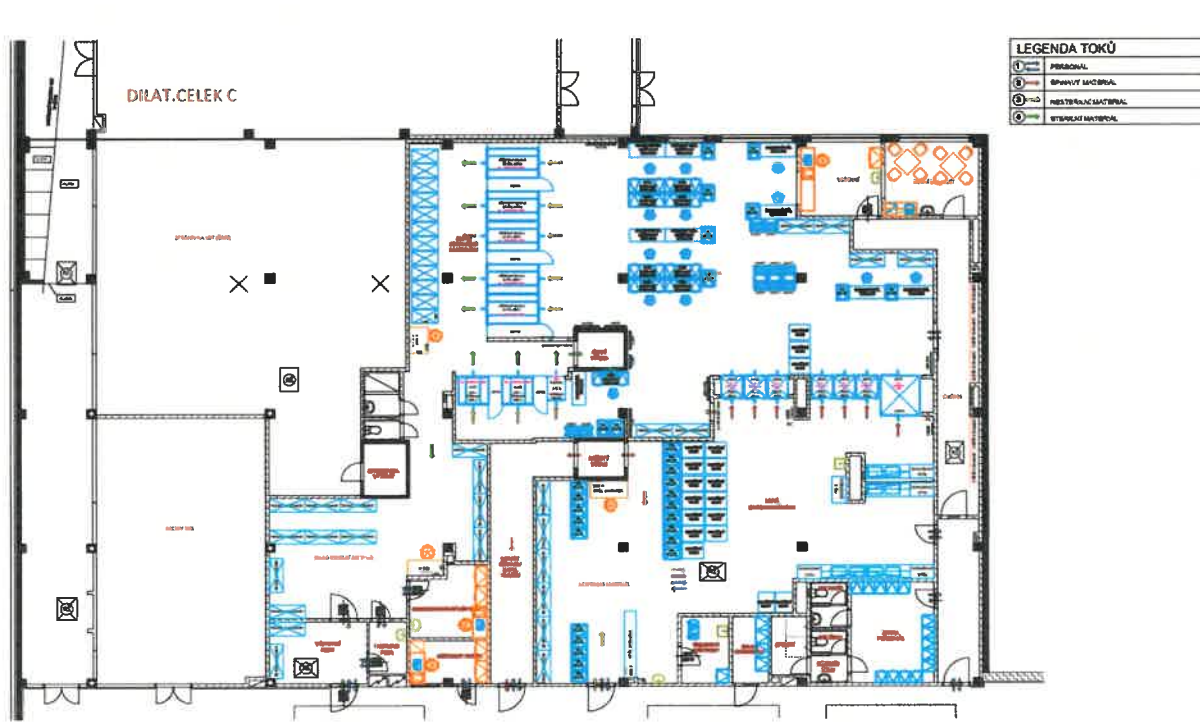

K 31. 12. 2024 je skutečně vyčerpáno ve výši **0,- Kč**

Předpokládané investiční náklady: **150 000 000, Kč vč. DPH.**

Odůvodnění, nerealizace:

Důvodem nerealizace je prodloužení při zpracování projektové dokumentace, současně došlo ke zrušení veřejné zakázky na výběr generálního dodavatele na základě dodatečné analýzy způsobu zadání této veřejné zakázky i ve vztahu na několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově tak dojde k aktualizaci projektové dokumentace a rozdělení zakázky na dodávky sterilizační a mycí technologie na části dle okruhu potenciálních dodavatelů a na stavební práce jako celek a současně dojde k zapracování specifik konkrétní vybrané zdravotnické techniky do stavební a technologické části projektu.

Jedná se o **rozvojovou investici**, jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace současných prostor oddělení centrální sterilizace, díky kterým bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

13. Objekt Kardiocentra – zvýšení bezpečnosti provozu objektu (změna napájení el. energií), cca 34 mil. Kč

V rámci realizace objektu „Kardiocentra“ v ústecké nemocnici bylo rovněž řešení napájení objektu elektrickou energií, přičemž při zahájení prací bylo zjištěno nevhodné a nedostatečné řešení, kdy v důsledku případné poruchy přívodního vedení mohlo dojít k výpadku všech jednotlivých součástí objektu, tedy části KAPIM, vlastní části Kardiocentra a části operačních sálů. Nevhodná byla rovněž trasa napájecího vedení, kdy s ohledem na její umístění v „teplém kolektoru“ by mohlo docházet k přehřívání vedení, a tedy snižování přenositelného výkonu. V souvislosti s uvedeným zjištěním byla navržena změna trasování vedení při současné úpravě napájení tak, aby byla zajištěna energetická nezávislost jednotlivých částí objektu.

Náklady na uvedenou akci kvantifikovány ve výši 34 mil. Kč, přičemž v rámci výstavby objektu byly formou dodatku ke smlouvě se zhotovitelem zahrnuty jako součást výstavby objektu „Kardiocentra“

Předpokládaný harmonogram:


Zahájení stavebních prací:

2.Q/2023

Dokončení stavebních prací:

3.Q/2023

Schéma napájení:

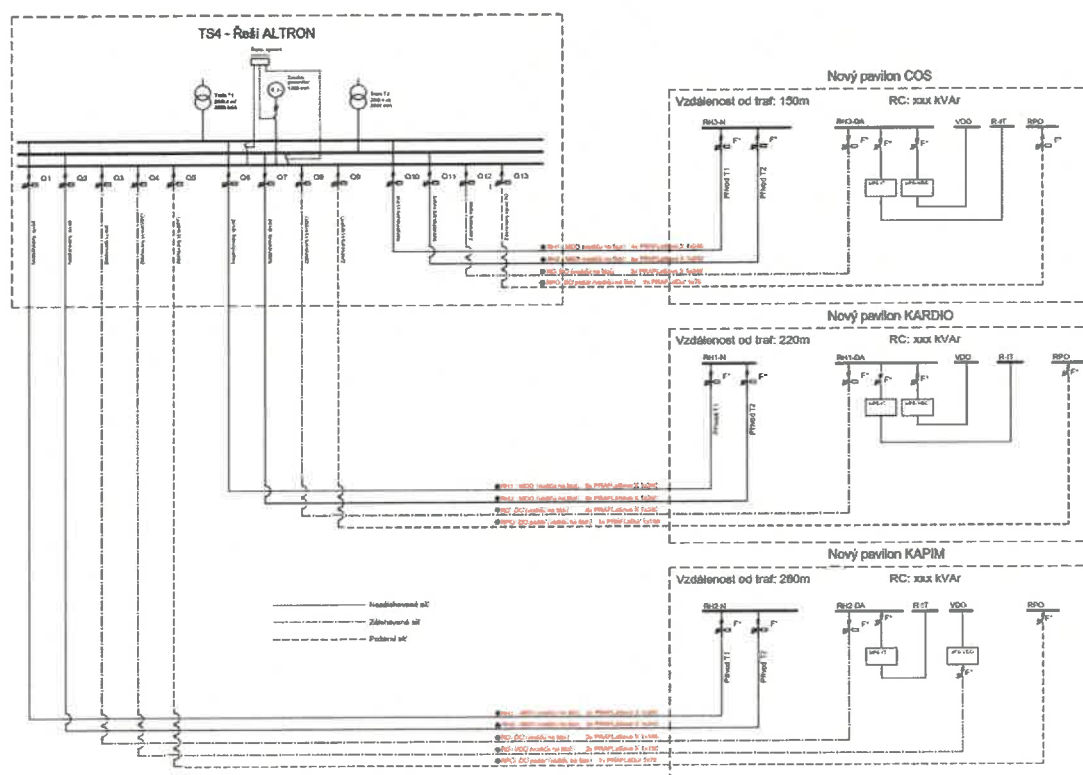

Jedná se o vyvolanou **novou stavební investici** výstavbou objektu „Kardiocentra“, díky které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a

podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Doplnění a změna energokoncepce bude provedena v souladu s aktuálními požadavky HZS a v souladu s aktuálně platnými, a hlavně do budoucna platnými normami. Původně navržená koncepce – jeden centrální přívod vzhledem k důležitosti objektů a aktuálnímu stavu řešení PBŘS a požadavků HZS nevhodná. Realizací dojde k rozdělení napájení každého ze 3 objektů samostatně a nedojde v jeden okamžik k odpojení všech 3 objektů od napájení i když mimořádná událost bude jen v jednom (požadavky na Central + Total Stop).

Realizace výše uvedené investiční akce byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

Uvedená investiční akce byla v návaznosti na zajištění záručních podmínek realizována v rámci investiční akce „Objekt Kardiocentra MNUL“ jako její nedílná součást a byla zahrnuta formou dodatku ke smlouvě.
