

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Obchodní firma/název/jméno: | Obec Prackovice nad Labem           |
| sídlo/adresa:               | Prackovice nad Labem 54, PSČ 411 33 |
| IČ/RČ:                      | 00264229                            |
| Statutární zástupce:        | Mgr. Andrea Svobodová Křešová       |
| č.smlouvy:                  | 17/SML2653/SOPD/OKH                 |
| výše poskytnuté dotace:     | 33 929 224,- Kč                     |
| název projektu:             | Prackovice nad Labem                |

změna se týká:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ZÁVAZNÉHO UKAZATELE        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSTATNÍ                    |

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL                                                                                                                                                                                                                                                            | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                               | OSTATNÍ                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklad Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou.<br>Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6 | Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.<br>Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. I, odst. 1 a čl. II, odst. 3 a 4 | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn. |



15.10.2019

*[Handwritten signature]*

ke změně dochází z důvodu:

Stávající existující systém odvodu povrchových a podpovrchových vod v obcích Prackovice n.L. i Litochovice n.L. o délce cca 2 515 bm byl trvale a dlouhodobě (2007 - 2016) přetížen a poškozen odvodem veškerých vod z dálničního tělesa ( i rozsáhlého území zasaženého stavební činností výstavby dálničního tělesa i jeho doprovodných staveb), kdy nadměrné množství vod spolu se splavovaným materiálem vnikalo v příkrém kopci do stávajícího systému a ten byl trvale poškozen díky značným hydrodynamickým silám i abrazivním účinkům splavovaného materiálu. Na základě provedeného monitoringu a následně provedeném stavebně technickém průzkumu a také po odstranění naplavenin a nánosů ze systému bylo zjištěno značné množství poruch a poškození této sítě. Při této činnosti jsme byli upozorněni na havarijní stav, kdy byly identifikovány dvě lokality, ve kterých došlo k vytvoření kaveren pod komunikacemi a hrozí nebezpečí propadu vozovek. Žádáme o prodloužení termínu dokončení projektu z 31.10.2019 (viz. čl. II. dodatku č. 2 smlouvy 17/SML2653/SOPD/OKH) na 30.6.2020, z důvodu sanace těchto dvou úseků a zamezili propadu částí vozovky (jedná se o komunikaci č.III/24728 procházející našimi obcemi, která je v majetku Ústeckého kraje) a zabezpečili tento havarijní stav.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Prackovicích nad Labem dne 15. 10. 2019

Razítko a podpis statutárního zástupce



Mgr. Andrea Svobodová  
křesova!  
starostka obce



**PATOK a.s.**

U Porcelánky 2903, Louny 440 01

IČ: 27356248, DIČ: CZ27356248, Tel: 777 289 323

# UPOZORNĚNÍ NA HAVARIJNÍ STAV

Během prací na opravách vodohospodářské infrastruktury v obci Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem v rámci projektu Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře - systému odvodu povrchových a podpovrchových vod byly odhaleny poruchy na kanalizačním systému, které svou povahou ohrožují zdraví a život lidí pohybujících se po komunikacích v místech poruch. Vznik poruch byl patrně způsoben převedením dešťových vod při výstavbě dálnice D8 pod její těleso tedy nad obce Prackovice a Litochovice, kde vniká do systému dešťové kanalizace. V některých stokách je průtok vody permanentní. V místech poruch si tento permanentní průtok našel cestu, mimo kanalizaci to znamená, že exfiltroval do okolního terénu, kde postupně vymílal obsypy a zasypy a opět infiltroval do kanalizace. Výsledkem jsou velké kaverny pod komunikací, zborcené zdivo a zastropení původních stok a chybějící dna kde voda mizí neznámo kam. Nejhorší místa jsou uvedena v následujícím soupisu společně s fotografiemi.

## 1. Stoka D Prackovice nad Labem pod silnicí úsek Š42 – x - Š45 a úsek x - Š43 - Š45



*Podemleté zdivo a místy zborcený strop*



*Volné potrubí*



*Kaverna pod potrubím*



*Kaverna nad potrubím*

Nebezpečí propadu vozovky. Doporučujeme okamžitou sanaci úseků nebo omezení provozu na komunikaci.

## 2. Stoka B Litochovice nad Labem úsek Š21 – Š23

Tento úsek je z větší části součástí původního odvodnění obce. Provedení zděná stoka z lomového kamene. Stoka je zalomena v tomto úseku do pravého úhlu s absencí revizní šachty ve zlomu. Horní část úseku je ve stavu totální destrukce. Stoka je zanešená z 50 %. Stěny jsou z části rozvalené. Na stropě jsou patrné chybějící části zastropení. Stoku nelze čistit.



## PATOK a.s.


U Porcelánky 2903, Louny 440 01

IČ: 27356248, DIČ: CZ27356248, Tel: 777 289 323



Na okrajích komunikace jsou již nyní patrné poklesy terénu a je jen otázkou času kdy dojde k úplnému propadu vozovky. Nebezpečí propadu vozovky. Doporučujeme okamžitou sanaci úseků nebo omezení provozu na komunikaci.

### 3. Stoka B2 Litochovice nad Labem úsek x – Š22

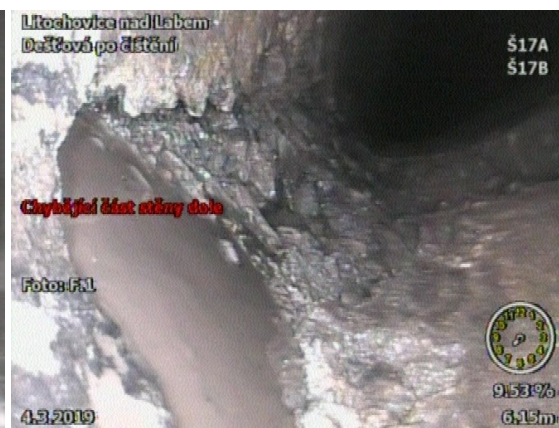

*Chybějící dno a stěny – exfiltrace*

Vzhledem k absenci uklidňovacích šachet a velkému spádu potrubí může dojít při jakémkoli dešti, kdy dojde k vyššímu průtoku vod, dojít díky vysoké hodnotě rychlosti proudících vod k úplné destrukci a vymletí komunikace. Stoka vede v celé délce pod krajnicí komunikace v majetku SÚS Ústeckého kraje.



U Porcelánky 2903, 440 01 Louny  
tel.: 415 696 143, [www.patok.cz](http://www.patok.cz)  
IČ: 27356248 DIČ: CZ27356248

V Lounech 14. 10. 2019

Petr Vokálek

Autorizovaný technik pozemní stavby ČKAIT 0401704

### ŠTĚRKOVÉ STĚNY (ŘSD)

(realizováno, bez projednání v rámci havarijních opatření)

### STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ NA D8 (štěrkové stěny)

Prackovice  
nad Labem

1

**KAVERNA 1** (Prackovice  
- v místě průchodu vod ze  
stabilizačních opatření)

### SESUV NA D8 (2013)

**ODVODNĚNÍ SESUVU  
(ŘSD)** (není dosud  
realizováno, pouze projekt)

2

**KAVERNA 2** (Litochovice  
- v místě vstupu vod ze  
sesuvu pod zem)

Litochovice  
nad Labem

1:16 000

0 200 400 600 800 1000 m
